INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalacion de Revestimiento Termico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberias y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146720012.
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER N°COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-EAL-26-003

Cliente: TURBOPROJECT SERVICES. C.A	**RIF:** J-501290210	**Fecha;** 23/06/2026
Equipo: ALINEADOR LASER	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** DB PRUFTECHNIK
Descripción del Equipo: • Medición de acoplamiento múltiple y Live Move en hasta seis acoplamientos al mismo tiempo • Alineación de ejes cardán sin desmontarlos• Alineación de máquinas verticales con el modo de medición continua vertiSWEEP• Detección de cambios de posición de máquinas mediante Live Trend y Live Trend de acoplamiento múltiple• Diagnóstico de pie cojo• Simulador Move horizontal y vertical	**Modelo:** ROTALIGN ULTRA **TIPO: ALI 4.202** **TIPO: ALI. 3.610** **TIPO: ALI 3.600**	**Código Interno;** No Se Observo
Serial; 43213804 (Pantalla) **Serial. Emisor 1: 4909 8098** **Serial Receptor 2 : 4709 5191**	**Fecha de calibración:** 23/06/2026 **Fecha Próxima Calibración:** 23/06/2027	**Patrón de Referencia:** RELOJ COMPARADOR (FLUKE)
Tolerancia; +/- 2	**T_{MAXI} 45°C**	**Rango;** 2mm (laina)

INSPECCIÓN VISUAL

Carcasa: Baquelita	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** En la escala seleccionada
Pantalla; Trasparente de baquelita Visible Normal, Digital	**Estuche:** se observo	**Tamaño ;** Portátil

PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN

PATRÓN	LECTURA PATRÓN MM	LECTURA DEL EQUIPO MM	FOTO DEL EQUIPO
CINTA MÉTRICA LASER RELOJ COMPARADOR DIGITAL	EJE -58,6	EJE -45.6.	
	10	10	
	60	60	
	-0.070	-0.069	
			

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A

INSPECCIÓN VISUAL

Información	Visible	APTO	FOTO DEL EQUIPO EN OPERACIÓN
Pantalla de selección de material	X	X	
Pantalla de alineación	X	X	
Pantalla de ajuste		X	
Pantalla de selección de actividad	X	X	
Se visualiza pantalla de alineación	X	X	
			

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección Invermulca: COVENIN 3508 COVENIN 2141-95 COVENIN 1900-95, ISO 8502-4 ,BS7079-B ,6920 , ISO IV , especificaciones IEC-61035-1

OBSERVACIONES:	Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido. Estas instrucciones no sólo le indican el problema, sino que también identifican las acciones correctivas que sus técnicos de pruebas pueden tomar para resolver el problema rápidamente, Todos los valores tomados están dentro de la tolerancia permitida.

CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Inspector
Ing. Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Supervisor
Ing. Javier Rodriguez
Nivel II NDT

112-14/96

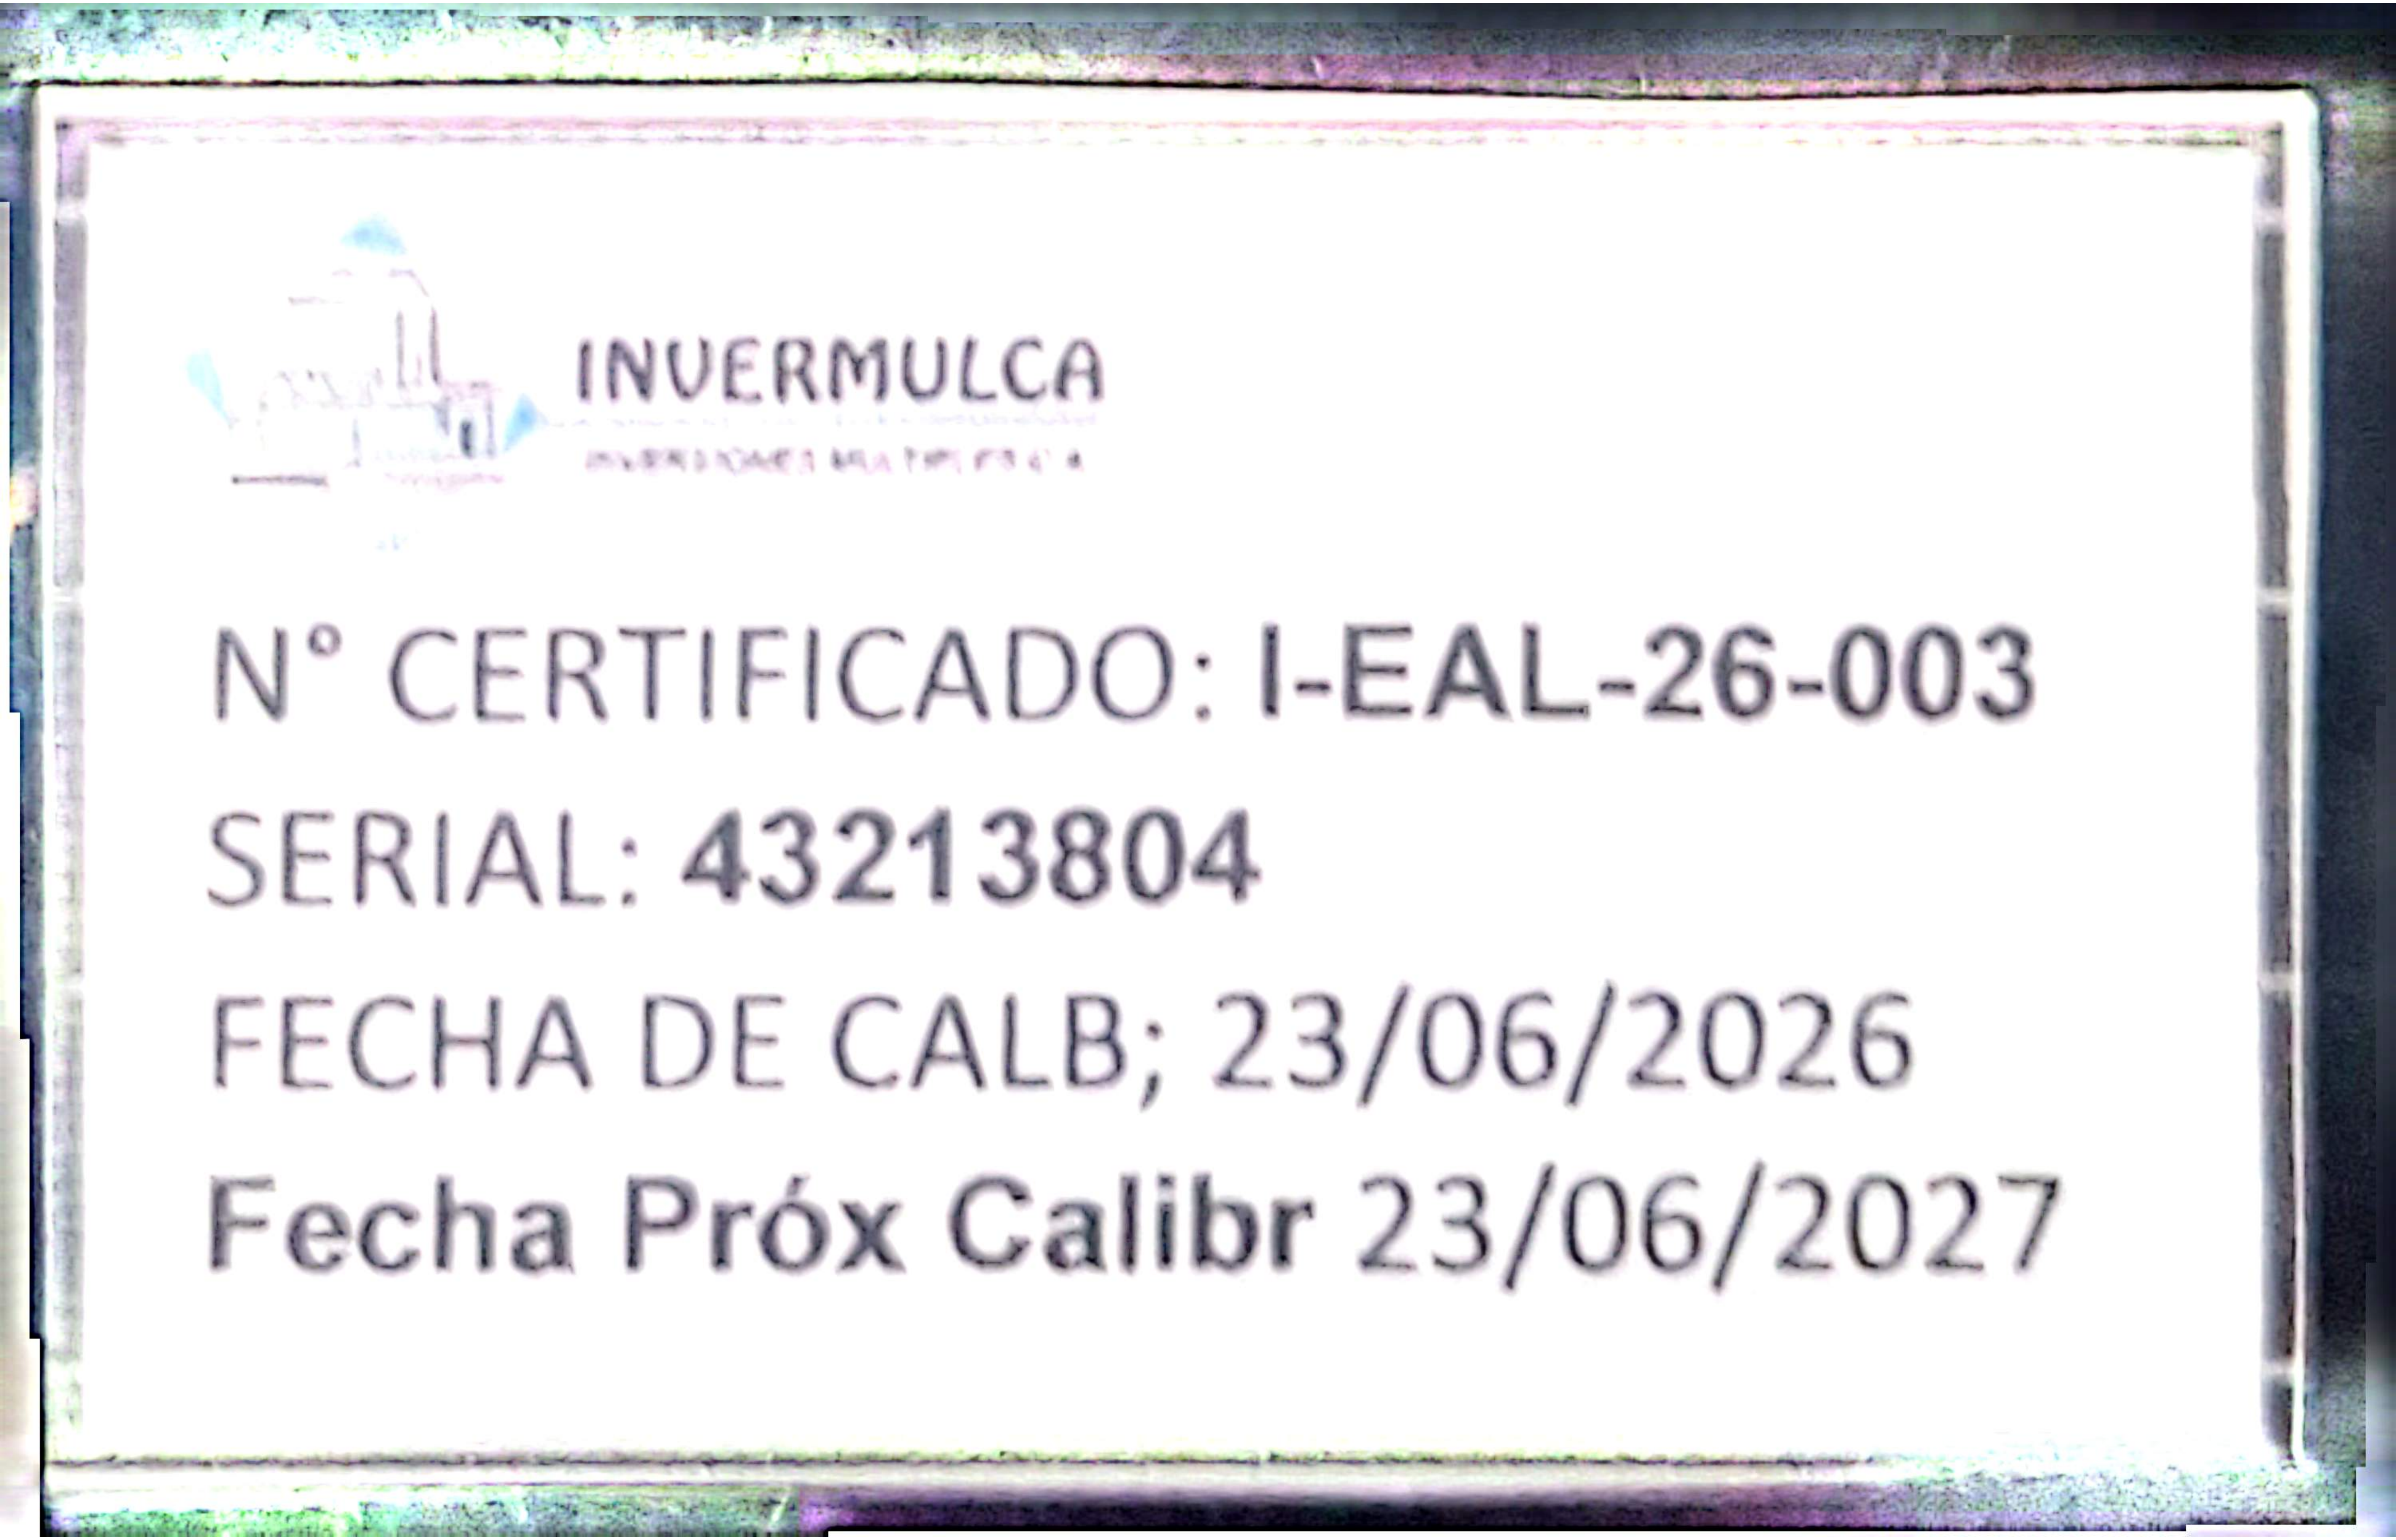

INVERMULCA

N° CERTIFICADO: **I-EAL-26-003**

SERIAL: **43213804**

FECHA DE CALB; 23/06/2026

Fecha Próx Calibr 23/06/2027

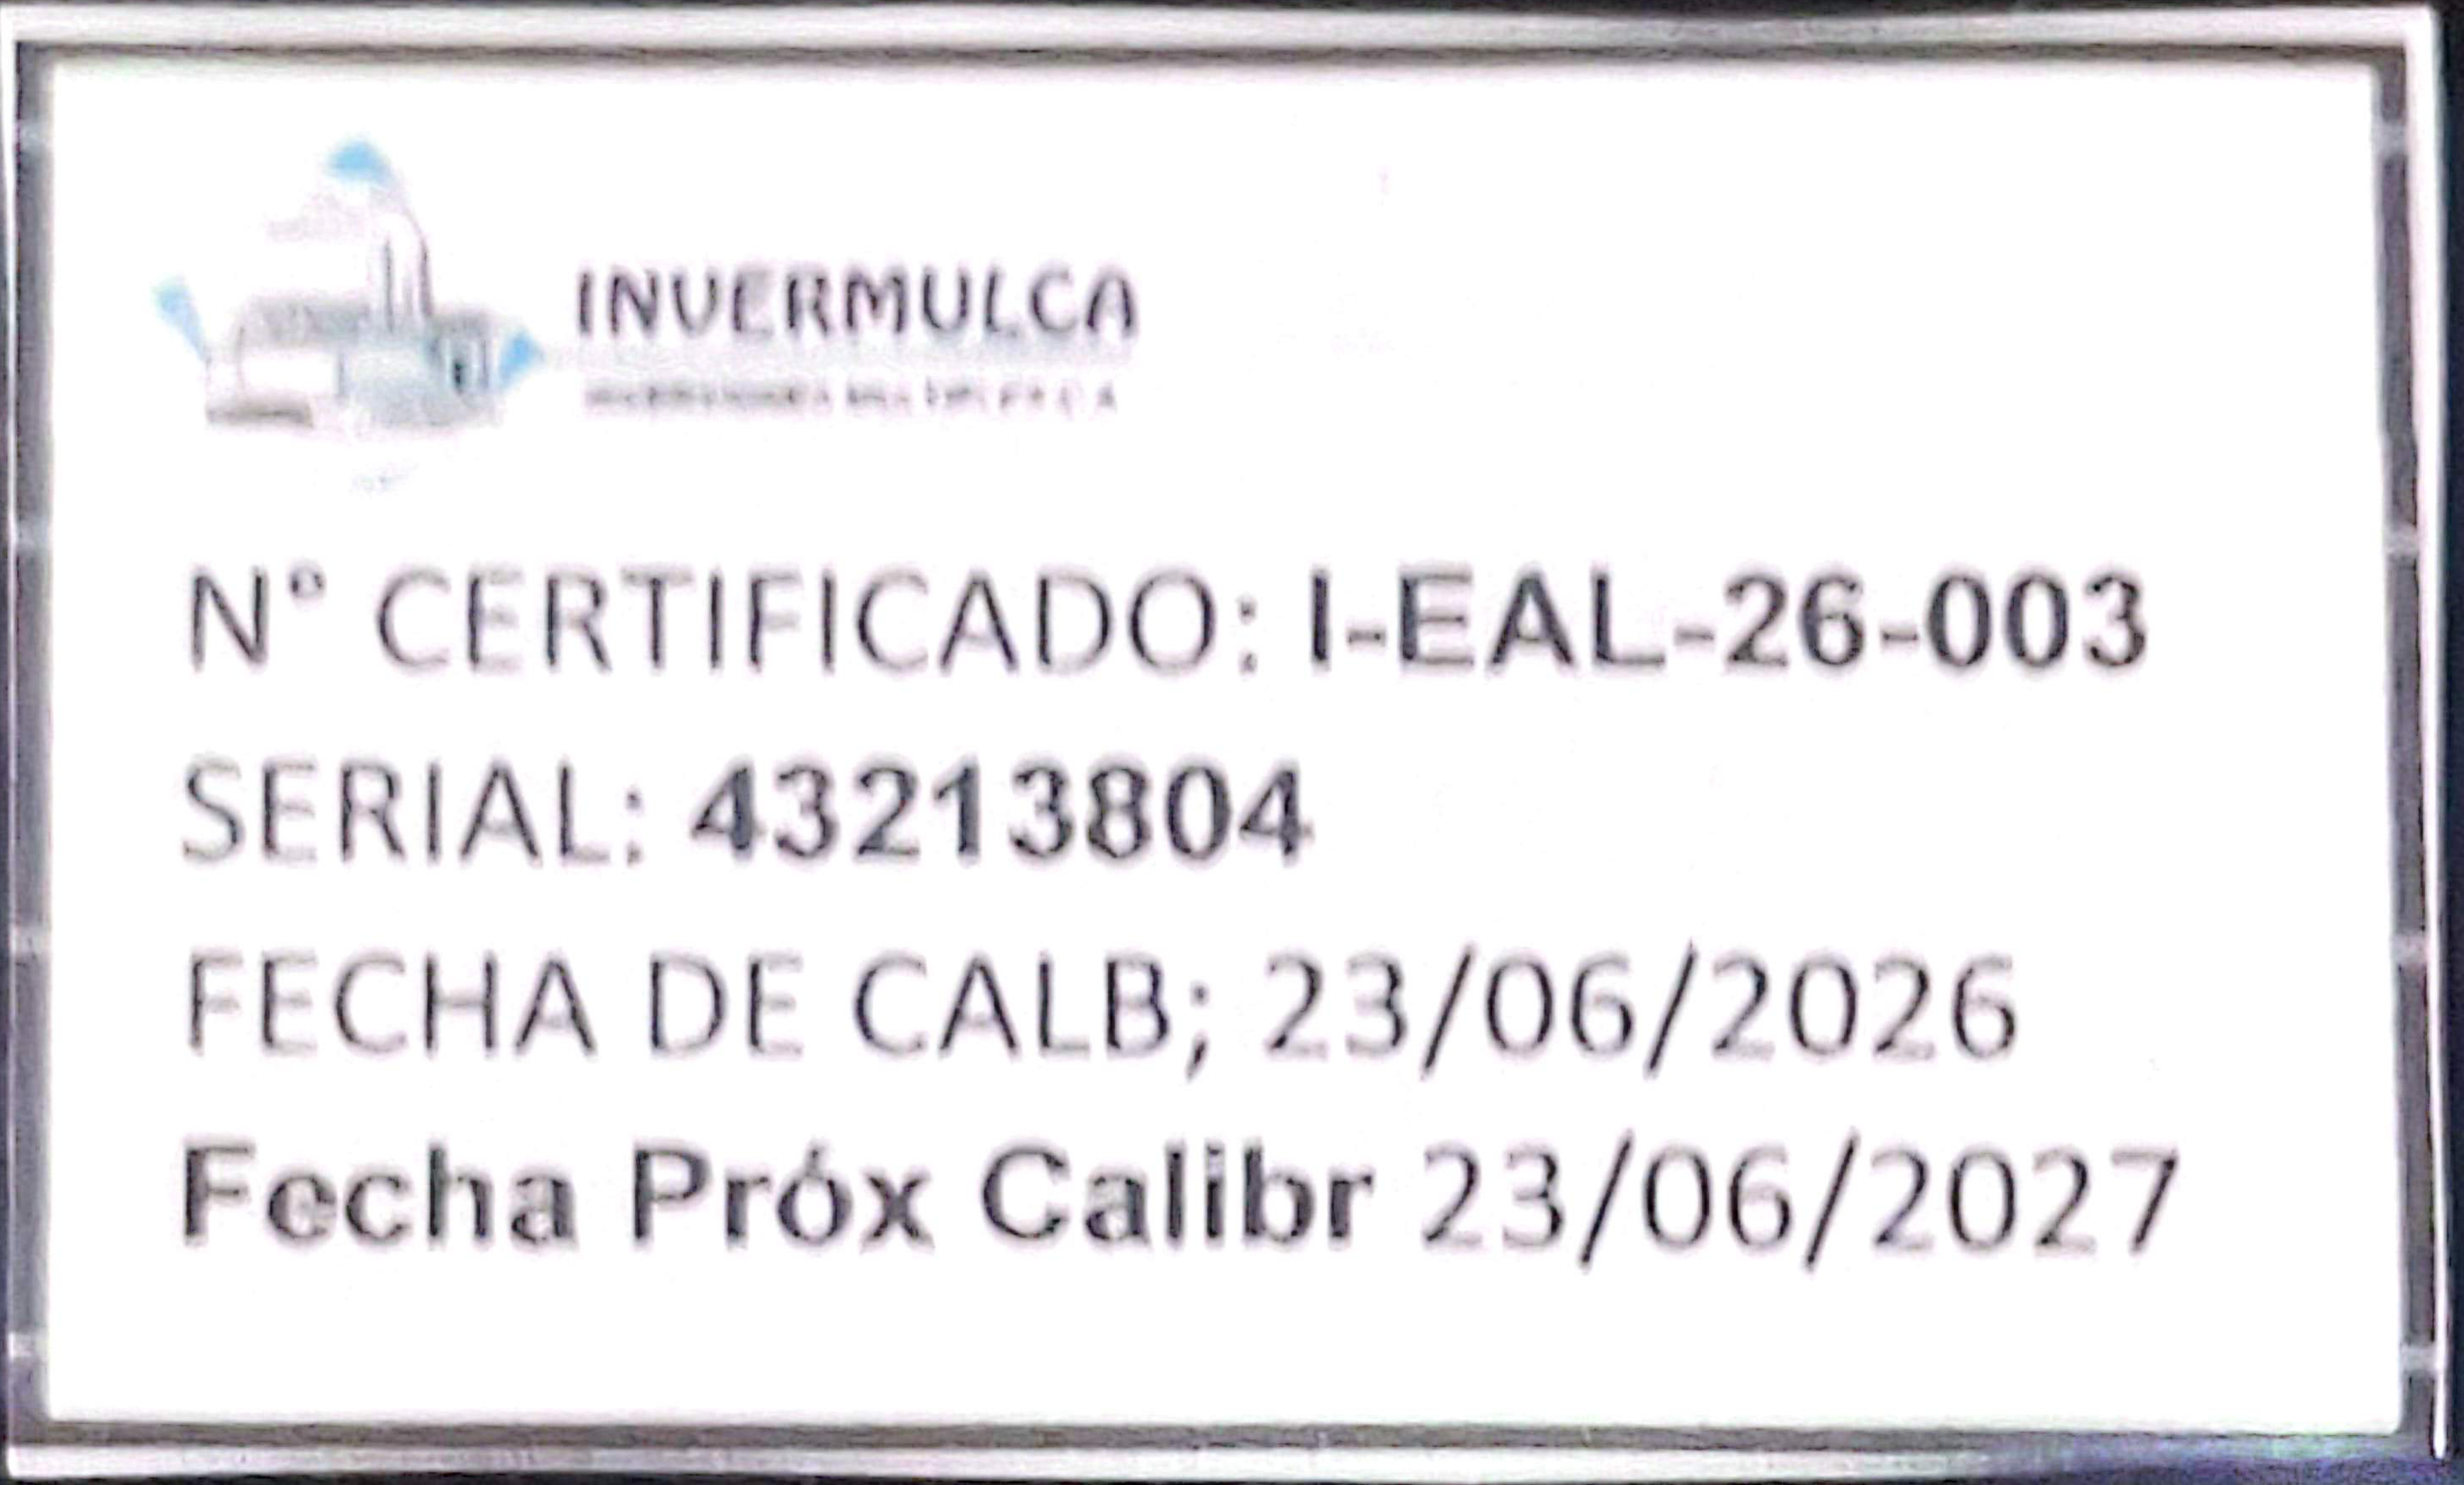

INVERMULCA

N° CERTIFICADO: I-EAL-26-003

SERIAL: **43213804**

FECHA DE CALB; 23/06/2026

Fecha Próx Calibr 23/06/2027
