SONOTEST

J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO DE CARGA

EQUIPO APTO

CISS: IN25S16A79

Propietario:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.		
Equipo No.:	SF-POL-005	**Cód. Sonotest:**	570001021001-15071057
Tipo:	GRÚA MANUAL (SEÑORITA)	**Fecha de Inspección:**	05/12/2025
Serial:	15071057	**Fecha de Vencimiento:**	05/12/2026
Marca:	AMERICAN POWER	**Capacidad Nominal:**	2 TON
Modelo:	420	**Cap. Trabajo Seguro:**	2 TON

De acuerdo al informe de inspección No.: 067-051225-03 de Fecha: 08/12/2025 el equipo se encuentra 'APTO' para operar dentro de las condiciones y parámetros establecidos en las tablas de carga, recomendaciones suministradas por el fabricante y especificaciones del equipo inspeccionado.

Observaciones: NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO 2.000 KG (2 TON).

Lugar de Insp.: PATIO SAMFOR, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO-ZULIA.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SÁNCHEZ
FIS-0023-003	FIS-0023-002	REPRESENTANTE
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF. J-07049150-7

Número del Documento: S-7213-B

SONOTEST

J-07049150-7

Organismo de Inspección
Gerencia de Operaciones (Ciudad Ojeda)
Coordinación de Operaciones
(IEI, IEP, EQP, END, MQS)

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

No. Certificado: CO-08-12-25-03

CISS: IN25S16A79

CERTIFICADO DE EQUIPO DE IZAMIENTO DE CARGA
INSPECCIÓN DE GRÚA MANUAL (SEÑORITA)

El equipo abajo identificado ha sido inspeccionado de acuerdo a las Normas:
ASME B30,21/PDVSA CAP.14/COVENIN 3907-06 y Procedimientos Sonotest, S.A. IEI-MA-01

Código Sonotest: 570001021001-15071057
Propietario: SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.
Tipo de Equipo: GRÚA MANUAL (SEÑORITA)
Subtipo: CADENA
No. del Equipo: SF-POL-005
Fabricante: AMERICAN POWER
Capacidad Nominal: 2 TON
Modelo: 420
Serial: 15071057
Año de Fab.: S/I

CONDICIONES DEL EQUIPO CERTIFICADO
de Líneas: N/A **Cap. del Bloque:** N/A **Cap. Trabajo Seguro:** 2 TON

CARACTERISTICAS DEL CABLE DE ACERO
Diámetro (mm): N/A **Clasificación:** N/A **Factor de Seguridad:** N/A
Resist. Ruptura: N/A **Clase/Grado:** N/A **Arrollado:** N/A

CARACTERISTICAS DEL MALACATE (PRINCIPAL)
Marca: N/A **Modelo:** N/A **Año:** N/A
Serial: N/A **Potencia:** N/A

CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA PLUMA
Marca: N/A **Modelo:** N/A **Año:** N/A
Capacidad Nominal: N/A **Altura:** N/A **Longitud:** N/A
Serial: N/A

De acuerdo al informe de inspección Nº: 067-051225-03 de Fecha: 08/12/2025 el equipo se encuentra 'APTO' para operar dentro de las condiciones y parámetros establecidos en las tablas de carga, recomendaciones suministradas por el fabricante y especificaciones del equipo inspeccionado.

Observaciones: NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO 2.000 KG (2 TON).

Lugar de Insp.: PATIO SAMFOR, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO-ZULIA.

Fecha de Inspección: **Inicio:** 05/12/2025 **Culminación:** 05/12/2025

Fecha de Vencimiento: 05/12/2026

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SÁNCHEZ
FIS-0023-003	FIS-0023-002	REPRESENTANTE
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF. J-07049150-7

Nota: 1.- Este certificado no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo 2.- Este certificado pierde validez al cumplirse la fecha de vencimiento o cuando el equipo se involucre en un accidente de cualquier naturaleza. En los equipos móviles debe considerarse su reinspección, para asegurar su operabilidad, cuando: 1) Se efectúen modificaciones al diseño, 2) Exista duda sobre su condición, 3) Se haya hecho un traslado

Número del Documento: **S-7213-B**

Calle Campo Elías Nº. 122-A, Ciudad Ojeda, Estado Zulia, Venezuela. Telef. (0265) 6628329 / 6315272; Móvil (0414) 6481361 / 6185934.
Página Web: www.sonotest.com, e-mail: sonotest@sonotest.com


SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO
GRÚA DE CADENAS (SEÑORITA)

FECHA DEL INFORME:	8 de diciembre de 2025	**INFORME N°:**	067-051225-03

PROPIETARIO:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)				
LUGAR:	PATIO SAMFOR, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO. ZULIA.				
EQUIPO No:	**SF-POL-005**	**SERIAL:**	15071057	**CAPACIDAD:**	2 TON
MODELO:	420	**TIPO:**	GRÚA DE CADENA (Señorita)	**SUB-TIPO:**	DE CADENA
MARCA:	AMERICAN POWER	**AÑO:**	S/I	**FABRICANTE:**	AMERICAN POWER
FECHA DE INICIO DE INSPECCIÓN :	05/12/2025	**FECHA DE CULMINACIÓN DE INSPECCIÓN :**		05/12/2025	
NORMAS APLICABLES:	ASME B30,21 / PDVSA CAP. 14 / COVENIN 3907-2006	**PROCEDIMIENTO SONOTEST:**		IEI-MA-01	

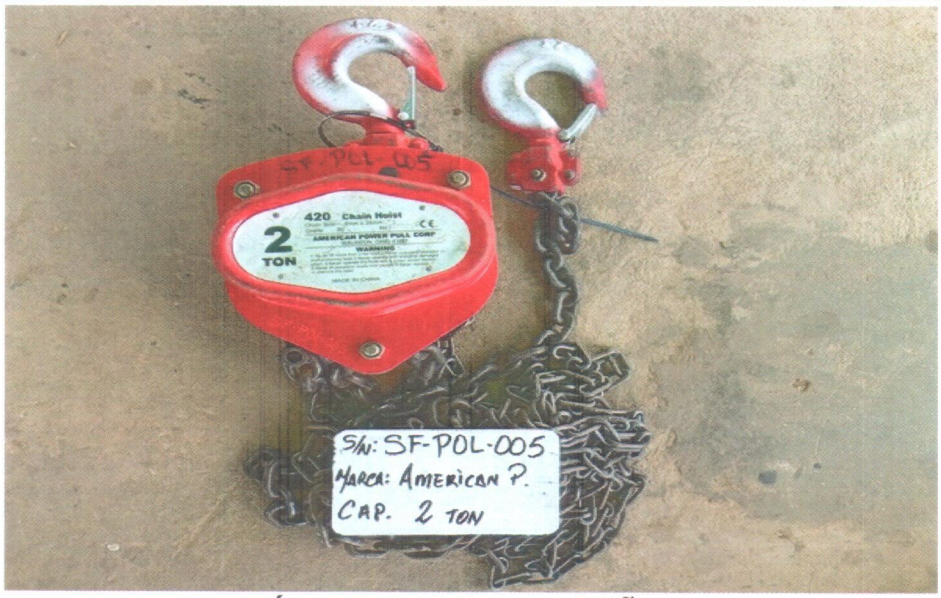

GRÚA DE CADENAS (SEÑORITA)

OBSERVACIONES

- EL EQUIPO **ESTÁ APTO** PARA REALIZAR TRABAJOS DE IZAMIENTO.
- NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO **2.000** Kgs (**2** ton).
- REVISAR DIARIAMENTE EL EQUIPO POR PARTE DEL OPERADOR Y CUALQUIER ANORMALIDAD PASARA POR ESCRITO AL CUSTODIO, EL CUAL DEBERÁ TOMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS.
- UTILIZAR OPERADORES CERTIFICADOS Y CON EXPERIENCIA COMPROBADA.
- REALIZAR EL MANTENIMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

Los resultados de la inspección corresponden exclusivamente al equipo:
MARCA: AMERICAN POWER SERIAL N°: 15071057
El cual ha sido inspeccionado de acuerdo con los procedimientos de inspección de SONOTEST, S. A., las normas PDVSA, COVENIN, ASME / ANSI Serie B30 y API RP aplicables y se encuentra en condición: CONFORME

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): IN25S16A79

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

DATA HISTÓRICA DEL EQUIPO

Verificar el historial del equipo relacionado con:

N° Renglón	Descripción	Condición
1	Record de Inspecciones	Presenta y está actualizado
2	Existencia del Programa de Mantenimiento	Presenta y está actualizado
3	Libro de Reparaciones y Reemplazos	Presenta y está actualizado
4	Record de las Pruebas de Carga	Presenta y está actualizado
5	Manual de Operaciones	Presenta y está actualizado

OBSERVACIONES

- El equipo tiene certificación anterior realizada por Invermuca.
- La empresa SAMFOR, suministró la documentación requerida.

EQUIPO (Procedimientos IEI-PI-03)

N° Renglón	Descripción				Condición
6	Cuerpo / Estructura				Buenas condiciones
7	Estado de la Pintura				Buenas condiciones
8	Gancho Superior				Buenas condiciones
8.1	Torcedura 0°				Buenas condiciones
8.2	Abertura de Garganta ≤ 5% o 1/4"	Lectura:	**50**	mm	Buenas condiciones
8.3	Desgaste ≤ 10%				Buenas condiciones
8.4	Resultados NDT				Buenas condiciones
9	Gancho Inferior				Buenas condiciones
9.1	Torcedura 0°				Buenas condiciones
9.2	Abertura de Garganta ≤ 5% o 1/4"	Lectura:	**50**	mm	Buenas condiciones
9.3	Desgaste ≤ 10%				Buenas condiciones
9.4	Resultados NDT				Buenas condiciones
10	Control Manual del Rache				No aplica
11	Ojales de Suspensión				Buenas condiciones
12	Engranajes				Buenas condiciones
13	Cojinetes				Buenas condiciones
14	Estado de la Lubricación				Buenas condiciones
15	Mecanismo de Freno				Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- Se realizó ensayo con partículas magnéticas a los ganchos, obteniéndose buenos resultados.
- Los ganchos son originales del fabricante: Capacidad: **2.000** Kg. Marca: **AMERICAN POWER** Serial: **S/S**
- El diámetro o espesor de la garganta del gancho es: **38** mm

INSPECCIÓN DE LA CADENA (Procedimiento IEI-PI-05)

N° Renglón	Descripción							Condición
16	**Aplicación**	**Diámetro**	**Clase/ grado**	**Long. del Eslabón**	**Ancho del Eslabón**	**Eslabones 10/20**	**Capacidad**	
16.1	**Principal**	8,00 mm	80	38	26	245	2.042 Kgs	Buenas condiciones
16.2	**Auxiliar**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Personalizar comentario

EQUIPO DE MEDICIÓN

VERNIER	CÓDIGO: **GE-I017-53**	FECHA DE CALIBRACIÓN: **3/9/2025**

OBSERVACIONES

- La cadena presenta buenas condiciones. Se realizó inspección visual.
- Descripción de la cadena: Marca: **JAPAN** Ø : **8,00** = **5/16"** Inch
  Grado: **80** Código: **T8** Longitud: **3,0** mt **1** Línea

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

RECOMENDACIONES

1.- Realizar inspecciones frecuentes a la cadena de carga, y proceder a su reemplazo al momento de presentar deformación, desgaste y aberturas, según la norma ASME B30.16 / 21

2.- Realizar el mantenimiento preventivo del equipo según especificaciones del fabricante.

3.- Mantener actualizado libro de vida de todas las reparaciones y reemplazos realizados al equipo.

4.- Revisar diariamente el equipo por parte del operador y cualquier anormalidad pasarla por escrito al custodio, el deberá tomar las acciones correctivas.

5.- Realizar los izamientos de carga según especificaciones establecidas por el fabricante.

6.- No exceder la capacidad de carga del equipo la cual es de **2.000** kg.

7.- Almacenar y transportar adecuadamente para evitar desgaste en la cadena por fricción con el piso.

8.- Pintar en sitio visible el código interno del equipo.

9.- Mantener los ganchos de carga con las uñas de seguridad en buenas condiciones.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **7.967.958**	C.I.: **4.649.431**	C.I.: **11.219.694**
CERT.: **FIS-0023-003**	CERT.: **FIS-0023-002**	
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF J-07049150-7

ASISTENTE

NOMBRE:

C.I.:

SONOTEST

REVISION TECNICA	REVISIÓN ADMINISTRATIVA
Firma	Firma
Conforme ☑ SI ☐ NO	Conforme ☑ SI ☐ NO
Fecha 08 / 12 / 2025	Fecha 08 / 12 / 2025

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

PRUEBA DE CARGA (Procedimiento IEI-PI-17)			
PROPIETARIO:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)		
LUGAR:	PATIO SAMFOR, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO. ZULIA.	**FECHA DE PRUEBA:**	5/12/2025
MARCA:	AMERICAN POWER	**CAPACIDAD:**	2 TON
MODELO:	420	**TIPO:**	GRÚA DE CADENA (Señorita)
FABRICANTE:	AMERICAN POWER	**SUB-TIPO:**	DE CADENA
SERIAL:	15071057	**AÑO DE FABRICACIÓN:**	S/I

PLUMA PROBADA	CAPACIDAD NOMINAL	CARGA DE PRUEBA	% DE CARGA	TIEMPO DE PRUEBA	RESULTADOS
PRINCIPAL	2.000 KGS	2.200 KGS	110%	25 MIN	Satisfactorio
OTROS	N/A	N/A	N/A	N/A	Personalizar comentario

EQUIPO DE MEDICIÓN Y ENSAYO					
DINAMÓMETRO N°:	IEI-I031-08	**MARCA:**	DILLON	**MODELO:**	10inDINA
SERIAL:	D-22157	**RANGO:**	0-10.000 KG	**FECHA DE CALIBRACIÓN:**	18/3/2025

MASA DE PRUEBA			
TIPO DE MASA:	PUNTO DE ANCLAJE	**PESO:**	2.200 KGS

OBSERVACIONES


- EL EQUIPO ESTÁ APTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE IZAMIENTO.
- NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO **2.000** KGS / TON: **2**
- SE REALIZÓ PRUEBA DE TENSIÓN UTILIZANDO UN DINAMÓMETRO DE CAP. 10 TON, CERTIFICADO POR SENCAMER.
- UTILIZAR OPERADORES CERTIFICADOS O CON EXPERIENCIA COMPROBADA EN ESTE TIPO DE EQUIPO.
- LA PRUEBA DE TENSIÓN O CARGA SE REALIZÓ A LA CAPACIDAD LÍMITE DEL EQUIPO.
- SE VERIFICÓ LA ELONGACIÓN DE LA CADENA POSTERIOR A LA PRUEBA DE CARGA, OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.
- UTILIZAR EL EQUIPO UNICAMENTE PARA LOS TRABAJOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI


Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

GRÚA DE CADENAS

ESQUEMA Y GRÁFICO DE LA PRUEBA DE CARGA

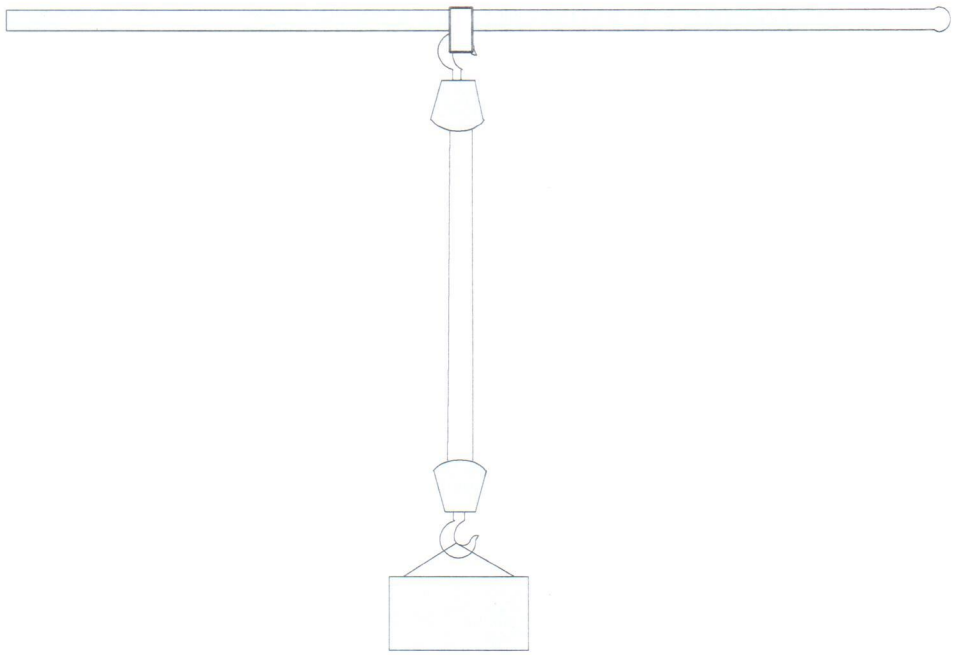


2.200,00 KGS
CARGA

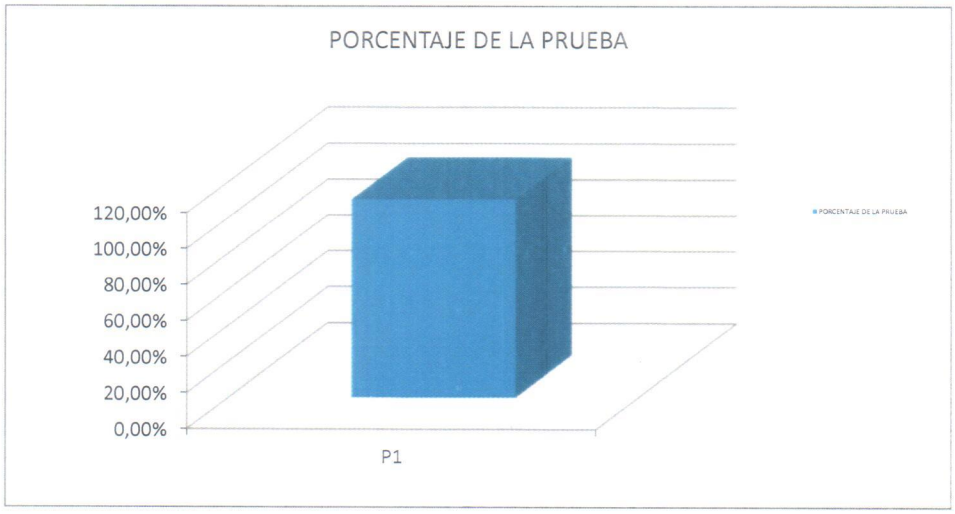

PRUEBA N° P1
PORCENTAJE **110%**

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

VISTA GENERAL DEL EQUIPO

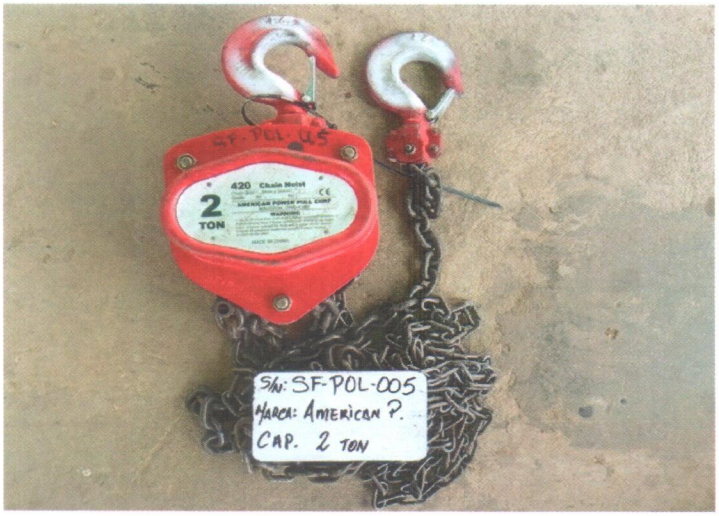

VISTA DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN




VISTA DE LA PRUEBA DE CARGA APLICADA AL EQUIPO





VISTA DEL DINAMÓMETRO UTILIZADO

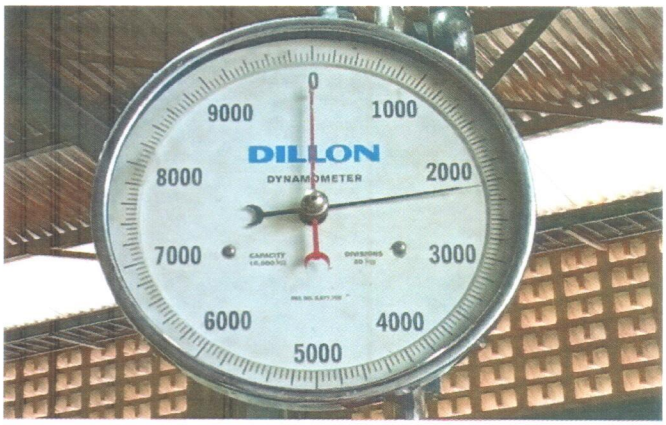

SONOTEST
RIF J-07049150-7

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO
GANCHOS

FECHA DEL INFORME:	8/12/2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	5/12/2025

INFORME Nº	067-051225-03

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**INFORMACIÓN DEL GANCHO**	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO		**MARCA:**	AMERICAN POWER
MARCA:	AMERICAN POWER	**MODELO:**	SIMPLE
MODELO:	420	**SERIAL:**	S/S
SERIAL:	15071057	**CAPACIDAD**	2.000 KGS

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO: **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐


PROCEDIMIENTO:		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE:**	

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				**MATERIALES**	
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS /CONT. BLANCO
TIPO:	VERNIER 8" (Meissner)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A	**REVELADOR:**	N/A

NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN ASME V, ART. VII. / ASME B30.10 / PDVSA CAP. 14 / COVENIN 3212-1996

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO

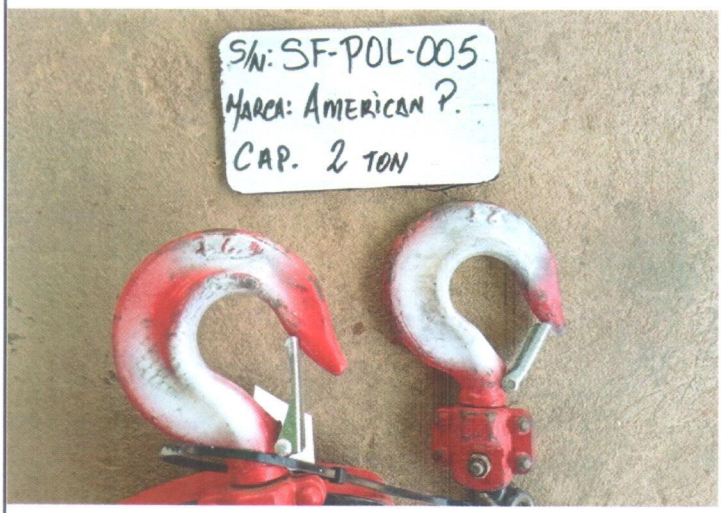

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS A LA GARGANTA DEL GANCHO No.: **S/S** DE CAPACIDAD **2.000** KG. OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.

OBSERVACIONES

- EL GANCHO **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO
- NO SE DETECTARON DISCONTINUIDADES EN EL ÁREA DONDE SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN.

RECOMENDACIONES

1.- UTILIZAR ADECUADAMENTE PARA EVITAR DAÑOS MECÁNICOS.
2.- REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS, CON EL FIN DE DETECTAR GRIETAS, DEFORMACIÓN Y DESGASTE. SEGÚN NORMA APLICABLE.
3.- MANTENER LUBRICADO EL PUNTO DE GIRO DEL GANCHO.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	ASISTENTE
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE:
NIVEL: **II**	NIVEL: **II**	NIVEL:
FECHA: **8/12/2025**	FECHA: **8/12/2025**	FECHA:

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia.Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.
