SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE MÁQUINA DE SOLDAR
PRUEBA DINÁMICA

FECHA DEL INFORME:	22 de junio de 2026	**INFORME Nº**	067-190626-03

DATOS DE LA EMPRESA			
PROPIETARIO	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	EQUIPO No.	**S/N**
UBICACIÓN	BASE SAMFOR, CAMPO BOSCÁN, EDO. ZULIA.	FECHA DE INSPECCIÓN	19/06/2026

EQUIPO UTILIZADO			
PINZA VOLTIAMPERIMÉTRICA			
CÓDIGO	GE-I009-35	MARCA	FLUKE
SERIAL	21820821	FECHA DE CALIBRACIÓN	29/09/2025
MODELO	376	CALIBRADO POR	UNITED Calibration Services

DATOS Y CONDICIONES DE LA MÁQUINA			
PROPIETARIO	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	RANGO MÁXIMO VOLTAJE	28 (20,4 / 28v)
CÓDIGO	IP21S	RANGO MÁXIMO AMPERAJE	200 (10 / 200A)
SERIAL	**12F88673622100391480011**	O.C.V.	70
MODELO	LASSEN 200	R.P.M. MÁXIMO	N/A
MARCA	HOFFMAN ARC	INDICADORES	BIEN
TIPO DE MÁQUINA	ELÉCTRICA	CUERPO	BIEN
CLASE	NEMA Class F (IEC 60974-1)	TOMA CORRIENTE	220 (Monofásica)
CICLO DE CARGA	35%	CABLES/PINZAS	BIEN (cables 2/0)

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN No.: MQS-PI-01 Rev. 3
NORMAS REF.: ASME, Sección II / AWS A5.1 / AWS D1.1 / AWS D14.3 / ISO 9001.
1.- LA MÁQUINA DE SOLDAR NO GENERA LOS ANPERAJES REQUERIDOS PARA LOS ELECTRODOS UTILIZADOS EN LAS PRUEBAS REALIZADAS.
- PARA LOS 100 AMP. ALCANZÓ 94,4 AMP.
- PARA LOS 124 AMP. ALCANZÓ 98,3 AMP.
- PARA LOS 150 AMP. ALCANZÓ 114 AMP.
2.- POR LO ANTES MENCIONANDO, LA MÁQUINA EXCEDE EL +/- 10% PERMITIDO.



DATOS DE LA PRUEBA REALIZADA

ELECTRODO		DIAL DE LA MÁQUINA (Amp.)		LECTURA MEDIDA (Amp.)		% DESVIACIÓN		CONDICIÓN
TIPO	Ø	RANGO	POSICIÓN (1)	SAL.-MÁQ.(2)	EXT.-PINZA (3)	(1) - (2)	(2) - (3)	
E-6010	3/32"	N/A	No Registrado	92	91	N/A	-1,09	Rechazada
E-7018	1/8"	N/A	No Registrado	121	119	N/A	-1,65	Rechazada
E-7018	5/32"	N/A	No Registrado	156	152	N/A	-2,56	Rechazada

RESULTADOS DE LA PRUEBA

- LA MÁQUINA **NO CUMPLE CON LOS AMPERAJES MÍNIMOS REQUERIDOS** PARA LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS Y DIÁMETROS DE ELECTRODOS, POR LO TANTO, LA MÁQUINA **NO ESTÁ APTA**, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE SOLDADURA.
- EL DIAL DE LA MÁQUINA NO REGISTRA DE FORMA ADECUADA LOS AMPERAJES DE SALIDA, POR LO CUAL, NO SE PUEDE ESTABLECER EL AMPERAJE ADECUADO (EL DIAL REFLEJA AMPERAJES DE 464 Y 572A, LO CUAL ES INCORRECTO)

ESTE INFORME DECLARA QUE LA MÁQUINA DE SOLDAR SE ENCUENTRA: **NO APTA**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S1A474**


Sede Principal: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector la Ponderosa, Barcelona Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205
Calle Tabana, N° 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven, Punto Fijo, Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

VISTA GENERAL DE LA MÁQUINA



VISTA DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN

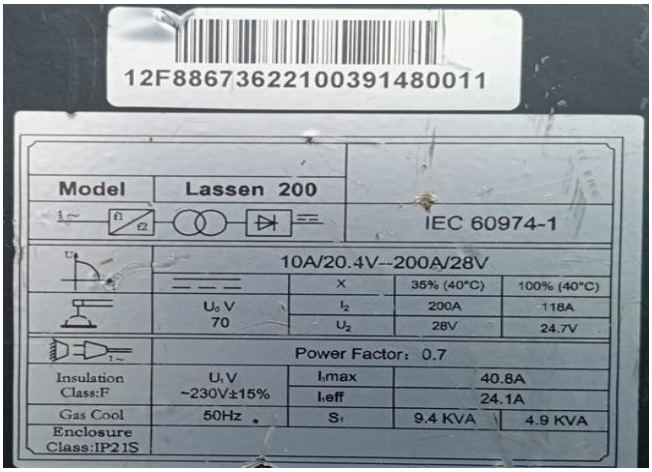

VISTA DEL DIAL EN 464 AMP.



VISTA DEL DIAL EN 572 AMP.



VISTA DE LA ETIQUETA COLOCADA DE NO APTA

