INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO (CÁNCAMOS)

REPORTE DE INSPECCIÓN DE CÁNCAMOS							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	N°. O.I.:		Nº REPORTE	I-CA-25-005
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO. CÁNCAMOS **COMPARTIMIENTO AREA GENERADOR BG-1 y BG-2**					FECHA	12/03/2025
						FECHA PROXIMA INSP	112/03/2026

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	**COMPARTIMIENTO AREA GENERADOR BG-1 y BG-2**
OBJETIVO: DETERMINAR LAS CONDICIONES DE CONFORMIDAD Y ESTABLECER LOS NIVELES DE CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO TIPO CÁNCAMOS.	
ALCANCE: REALIZAR LA INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y MEDIANTE MÉTODOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS TÉCNICA CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS VISIBLES (MT) Y LA CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE APAREJOS DE IZAMIENTO TIPO CÁNCAMOS DE DIFERENTES CAPACIDADES.	

Nº	DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO			DATOS TÉCNICOS		CONDICIONES CUALITATIVAS				PRUEBA	CONDICIONES DIMENSIONALES					CONCLUSIÓN
						ESTRUCTURA					DIMENSIONAMIENTO (MM.)					
	FABRICANTE	TIPO	SERIAL Y/O CÓDIGO	Ø NOMINAL ROSCA (mm)	CAP. NOM (kg.)	CUERPO	EJE	OJAL	ROSCA	END (PT)	A	B	C	D	E	CONDICIÓN / CERTIFICACIÓN
	COMPARTIMIENTO AREA GENERADOR BG-2															
01	**WSLL 14mm**	**M16**	**C-1**	**62**	**2000**	BC	S/I	BC	N/T	**I-LP-PM-25-012**	N/T	**27**	**40**	**62**	**62**	**APTO**
02	**WSLL 14mm**	**M18**	**C-2**	**71**	**2400**	BC	S/I	BC	N/T	**I-LP-PM-25-012**	N/T	**27**	**35**	**71**	**71**	**APTO**
03	**WSLL 14mm**	**M16**	**C-3**	**62**	**2000**	BC	S/I	BC	N/T	**I-LP-PM-25-012**	N/T	**27**	**40**	**62**	**62**	**APTO**
04	**WSLL 19mm**	**M24**	**C-4**	**71**	**5000**	BC	S/I	BC	N/T	**I-LP-PM-25-012**	N/T	**36**	**40**	**71**	**71**	**APTO**
05	**WSLL 19mm**	**M24**	**C-5**	**71**	**5000**	BC	S/I	BC	N/T	**I-LP-PM-25-012**	N/T	**36**	**40**	**71**	**71**	**APTO**
06	**WSLL 14mm**	**M16**	**C-6**	**62**	**2000**	BC	S/I	BC	N/T	**I-LP-PM-25-012**	N/T	**27**	**40**	**62**	**62**	**APTO**
07	**WSLL 14mm**	**M16**	**C-7**	**62**	**2000**	BC	S/I	BC	N/T	**I-LP-PM-25-012**	N/T	**27**	**40**	**62**	**62**	**APTO**

REPORTE DE INSPECCIÓN DE CÁNCAMOS							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	N°. O.I:		Nº REPORTE	I-CA-25-005
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO. CÁNCAMOS **COMPARTIMIENTO AREA GENERADOR BG-1 y BG-2**					FECHA	12/03/2025
						FECHA PROXIMA INSP	112/03/2026

Nº	DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO			DATOS TÉCNICOS		CONDICIONES CUALITATIVAS				PRUEBA	CONDICIONES DIMENSIONALES					CONCLUSIÓN
						ESTRUCTURA					DIMENSIONAMIENTO (MM.)					
	FABRICANTE	TIPO	SERIAL Y/O CÓDIGO	Ø NOMINAL ROSCA (mm.)	CAP. NOM (kg.)	CUERPO	EJE	OJAL	ROSCA	END (PT)	A	B	C	D	E	CONDICIÓN / CERTIFICACIÓN
08	WSLL 14mm	M16	C-8	62	2000	BC	S/I	BC	N/T	I-LP-PM-25-012	N/T	27	40	62	62	APTO
09	WSLL 14mm	M16	C-9	62	2000	BC	S/I	BC	N/T	I-LP-PM-25-012	N/T	27	40	62	62	APTO
10	WSLL 14mm	M16	C-10	62	2000	BC	S/I	BC	N/T	I-LP-PM-25-012	N/T	27	40	62	62	APTO
11	WSLL 14mm	M16	C-11	62	2000	BC	S/I	BC	N/T	I-LP-PM-25-012	N/T	27	40	62	62	APTO
12	WSLL 14mm	M16	C-12	62	2000	BC	S/I	BC	N/T	I-LP-PM-25-012	N/T	27	40	62	62	APTO
13	WSLL 14mm	M16	C-13	62	2000	BC	S/I	BC	N/T	I-LP-PM-25-012	N/T	27	40	62	62	APTO
	COMPARTIMIENTO AREA GENERADOR BG-1															
14	WSLL 19mm	M20	C-14	71	3000	BC	S/I	BC	N/T	I-LP-PM-25-012	N/T	30	40	71	71	APTO
15	WSLL 14mm	M16	C-15	62	2000	BC	S/I	BC	N/T	I-LP-PM-25-012	N/T	27	40	62	62	APTO
16	WSLL 14mm	M16	C-16	62	2000	BC	S/I	BC	N/T	I-LP-PM-25-012	N/T	27	40	62	62	APTO

LEYENDA:
B/C: Buenas Condiciones **M/C:** Malas Condiciones **S/I:** Sin Información **S/A:** Sin Acceso **N/A:** No aplica

INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO (CÁNCAMOS)

REPORTE DE INSPECCIÓN DE CÁNCAMOS							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	N°. O.I.:		Nº REPORTE	I-CA-25-005
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO. CÁNCAMOS **COMPARTIMIENTO AREA GENERADOR BG-1 y BG-2**					FECHA	12/03/2025
						FECHA PROXIMA INSP	112/03/2026

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE CÁNCAMOS



COMPARTIMIENTO AREA GENERADOR BG-2

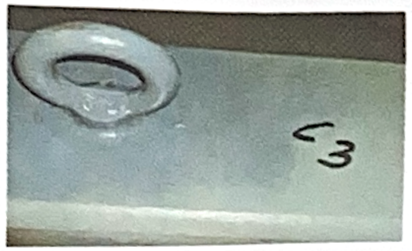

INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO (CÁNCAMOS)

REPORTE DE INSPECCIÓN DE CÁNCAMOS							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	N°. O.I.:		Nº REPORTE	I-CA-25-005
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO. CÁNCAMOS **COMPARTIMIENTO AREA GENERADOR BG-1 y BG-2**					FECHA	12/03/2025
						FECHA PROXIMA INSP	112/03/2026

COMPARTIMIENTO AREA GENERADOR BG-1





REPORTE DE INSPECCIÓN DE CÁNCAMOS							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	N°. O.I.:		Nº REPORTE	I-CA-25-005
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO. CÁNCAMOS **COMPARTIMIENTO AREA GENERADOR BG-1 y BG-2**					FECHA	12/03/2025
						FECHA PROXIMA INSP	112/03/2026

RECOMENDACIONES	
Nº ELEMENTOS / SERIAL	**ACCIONES**
10 cáncamos de diferente tamaños	Verificar que el aparejo esté identificado indicando el fabricante, el tamaño o la capacidad de carga nominal correspondiente y en el caso de cáncamos, el grado de aleación sí aplica.
	Verificar que no posea excesiva corrosión o picaduras.
	Verificar que no posea deformación plástica debido a doblez, elongación o compresión en ninguna de las partes del aparejo.
	No se permitirá daño excesivo de la rosca. **No se permitirá efectuar ningún tipo de soldadura u otro proceso que implique calentamiento del material.** A demás de los puntos expuestos anteriormente, se deberá inspeccionar mediante ensayo con líquidos penetrantes o partículas magnéticas (**I-LP-PM-25-012**) el aparejo en sus puntos críticos.

OBSERVACIONES:

LOS RESULTADOS INDICADOS EN ESTE REPORTE SE ENCUENTRAN ASOCIADOS A LAS CONDICIONES DE CONFORMIDAD DE LOS APAREJOS DE IZAMIENTO EVALUADOS EN LA FECHA DE INSPECCIÓN EN REFERENCIA.

- *ESTOS RESULTADOS TIENEN UNA VIGENCIA DE MÁXIMO DOCE (12) MESES CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA ASME/ANSI B 30.26, ASME B 18.15, NORMA COVENIN 3930, CONDIGO ASME SECCIÓN V ART. 9 Y 7, PROCEDIMIENTOS INTERNOS INTEST, C.A Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.*
- *ESTA CONFORMIDAD PERDERÁ VIGENCIA UNA VEZ CUMPLIDA SU FECHA DE PRÓXIMA VERIFICACIÓN, O CUANDO EN EL APAREJO OCURRAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:*

1.- EVIDENCIA DE DAÑOS VISIBLES RELEVANTES QUE AFECTEN SU CONDICIÓN ESTRUCTURAL Y OPERACIONAL.
2.- CUANDO EL APAREJO HAYA SIDO SOMETIDO A SOBRECARGAS O HAYA ESTADO INVOLUCRADO EN ACCIDENTES OPERACIONALES.
3.- CUANDO EL APAREJO SEA MODIFICADO O ALTERADO EN SU DISEÑO ORIGINAL.
4.- CUANDO EL APAREJO SEA SOMETIDO A UNA REPARACIÓN CON SOLDADURA O CORTE NO AUTORIZADO.

INSPECTOR (ES):	Ing. Dalmilo Rosales Nivel II IV	FECHA: 12/03/2025	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	Ing Javier Rodriguez Nivel II IV N° 037-2026	FECHA: 12/03/2025	FIRMA:

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Termico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberias y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 032729954O

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección física: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-80 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246892017.
Email: invermulca14@gmail.com javierodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

CAL-031

REPORTE PARA INSPECCIÓN CON LÍQUIDOS PENETRANTES

CLIENTE: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	FECHA 12-13 /03/2025	RIF: J-070043482	RPORTE N°: I-LP-PM-25-012
EQUIPO / PIEZA A ENSAYAR: INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO (cáncamo) medidas varias **COMPARTIMIENTO AREA GENERADOR BG-1 / BG2**	TÉCNICA (S) APLICADA (S) CONTRASTE CON COLORES ASTM-E-165	NORMA CÓDIGO: ANSI / ASME B31.3 ASME V-SECC.6	

CONDICIONES DEL ENSAYO

ESTAMPA DEL SOLDADOR:	JUNTAS:	ESTADO DE LA SUPERFICIE:
Cáncamos varias marcas AREA GENERADOR BG-2	C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10-C11-C12-C13	LISA
Cáncamos varias marcas AREA GENERADOR BG-1	C14-C15-C16	LISA

`**NOTA**: Estos cáncamos están soldado a la estructura donde están los generadores

LIMPIEZA PREVIA:
TRAPO Y CEPILLO

TIPO DE PRODUCTO

PENETRANTE	REVELADOR	LIMPIADOR
ASTM - 165	ASTM - 165	ASTM – 165

APLICACIÓN DEL PENETRANTE	SPRAY ■	IMMERSION ☐	BROCHA ☐	TIEMPO DE PENETRACIÓN: 10 MIN.
MÉTODO DE REMOCIÓN DE EXCESO DE PENETRANTE	CON AGUA ☐	POST EMULSIFICANTE ☐	CON SOLVENTE ■	
APLICACIÓN DEL REVELADOR:	SECO ☐	HÚMEDO NO ACUOSO ■	ACUOSO ☐	

EVALUACIÓN DEL ENSAYO:
Se realizó el ensayo de líquido penetrante a los Cáncamos por donde se realizan el izamiento con una duración de penetración de 10 minuto **sin observarse discontinuidades que pudieran afectar el elemento**

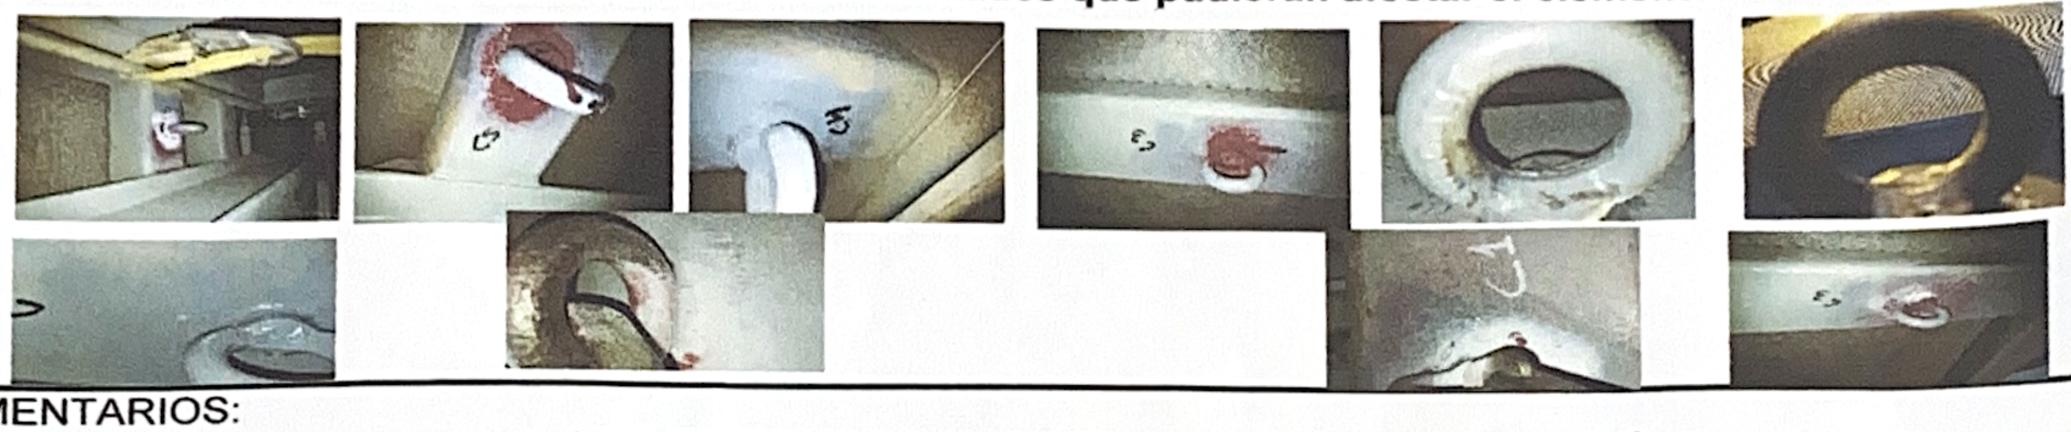

COMENTARIOS:
LOS RESULTADO FUERON SATISFACTORIO

REALIZADO POR:
NOMBRE: Javier Rodríguez Nivel II LP N°038-2026
FIRMA: Nivel II IV N° 037-2026
FECHA: 12/03/2025

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
