INFORMACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL EQUIPO:

1. PROPIEDAD DE: SAMFOR.
2. TAG: S/I
3. O.D TRABAJO: SF-624
4. MARCA: CROSBY
5. MODELO: 81PS1F68-8
6. SERIAL: T-09-25172
7. TIPO: SEGURIDAD/ALIVIO
8. TAMAÑO: 3/4X1”
9. ANSI: NPTF X NPTF

● **REALIZADO POR:**
ING. ISIDRO SOTO.

Válvula de Seguridad Marca: Crosby. Informe de las Condiciones Físicas.

mayo 12

2025

1.- Objetivo: Informar sobre el estatus físico de 1 válvula de Seguridad a fin de tomar acciones correctivas que le devuelva sus condiciones operativas originales a los costos presupuestados. Se describe sus características a continuación:

1 Válvula de Seguridad Crosby tamaño ¾ x 1”NPTF.

2.-Alcance: Este informe describirá las condiciones físicas que presentan cada componente y las acciones correctivas que se ejecutarían dentro de los costos presupuestados.

3.- Descripción de Hallazgos:

3.1). <u>Válvula de Seguridad Crosby Tamaño ¾ x 1” NPTF (SF-624)</u>

3.2). Desensamble de Válvula de Seguridad: Se muestra su llegada al taller a continuación y su desensamble:






3.2.1) Disco/Tapón (Condición Inicial): Se observó desgaste y rayaduras en su área de sello y sello (aro).

Acción Correctiva: Se rectificó (para pulir) el área de sello de dicho disco y se fabricó su sello en material teflón.







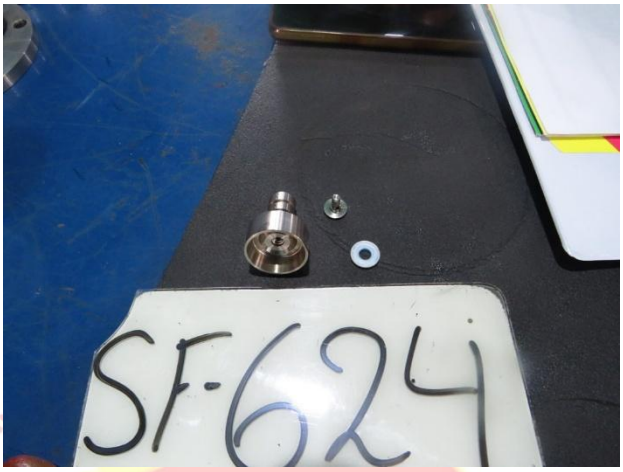


3.2.2) Tobera/Asiento (Condición Inicial): Presentó desgaste y rayaduras leves en su área de sello.

Acción Correctiva: Se rectifico (para pulir) dicho asiento en su área de sello.






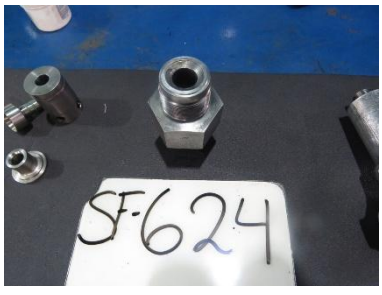



3.2.3) Guía (Condición Inicial): Se observó desgaste y rayaduras leves en su área de sello.

Acción Correctiva: Se rectifico (para pulir) dicha pieza mencionada.

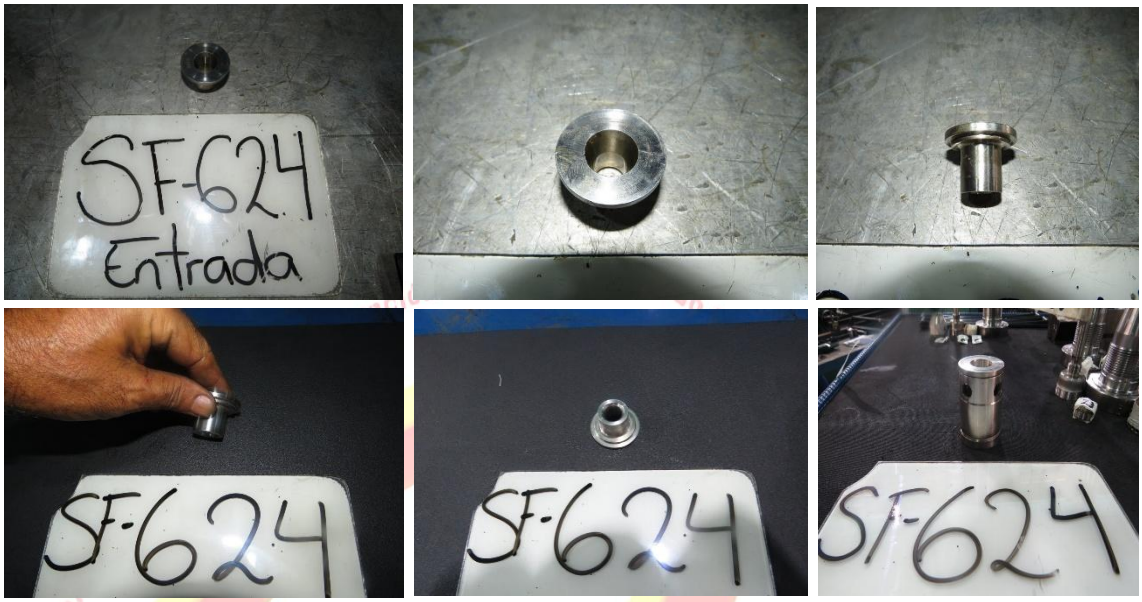


SOTO FLOW

3.2.4) Empacadura y O-ring (Condición Inicial): Se observaron las empacaduras y o-ring degastadas.

Acción correctiva: Se colocaron unas nuevas empacaduras y O-rings en dicha válvula.



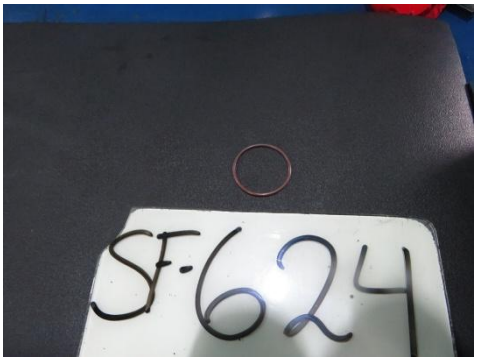

PRUEBA DE LA VALVULA:

- **A LA VALVULA SE LE REALIZO SU PRUEBA CORRESPONDIENTE PRESION DISPARO Y DE CONTRA-PRESION, DICHA PRUEBA ARROJO LOS SIGUIENTES DATOS:**

***PRESION DE DISPARO:** 140PSI.
***MEDIO DE PRUEBA:** NITROGENO.
***CONTRA-PRESION:** 140PSI x 10%
***RESULTADO:** SATISFACTORIO.





Recomendaciones:

A) Realizar mantenimiento preventivo con un intervalo máximo de un (1 año) a fin de ahorrar costos y minimizar el impacto de una parada imprevista que implicaría un incremento del presupuesto.

B) Asegurarse de la correcta selección de los materiales en base a las exigencias del fluido, para eso es necesaria la información contenida en el data sheet del equipo, la de campo obtenida con la inspección visual y el tiempo de servicio del equipo.

C) Anexos: Se anexa foto de la válvula recién llegada al taller (SF-624).





D.-Anexos: Se anexa foto de la válvula pintada y lista para salir del taller (SF-624)





