SONOTEST

J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO DE CARGA

EQUIPO APTO

CISS: IN25S19710

Propietario:	PETROBOSCAN, S.A.		
Equipo No.:	BG-1	**Cód. Sonotest:**	3450024502-ZLG-6087
Tipo:	GRUA MONORIEL	**Fecha de Inspección:**	06/08/2025
Serial:	ZLG-6087	**Fecha de Vencimiento:**	06/08/2026
Marca:	CHESTER	**Capacidad Nominal:**	10.000 KGS
Modelo:	ZEPHYR	**Cap. Trabajo Seguro:**	9.072 KGS

De acuerdo al informe de inspección No.: 067-060825-01 de Fecha: 07/08/2025 el equipo se encuentra 'APTO' para operar dentro de las condiciones y parámetros establecidos en las tablas de carga, recomendaciones suministradas por el fabricante y especificaciones del equipo inspeccionado.

Observaciones: NO EXCEDER EL LIMITE DE CARGA DE LA VIGA MONORRIEL 20.000 LBS / 9.072 KG.

Lugar de Insp.: TURBOGENERADOR BG1, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO-ZULIA.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SÁNCHEZ
FIS-0023-003	FIS-0023-002	REPRESENTANTE
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

Número del Documento: S-7150-B

SONOTEST

J-07049150-7

Organismo de Inspección
Gerencia de Operaciones (Ciudad Ojeda)
Coordinación de Operaciones
(IEI, IEP, EQP, END, MQS)

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

No. Certificado: CO-06-08-25-01

CISS: IN25S19710

CERTIFICADO DE EQUIPO DE IZAMIENTO DE CARGA
INSPECCIÓN DE GRUA MONORIEL

El equipo abajo identificado ha sido inspeccionado de acuerdo a las Normas:
ASME B30.11 PDVSA CAP 14 COV 3510-1999 y Procedimientos Sonotest, S.A. IEI-MA-01

Código Sonotest: 3450024502-ZLG-6087
Propietario: PETROBOSCAN, S.A.
Tipo de Equipo: GRUA MONORIEL
Subtipo: DE CADENA
No. del Equipo: BG-1
Fabricante: CHESTER
Capacidad Nominal: 10.000 KGS
Modelo: ZEPHYR
Serial: ZLG-6087
Año de Fab.: 2010

CONDICIONES DEL EQUIPO CERTIFICADO
de Líneas: N/A **Cap. del Bloque:** 10.000 KGS **Cap. Trabajo Seguro:** 9.072 KGS

CARACTERISTICAS DEL CABLE DE ACERO
Diámetro (mm): N/A **Clasificación:** N/A **Factor de Seguridad:** N/A
Resist. Ruptura: N/A **Clase/Grado:** N/A **Arrollado:** N/A

CARACTERISTICAS DEL MALACATE (PRINCIPAL)
Marca: N/A **Modelo:** N/A **Año:** N/A
Serial: N/A **Potencia:** N/A

CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA PLUMA
Marca: N/A **Modelo:** N/A **Año:** N/A
Capacidad Nominal: N/A **Altura:** N/A **Longitud:** N/A
Serial: N/A

De acuerdo al informe de inspección Nº: 067-060825-01 de Fecha: 07/08/2025 el equipo se encuentra 'APTO' para operar dentro de las condiciones y parámetros establecidos en las tablas de carga, recomendaciones suministradas por el fabricante y especificaciones del equipo inspeccionado.

Observaciones: NO EXCEDER EL LIMITE DE CARGA DE LA VIGA MONORRIEL 20.000 LBS / 9.072 KG.

Lugar de Insp.: TURBOGENERADOR BG1, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO-ZULIA.

Fecha de Inspección: **Inicio:** 06/08/2025 **Culminación:** 06/08/2025

Fecha de Vencimiento: 06/08/2026

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SÁNCHEZ
FIS-0023-003	FIS-0023-002	REPRESENTANTE
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

Nota: 1.- Este certificado no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo 2.- Este certificado pierde validez al cumplirse la fecha de vencimiento o cuando el equipo se involucre en un accidente de cualquier naturaleza. En los equipos móviles debe considerarse su reinspección, para asegurar su operabilidad, cuando: 1) Se efectúen modificaciones al diseño, 2) Exista duda sobre su condición, 3) Se haya hecho un traslado

Número del Documento: **S-7150-B**

Calle Campo Elías Nº. 122-A, Ciudad Ojeda, Estado Zulia, Venezuela. Telef. (0265) 6628329 / 6315272; Móvil (0414) 6481361 / 6185934.
Página Web: www.sonotest.com, e-mail: sonotest@sonotest.com

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO
GRÚA MONORRIEL O GANTRY

FECHA DEL INFORME:	7 de agosto de 2025	**REPORTE N°:**	067-060825-01

PROPIETARIO:	PETROBOSCAN, S.A.				
LUGAR:	TURBOGENERADOR BG1, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO. ZULIA.				
EQUIPO No:	**BG-1**	**SERIAL:**	ZLG-6087	**CAP. NOMINAL:**	10.000 KGS
MODELO:	ZEPHYR	**TIPO:**	GRÚA MONORRIEL	**SUB-TIPO:**	CADENA
MARCA:	CHESTER	**AÑO:**	2010	**FABRICANTE:**	CHESTER
CAPACIDAD NOMINAL (S.I.):	10.000 KGS	**CAPACIDAD DE TRABAJO SEGURO (S.I.):**			9.072 KGS
FECHA DE INICIO DE INSPECCIÓN:	06/08/2025	**FECHA DE CULMINACIÓN DE INSPECCIÓN :**			06/08/2025
NORMAS APLICABLES:	ASME B30,11 /PDVSA CAP. 14 /COVENIN 3510-1999	**PROCEDIMIENTO SONOTEST:**			IEI-MA-01



GRÚA MONORRIEL O GANTRY

OBSERVACIONES

- EL EQUIPO **ESTÁ APTO** PARA REALIZAR TRABAJOS DE IZAMIENTO.
- NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DE LA VIGA MONORRIEL **20.000 Lbs/9.072 Kg (9 ton).**
- REVISAR DIARIAMENTE EL EQUIPO POR PARTE DEL OPERADOR Y CUALQUIER ANORMALIDAD PASARLA POR ESCRITO AL CUSTODIO, EL CUAL DEBERÁ TOMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS.
- NOTA: EL EQUIPO UTILIZA UNA EXTENSIÓN DE LA VIGA MONORRIEL, QUE SE ANEXA PARA PODER SACAR LA TURBINA.
- REALIZAR EL MANTENIMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

Los resultados de la inspección corresponden exclusivamente al equipo:
MARCA: CHESTER SERIAL N°: ZLG-6087
El cual ha sido inspeccionado de acuerdo con los procedimientos de inspección de SONOTEST, S. A., las normas PDVSA, COVENIN, ASME / ANSI Serie B30 y API RP aplicables y se encuentra en condición: CONFORME

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN25S19710**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

DATA HISTÓRICA DEL EQUIPO

Verificar el historial del equipo relacionado con:

N° Renglón	Descripción	Condición
1	Record de Inspecciones	Presenta y está actualizado
2	Record de Modificaciones del Elevador	Presenta y está actualizado
3	Record de Modificaciones Aguilón-Pescante	Presenta y está actualizado
4	Reportes Ensayos Carga al Aguilón	Presenta y está actualizado
5	Manual de Operaciones	No presenta

OBSERVACIONES

- El equipo tiene inspección anterior realizada por SONOTEST, S.A.
- La empresa SAMFOR, suministró la documentación requerida.

CONTROLES (Procedimiento IEI-PI-12)

N° Renglón	Descripción	Condición
6	Cadena de Control	Buenas condiciones
7	Mando de Control Eléctrico	No presenta
8	Cable del Mando de Control	No presenta

OBSERVACIONES

- El equipo es controlado desde el piso por un control manual de cadena, para izar y trasladar la carga.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (Procedimiento IEI-PI-18)

N° Renglón	Descripción	Condición
9	Topes del Carro	Buenas condiciones
10	Limitador de Recorrido	Buenas condiciones
11	Dispositivos Anti-Two Block	No aplica
12	Dispositivos de Advertencia	No aplica
13	Conexiones Eléctricas	No aplica

OBSERVACIONES

- Los topes presentan buenas condiciones.
- El equipo presenta buenas condiciones de los límites de seguridad, no utiliza anti-two-block.

CARRO O TROLLEY (Procedimiento IEI-PI-10)

N° Renglón	Descripción		Condición
14	Marca:	Capacidad:	Buenas condiciones
15	Ejes y Pasadores		Buenas condiciones
16	Ruedas		Buenas condiciones
17	Tapas		Buenas condiciones
18	Transmisión / Engranajes		No aplica
19	Alineación con la Viga		Buenas condiciones
20	Topes / Parachoques		Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El trolley presenta buenas condiciones.
- Los pasadores del trolley estaban ensamblados al momento de la inspección.
- Descripción del trolley: Marca: **CHESTER** Modelo: **ZEPHYR** Capacidad: **10** **TON.**

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

ELEVADOR DE CARGA (Procedimientos IEI-PI-05 / IEI-PI-08)

N° Renglón	Descripción	Condición
21	Ranura / Poleas	Buenas condiciones
22	Motor	No aplica
23	Poleas Ecualizadoras	Buenas condiciones
24	Frenos Aire: Eléctricos: X Mecánicos:	Buenas condiciones
25	Caja de Engranajes	No aplica
26	Tambor o Polea de Engranaje	No aplica
27	Ranuras del Tambor	No aplica
28	Frenos del Sistema de Carga (Subir-Bajar)	Buenas condiciones
29	Tornillos de Sujeción y Soportes	Buenas condiciones
30	Soporte	Buenas condiciones
31	Otros	No aplica

OBSERVACIONES

- El equipo utiliza unicamente el elevador principal, es un polipasto.
- Descripción del polipasto: Marca: **CHESTER** Modelo: **CHESTER** Cap.: **10.000** Kgs

ESTRUCTURA DE IZAMIENTO (Procedimiento IEI-PI-13)

N° Renglón	Descripción	Condición
32	Estructura Soporte de Monorriel	Buenas condiciones
33	Sistema de Fijación de la Estructura	Buenas condiciones
34	Soldaduras o Pernos de Fijación de la Estructura	Buenas condiciones
35	Viga Monorriel Tipo: **"I" NP 30** Capacidad de Carga: **9.072** Kg	Buenas condiciones
36	Fijación de la Viga a la Estructura	Buenas condiciones
37	Topes del Carro	Buenas condiciones
38	Alineación de la Viga	Buenas condiciones
39	Soldaduras o Pernos de Unión Columna / Viga	Buenas condiciones
40	Resultados del END	No aplica
41	Marcaje de la Capacidad del Monorriel	Personalizar comentario

OBSERVACIONES

- La viga monorriel presenta buenas condiciones.
- La viga no tiene pintado la capacidad de carga de la estructura.
- Descripción de la viga monorriel: Viga tipo: **"I"** Alma: **28** cm Ala: **12,5** cm Altura: **3,3** mt
  Longitud (luz ó flecha): **7,8** mt Cap.: **9** ton Año: **2010** Marca: **BLP** S/N: **BLP-191793-01**

INSPECCIÓN DE CABLES (Procedimiento IEI-PI-07)

N° Renglón	Descripción							Condición
42	Aplicación	Diámetro	Clasificación	Clase/ grado	Resist. Ruptura	Factor de Seguridad	Arrollado	
42.1	**Principal**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica
42.2	**Auxiliar**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica
42.3	**Otros**							

EQUIPOS DE MEDICIÓN

GALGAS PARA POLEAS	CÓDIGO: **N/A**	FECHA DE CALIBRACIÓN:	**N/A**
VERNIER	CÓDIGO: **N/A**	FECHA DE CALIBRACIÓN:	**N/A**

OBSERVACIONES

- El equipo no utiliza cable de acero.

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

INSPECCIÓN DE LA CADENA (Procedimiento IEI-PI-10)

N° Renglón	Descripción							Condición
43	Aplicación	Diámetro	Clase/ grado	Long. del Eslabón	Ancho del Eslabón	Eslabones 10/20	Capacidad	
43.1	Principal	10,00 mm	100	65	45	41	3.993 Kgs	Buenas condiciones
43.2	Auxiliar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
43.3	Otros							

EQUIPO DE MEDICIÓN

VERNIER	CÓDIGO:	GE-I017-53	FECHA DE CALIBRACIÓN: 5/9/2024

OBSERVACIONES

- El cadena presenta buenas condiciones. Se realizó inspección visual.
- Descripción de la cadena: Marca: **CM** Ø : **0,394** = **3/8** Inch
  Grado: **100** Código: **QJD**

GANCHO Y BLOQUE DE CARGA (Procedimiento IEI-PI-03 / IEI-PI-10)

N° Renglón	Descripción					Condición
44	Capacidad:	**10.000** KGS	MARCA	**CHESTER**		Buenas condiciones
45	Peso	**S/I** KGS	SERIAL	**ZLG-6087**		Buenas condiciones
46	Poleas					Buenas condiciones
46.1	Número de Poleas:	**2**	Diámetro de Poleas:	**3"**		Buenas condiciones
46.2	Diámetro de la Ranura:	**3/8"**				Buenas condiciones
47	Tapas					Buenas condiciones
48	Pasadores o Ejes					Ensamblados
49	Retenedores / Ojales					Ensamblados
50	Uña de Seguridad					Buenas condiciones
51	Torcedura 0°					Buenas condiciones
52	Abertura de Garganta ≤ 5% o 1/4"		Lectura:	**115**	mm	Buenas condiciones
53	Desgaste ≤ 10%		Capacidad:	**10.000**	kg	Buenas condiciones
54	Marca:	**ALLOYS**	Serial N°:	**S/S**		Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- Se realizó ensayo con partículas magnéticas al gancho, obteniéndose buenos resultados.
- El bloque de carga utiliza dos poleas de cadena para cuatro líneas.
- El bloque y gancho son originales del fabricante.
- El gancho tiene visibles la identificación del fabricante.
- El diámetro o espesor de la garganta del gancho es: **55** mm

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

CÁLCULOS DEL LÍMITE DE TRABAJO SEGURO								
SEGÚN CAPACIDAD DEL CABLE O CADENA DE IZAMIENTO								
N° Renglón	**Descripción**							
55	**Aplicación**	**Resist. Ruptura**		**Factor de Seguridad**	**N° de líneas**	**Límite de trabajo seguro**		**Límite de trabajo seguro (S.I.)**	
55.1	**Cable Principal**	N/A		N/A	N/A	N/A	KGS	N/A	KGS
56	**Aplicación**	**CAPACIDAD**			**N° de líneas**	**Límite de trabajo seguro**		**Límite de trabajo seguro (S.I.)**	
56.1	**Cadena Principal**	3.993		Kgs	4	15.972	KGS	15.972	KGS
SEGÚN CAPACIDAD DE LOS GANCHOS								
N° Renglón	**Descripción**							
57	**Aplicación**	**Capacidad de carga**			**Capacidad de carga (S.I.)**			
57.1	**Gancho Principal**	10.000		KGS	10.000		KGS	
58	**Límite de trabajo seguro del equipo Sist. Principal**				**Límite de trabajo seguro del equipo Sist. Principal (S.I.)**			
58.1	9.072			KGS	9.072		KGS	

RECOMENDACIONES

1.- Realizar inspecciones periódicas a la cadena de carga y proceder a su reemplazo al momento de presentar deformación, desgaste o torceduras, según la ASME B30.11, 16 y 21.
2.- Mantener en buenas condiciones de legibilidad las indicaciones del control de mando.
3.- Mantener lubricado cadenas y engranajes.
4.- Mantener en buenas condiciones los topes del equipo y los dispositivos de seguridad.
5.- Revisar diariamente el equipo por parte del operador y cualquier anormalidad pasarla por escrito al custodio, el cual deberá tomar las acciones correctivas.
6.- Realizar el mantenimiento preventivo del equipo según especificaciones del fabricante.
7.- Realizar inspecciones periódicas a las ruedas del polipasto por parte del personal de mantenimiento y realizar ajustes a las mismas, para mantenerlas con la distancia correspondiente a las vigas.
8.- Mantener el gancho de carga con la uña de seguridad en buenas condiciones.
9.- El equipo utiliza una estructura/extensión del monorriel que es utilizado para sacar la turbina, el mismo consta de varios componentes identificados con los No. BLP-191793-01 (A)(B)(C)(D), los cuales tienen una capacidad de 20.000 Lbs / 9.072 kg.
10.- El equipo queda limitado para trabajar hasta **20.000 Lbs / 9.072 kgs** por la capacidad de la viga monorriel

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST
RIF J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SONOTEST
REVISION TECNICA — Firma — Conforme SI NO — Fecha 07 / 08 /2025
REVISION ADMINISTRATIVA — Firma — Conforme SI NO — Fecha 07 / 08 / 2025

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

GRÚA MONORRIEL O GANTRY

PRUEBA DE CARGA (Procedimiento IEI-PI-17)			
PROPIETARIO:	PETROBOSCAN, S.A.	Capacidad:	10.000 KGS
LUGAR:	TURBOGENERADOR BG1, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO. ZULIA.	Tipo:	GRÚA MONORRIEL
MARCA:	CHESTER	Sub-Tipo:	CADENA
MODELO:	ZEPHYR	Año de Fabricación:	2010
FABRICANTE:	CHESTER	Fecha de Prueba:	6/8/2025
NÚMERO DE CABLES:	4	Diámetro:	10,00 mm = Inch 1/2
SERIAL:	ZLG-6087	Clasificación:	100

PLUMA PROBADA	LONGITUD DEL MONORRIEL	CAPACIDAD NOMINAL	CARGA DE PRUEBA	% DE CARGA	TIEMPO DE PRUEBA	RESULTADOS
PRINCIPAL	7,80 Mts	10.000 Kgs	10.000 Kgs	100%	25 Min	Satisfactorio
AUXILIAR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Personalizar comentario

EQUIPO DE MEDICIÓN Y ENSAYO					
DINAMÓMETRO N°:	N/A	**MARCA:**	N/A	**MODELO:**	N/A
SERIAL:	N/A	**RANGO:**	N/A	**FECHA DE CALIBRACIÓN:**	N/A

MASA DE PRUEBA			
TIPO DE MASA:	BLOQUE DE CONCRETO	**PESO:**	**10.000** Kgs

OBSERVACIONES

- EL EQUIPO ESTÁ APTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE IZAMIENTO.
- NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DE LA VIGA MONORRIEL 20.000 Lbs/9.072 Kg (9 ton).
- SE UTILIZÓ PARA LA PRUEBA DE CARGA UN BLOQUE DE CONCRETO, EL CUAL SE VERIFICÓ SU PESO CON UN DINAMÓMETRO DE 10 TON, CERTIFICADO POR SENCAMER.
- UTILIZAR OPERADORES CERTIFICADOS Y CON EXPERIENCIA COMPROBADA.
- LA PRUEBA DE CARGA SE REALIZÓ A LA CAPACIDAD LÍMITE DEL MONORRIEL Y MÁXIMA DEL EQUIPO.
- SE VERIFICÓ LA DEFLEXIÓN DEL MONORRIEL CON LA CARGA EN EL CENTRO DEL MISMO.
- LA GRÚA ES UTILIZADA UNICAMENTE PARA LA MOVILIZACIÓN DE LA TURBINA BG-1.
- LA PRUEBA DE CARGA SE REALIZÓ A ESTA CAPACIDAD POR NO CONTAR CON UN PESO ADECUADO.
- LA PRUEBA DE CARGA FUE REALIZADA DESPLAZANDO LA CARGA EN LAS ÁREAS DE FÁCIL ACCESO, YA QUE EL EQUIPO TIENE EL ÁREA DE TRABAJO LIMITADA.

INSPECTOR

NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**


C.I.: **7.967.958**


CICB: **FIS-0023-003**

SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

ESQUEMA Y GRÁFICO DE LA PRUEBA DE CARGA

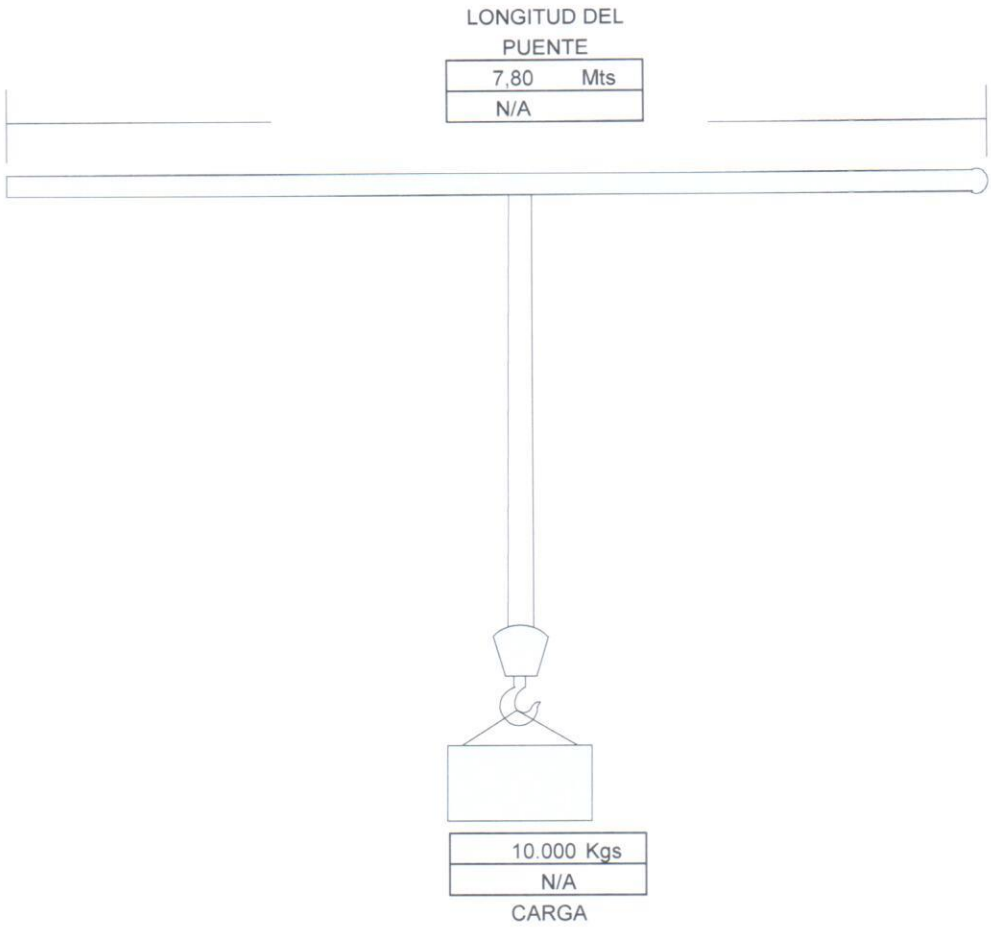


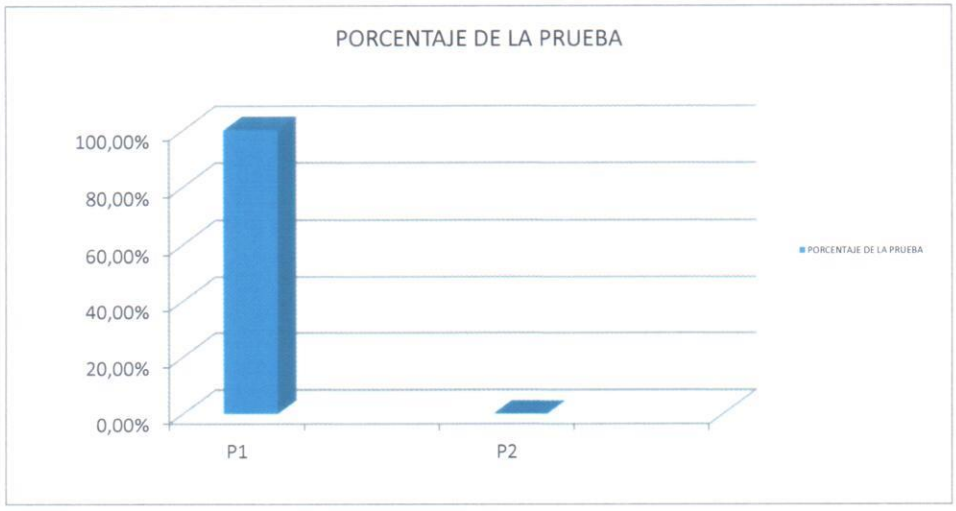


PRUEBA N°	P1	P2
PORCENTAJE	**100%**	N/A

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

ESQUEMA Y GRÁFICO DE LA PRUEBA DE CARGA

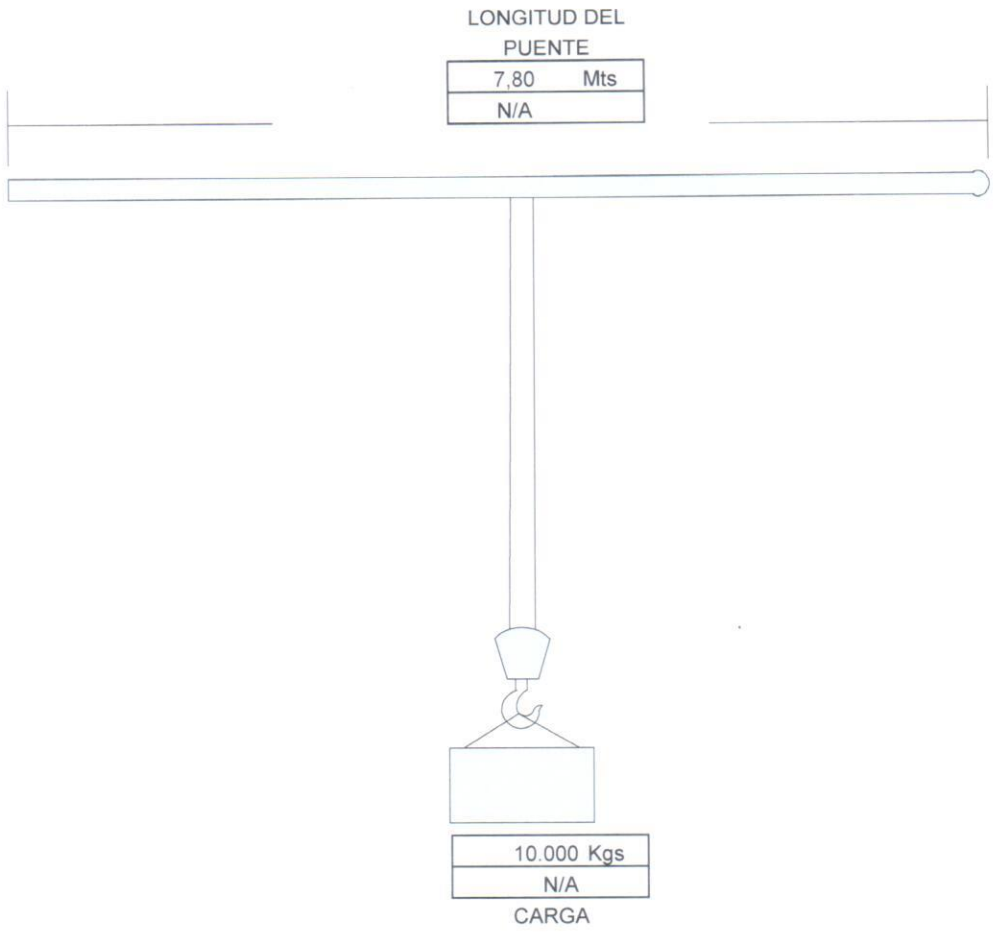


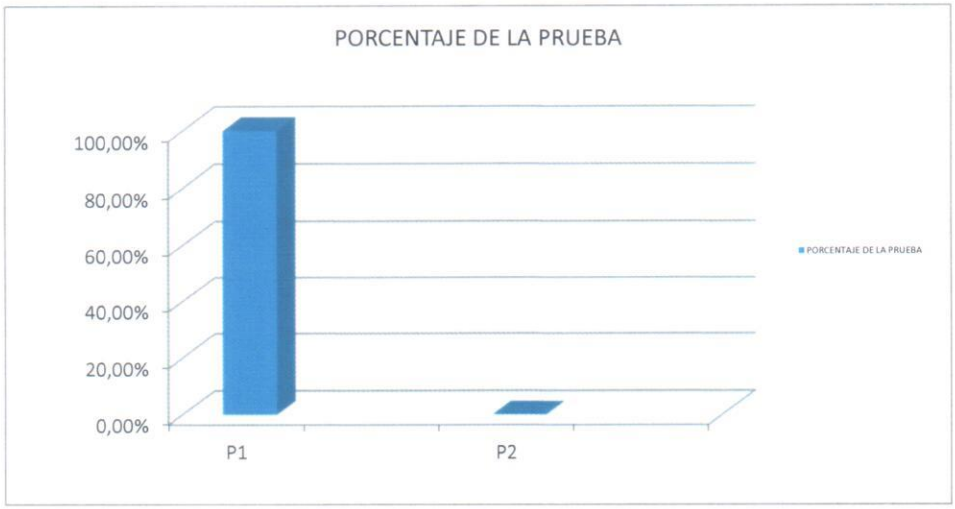

PRUEBA N°	P1	P2
PORCENTAJE	**100%**	N/A

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

VISTA DEL BLOQUE DE CARGA

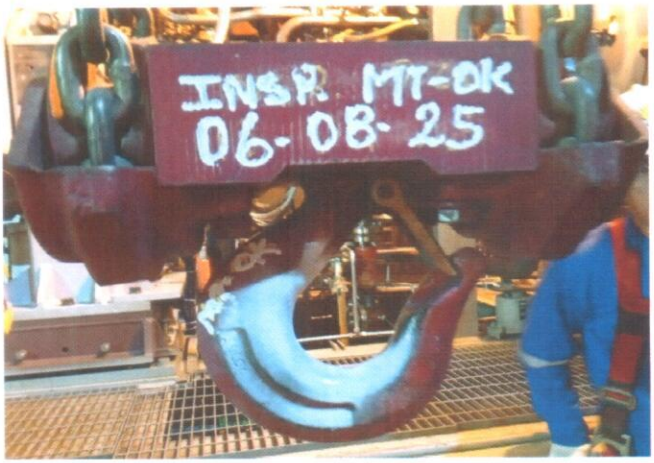


VISTA GENERAL DEL EQUIPO




VISTA DEL TROLLEY



VISTA DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN

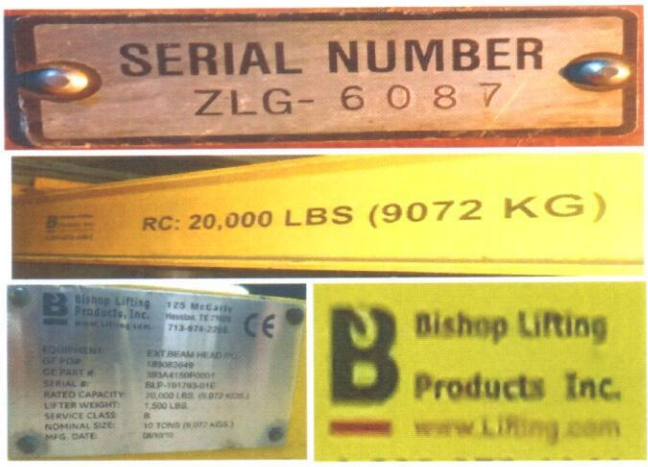

VISTA DE LA PRUEBA DE CARGA APLICADA AL EQUIPO

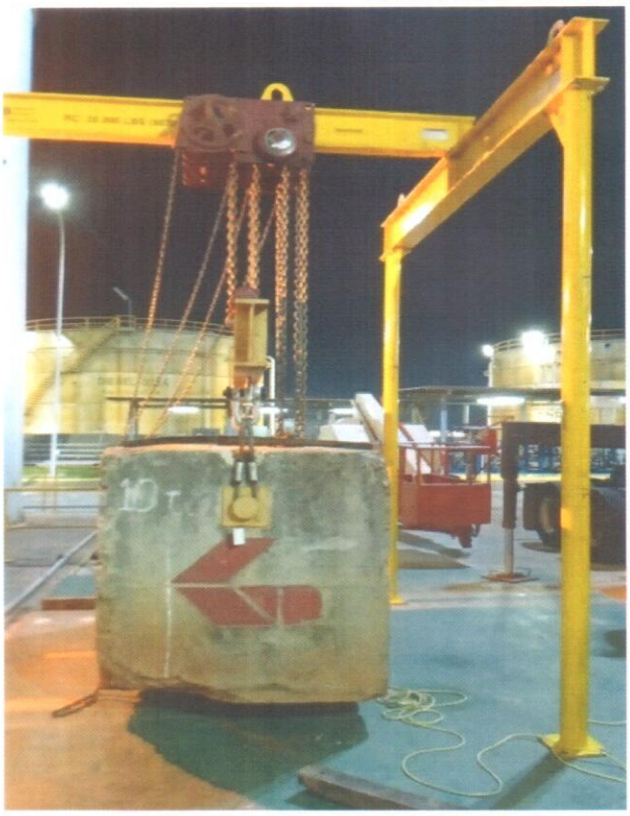



Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO
GANCHOS

FECHA DEL INFORME	7/8/2025
FECHA DE INSPECCIÓN	6/8/2025

REPORTE Nº	067-060825-01

CLIENTE	PETROBOSCAN, S.A.	**INFORMACIÓN DEL GANCHO**	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO		**MARCA**	ALLOYS
MARCA	CHESTER	**MODELO**	FORGED
MODELO	ZEPHYR	**SERIAL**	S/S
SERIAL	ZLG-6087	**CAPACIDAD**	10.000 KGS

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO: **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO	MT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	LIMPIA Y PULIDA

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				**MATERIALES**	
TIPO	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	23/7/2025	**COLOR**	NEGRAS/CONTR. BLANCO
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I017-53	**LIMPIADOR**	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I010-84	**PENETRANTE**	N/A
TIPO	N/A	**CÓDIGO/SERIAL**	N/A	**REVELADOR**	N/A

NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME V, ART. VII. / ASME B30.10 / PDVSA CAP. 14 / COVENIN 3212-1996

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS A LA GARGANTA DEL GANCHO No.: **S/S** DE CAPACIDAD **10.000** KG. OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.

OBSERVACIONES

- EL GANCHO **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO.
- NO SE DETECTARON DISCONTINUIDADES EN EL ÁREA DONDE SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN.

RECOMENDACIONES

1.- UTILIZAR ADECUADAMENTE PARA EVITAR DAÑOS MECÁNICOS.
2.- REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS, CON EL FIN DE DETECTAR GRIETAS, DEFORMACIÓN Y DESGASTE, SEGÚN NORMA APLICABLE.
3.- MANTENER LUBRICADO EL PUNTO DE GIRO DEL GANCHO.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	ASISTENTE
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE:
NIVEL: II	NIVEL: II	NIVEL:
FECHA: **7/8/2025**	FECHA: **7/8/2025**	FECHA:
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia.Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.
