SONOTEST

J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No. OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO DE CARGA

EQUIPO APTO

CISS: IN26S15193

Propietario:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.		
Equipo No.:	SML-400	**Cód. Sonotest:**	011124001001-CGP460G08879450FB
Tipo:	MONTACARGAS	**Fecha de Inspección:**	12/06/2026
Serial:	CGP460G08879450FB	**Fecha de Vencimiento:**	12/06/2027
Marca:	CLARK	**Capacidad Nominal:**	4.231 KGS
Modelo:	CGP50	**Cap. Trabajo Seguro:**	4.200 KGS

De acuerdo al informe de inspección No.: 067-120626-01 de Fecha: 15/06/2026 el equipo se encuentra 'APTO' para operar dentro de las condiciones y parámetros establecidos en las tablas de carga, recomendaciones suministradas por el fabricante y especificaciones del equipo inspeccionado.

Observaciones: NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO 4.200 KGS (4,2 TON)

Lugar de Insp.: PATIO SAMFOR, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO-ZULIA.

INSPECTOR	RESPONSABLE TECNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SÁNCHEZ
FIS-0023-003	FIS-0023-002	REPRESENTANTE
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

Número del Documento: S-7304-B

SONOTEST

J-07049150-7

Organismo de Inspección
Gerencia de Operaciones (Ciudad Ojeda)
Coordinación de Operaciones
(IEI, IEP, EQP, END, MQS)

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

No. Certificado: CO-15-06-26-03

CISS: IN26S15193

CERTIFICADO DE EQUIPO DE IZAMIENTO DE CARGA
INSPECCIÓN DE MONTACARGAS

El equipo abajo identificado ha sido inspeccionado de acuerdo a las Normas:
ANSI B 56.1A/ PDVSA CAP. 14 COV.3177-05 y Procedimientos Sonotest, S.A. IEI-MA-01

Código Sonotest: 011124001001-CGP460G08879450FB
Propietario: SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.
Tipo de Equipo: MONTACARGAS
Subtipo: CADENA
No. del Equipo: SML-400
Fabricante: CLARK
Capacidad Nominal: 4.231 KGS
Modelo: CGP50
Serial: CGP460G08879450FB
Año de Fab.: S/I

CONDICIONES DEL EQUIPO CERTIFICADO
de Líneas: N/A **Cap. del Bloque:** N/A **Cap. Trabajo Seguro:** 4.200 KGS

CARACTERISTICAS DEL CABLE DE ACERO
Diámetro (mm): N/A **Clasificación:** N/A **Factor de Seguridad:** N/A
Resist. Ruptura: N/A **Clase/Grado:** N/A **Arrollado:** N/A

CARACTERISTICAS DEL MALACATE (PRINCIPAL)
Marca: N/A **Modelo:** N/A **Año:** N/A
Serial: N/A **Potencia:** N/A

CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA PLUMA
Marca: N/A **Modelo:** N/A **Año:** N/A
Capacidad Nominal: N/A **Altura:** N/A **Longitud:** N/A
Serial: N/A

De acuerdo al informe de inspección Nº: 067-120626-01 de Fecha: 15/06/2026 el equipo se encuentra 'APTO' para operar dentro de las condiciones y parámetros establecidos en las tablas de carga, recomendaciones suministradas por el fabricante y especificaciones del equipo inspeccionado.

Observaciones: NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO 4.200 KGS (4,2 TON)

Lugar de Insp.: PATIO SAMFOR, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO-ZULIA.

Fecha de Inspección: **Inicio:** 12/06/2026 **Culminación:** 12/06/2026

Fecha de Vencimiento: 12/06/2027

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SÁNCHEZ
FIS-0023-003	FIS-0023-002	REPRESENTANTE
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF J-07049150-7

Nota: 1.- Este certificado no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo 2.- Este certificado pierde validez al cumplirse la fecha de vencimiento o cuando el equipo se involucre en un accidente de cualquier naturaleza. En los equipos móviles debe considerarse su reinspección, para asegurar su operabilidad, cuando: 1) Se efectúen modificaciones al diseño, 2) Exista duda sobre su condición, 3) Se haya hecho un traslado

Número del Documento: **S-7304-B**

Calle Campo Elías Nº. 122-A, Ciudad Ojeda, Estado Zulia, Venezuela. Telef. (0265) 6628329 / 6315272; Móvil (0414) 6481361 / 6185934.
Página Web: www.sonotest.com, e-mail: sonotest@sonotest.com

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO
MONTACARGAS

FECHA DEL INFORME:	15 de junio de 2026	**INFORME N°:**	067-120626-02
PROPIETARIO:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)		
LUGAR:	PATIO SAMFOR, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO. ZULIA.		

EQUIPO No:	**SML-400**	**SERIAL:**	CGP460G-0887-9450FB	**CAP. NOMINAL:**	9.325 LBS
MODELO:	CGP50	**TIPO:**	MONTACARGAS	**SUB-TIPO:**	DE CADENA
MARCA:	CLARK	**AÑO:**	S/I	**FABRICANTE:**	CLARK
CAPACIDAD NOMINAL (S.I.):	4.231 KGS	**CAPACIDAD DE TRABAJO SEGURO (S.I.):**		4.200	KGS
FECHA DE INICIO DE INSPECCIÓN:	12/06/2026	**FECHA DE CULMINACIÓN DE INSPECCIÓN :**		12/06/2026	
NORMAS APLICABLES:	ANSI B56.1A / PDVAS CAP. 14 / COVENIN 3177-2005	**PROCEDIMIENTO SONOTEST:**		IEI-MA-01	



MONTACARGAS

OBSERVACIONES

- EL EQUIPO ESTÁ APTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE IZAMIENTO.
- NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO **4.200 Kgs (4,2 ton).**
- REVISAR DIARIAMENTE EL EQUIPO POR PARTE DEL OPERADOR Y CUALQUIER ANORMALIDAD PASARLA POR ESCRITO AL CUSTODIO, EL CUAL DEBERÁ TOMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS.
- UTILIZAR OPERADORES CERTIFICADOS Y CON EXPERIENCIA COMPROBADA.
- UTILIZAR EL EQUIPO UNICAMENTE PARA LOS TRABAJOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE.

Los resultados de la inspección corresponden exclusivamente al equipo:
MARCA: CLARK SERIAL N°: CGP460G-0887-9450FB
El cual ha sido inspeccionado de acuerdo con los procedimientos de inspección de SONOTEST, S. A., las normas PDVSA, COVENIN, ASME / ANSI Serie B30 y API RP aplicables y se encuentra en condición: CONFORME

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S15193**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, N° 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

DATA HISTÓRICA DEL EQUIPO		
Verificar el historial del equipo relacionado con:		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
1	Reportes de inspecciones anteriores realizadas	Presenta y esta actualizado
2	Existencia del Programa de Mantenimiento	Presenta y esta actualizado
3	Reporte de Reparaciones / Modificaciones Efectuadas	Presenta y esta actualizado
4	Record de la Prueba de Carga	Presenta y esta actualizado
5	Manual de Operaciones	Presenta y esta actualizado

OBSERVACIONES

- El equipo tiene inspección anterior.
- La empresa SAMFOR, suministró la documentación requerida.

TABLA DE CARGA		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
6	Estado de la Configuración	Buenas condiciones
7	Condiciones de Legibilidad	Buenas condiciones
8	Ubicación al Operador	Buenas condiciones

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (Procedimiento IEI-PI-18)		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
9	Luz Ulular	Buenas condiciones
10	Alarma de Retroceso	Buenas condiciones
11	Corneta	Buenas condiciones
12	Franjas de Seguridad	Buenas condiciones
13	Luces	Buenas condiciones
14	Manómetros	Buenas condiciones
15	Extintor de Incendios	Buenas condiciones
16	Retrovisores	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El equipo tiene colocado el gráfico de carga en la parte lateral de la cabina.
- Los dispositivos de seguridad presentan buenas condiciones.

TREN DE MARCHA (Procedimiento IEI-PI-14)		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
17	Chasis	Buenas condiciones
18	Neumáticos Compactos ☑ Inflables ☐	Buenas condiciones
19	Dirección Hidráulica ☑ Dirección Mecánica ☐	Buenas condiciones
20	Frenos	Buenas condiciones
21	Bomba Hidráulica	Buenas condiciones
22	Mangueras y Conexiones	Buenas condiciones
23	Pernos / Tornillos / Tuercas de Sujeción de Cauchos	Buenas condiciones
24	Motor	Buenas condiciones
25	Sistema de Escape	Buenas condiciones
26	Ejes de Transmisión	Buenas condiciones
27	Ejes de Dirección	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El equipo utiliza cauchos, con la siguiente descripción:

Delanteros, Marca: **DOBERMAN** Tipo: **SUPER E.** # **8,25-15** Cap.: **6.500** **Kg** Presión: **N/A** psi

Traseros, Marca: **DOBERMAN** Tipo: **SUPER E.** # **7.00-12** Cap.: **5.000** **Kg** Presión: **N/A** psi

- Utiliza motor, Marca: **VOLTEC** Modelo: **4 Cilindro.** Serial: **4300LT**

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

CABINA / ESTACIÓN DEL OPERADOR (Procedimiento IEI-PI-12)		
N° Renglón	Descripción	Condición
28	Protección al Operador	Buenas condiciones
29	Estructura	Buenas condiciones
30	Estado de la Pintura	Buenas condiciones
31	Acceso / Peldaños	Buenas condiciones
32	Freno de Parada	Buenas condiciones
33	Vidrio	No aplica
34	Retrovisores	Buenas condiciones
35	Freno de Pedal	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- La cabina presenta buenas condiciones.
- La cabina no utiliza vidrios.
- La proteccion del operador, tiene la placa de información de la resistencia al impacto **24.000** Lb/f

SISTEMA DE CARGA (Procedimiento IEI-PI-13)		
N° Renglón	Descripción	Condición
36	Horquillas Cap. **3.300** Kgs	Buenas condiciones
37	NDT Resultados	Buenas condiciones
38	Cadena	Buenas condiciones
39	Pasadores de Cadena	Ensamblados
40	Soportes de Cadena	Buenas condiciones
41	Respaldo de Carga	Buenas condiciones
42	Base del Soporte	Buenas condiciones
43	Cilindro Pistón de Elevación	Buenas condiciones
44	Cilindro Pistón de Abertura de las Horquillas	No aplica
45	Émbolos / Sellos	Buenas condiciones
46	Rodillos	Buenas condiciones
47	Bomba Hidráulica / Mangueras / Conexiones	Buenas condiciones
48	Sistema de Frenos	Buenas condiciones
49	Palancas Subir / Bajar la Torre	Buenas condiciones
50	Palanca Inclinación / Movimiento	Buenas condiciones
51	Contrapeso	Buenas condiciones
52	Válvula de Alivio / Retención	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- Se realizó ensayo con partículas magnéticas en la curva de las horquillas, con buenos resultados.
- Las horquillas tienen visible y en la parte lateral, la identificación original del fabricante.
- Los pasadores de la cadena y de los cilindros estaban ensamblados para el momento de la inspección. Se inspeccionaron visualmente, presentando buenas condiciones.
- Descripción de las horquillas: Serial: **902207** Marca: **CLARK** Capacidad: **1.650** Kg C/U
  Longitud: **120** cm. Espesor: **4,5** cm. Modelo: **2850 x 500** Alto: **62** cm. Cod.: **No Rep.**
  Ancho: **15** cm. Ojal: **N/A** cm. Eje Ø : **N/A** cm. Long. Eje: **N/A** cm.
- Respaldo de carga: Alto : **120** cm. Ancho: **158** cm. Modelo: **1335432**
- Descripción de la torre: Serial: **6714KF** Marca: **CLARK** Modelo: **3300 S3512**
  Altura de la torre (Base + 1 Secc.): **2,28** mt
- Descripción de la cadena: Serial: **BL-800** Marca: **HC** Modelo: **Doble Rodillo**
  Eslabones: 10 Esl.: **25** cm. Largo: **2,5** cm. Ancho: **2,5** cm.

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

CÁLCULOS DEL LÍMITE DE TRABAJO SEGURO SEGÚN CAPACIDAD DE LAS HORQUILLAS					
N° Renglón	Descripción				
53	Aplicación	Capacidad de carga		Capacidad de carga (S.I.)	
53.1	Horquillas	3.300	Kgs	3.300	KGS
54	Límite de trabajo seguro del equipo Sist. Principal			Límite de trabajo seguro del equipo Sist. Principal (S.I.)	
54.1	4.200		Kgs	4.200	KGS

RECOMENDACIONES

1.- Realizar inspecciones periódicas a las horquillas y proceder a su reemplazo al momento de presentar deformación y desgaste, según ANSI B56.1A.

2.- Realizar el mantenimiento preventivo del equipo según especificaciones del fabricante.

3.- Mantener en buenas condiciones y operativos los dispositivos de seguridad del equipo.

4.- Mantener en buenas condiciones sistema hidráulico, corregir cualquier fuga al momento de presentarse y evaluar si se amerita reinspección o es una reparación menor.

5.- Mantener actualizado el libro de vida donde se muestre las reparaciones y reemplazos realizados.

6.- Revisar diariamente el equipo por parte del operador y cualquier anormalidad pasarla por escrito al custodio, el cual deberá tomar las acciones correctivas.

7.- Utilizar operadores certificados y con experiencia comprobada en estos equipos.

8.- Programar para la próxima inspección desmontar los pasadores para su verificación.

9.- Lubricar la cadena de carga, según las especificaciones del fabricante; no se debe utilizar grasa la cual no es la mas adecuada porque se acumula tierra y esta a su vez produce desgaste.

10.- Pintar en sitio visible la capacidad de carga del equipo.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST
RIF J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SONOTEST

REVISIÓN TECNICA	REVISIÓN ADMINISTRATIVA
Firma	Firma
Conforme: SI ☑ NO ☐	Conforme: SI ☑ NO ☐
Fecha 15 / 06 / 2026	Fecha 15 / 06 / 2026

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

PRUEBA DE CARGA (Procedimiento IEI-PI-17)			
PROPIETARIO:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)		
LUGAR:	PATIO SAMFOR, TERMOELECTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO. ZULIA.	**FECHA DE PRUEBA:**	12/6/2026
MARCA:	CLARK	**CAPACIDAD:**	9.325 LBS = KGS 4.231
MODELO:	CGP50	**TIPO:**	MONTACARGAS
FABRICANTE:	CLARK	**SUB-TIPO:**	DE CADENA
SERIAL:	CGP460G-0887-9450FB	**AÑO DE FABRICACIÓN:**	S/I

PLUMA PROBADA	ALTURA DE LA TORRE	ALTURA DE LA CARGA	ÁNGULO DE PRUEBA	CARGA TABULADA	CARGA DE PRUEBA	TIEMPO DE PRUEBA	RESULTADOS
PRINCIPAL P1	2,28 Mts	0,50 Mts	90°	4.231 Kgs	2.550 Kgs	5 Min.	Satisfactorio
PRINCIPAL P2	2,28 Mts	0,50 Mts	85°	4.231 Kgs	2.550 Kgs	5 Min.	Satisfactorio

MASA DE PRUEBA			
TIPO DE MASA:	TANQUE CON AGUA	**PESO:**	2.550 Kgs


OBSERVACIONES


- SE REALIZÓ PRUEBA DE CARGA AL SISTEMA PRINCIPAL, OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.
- NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO 4.200 KGS / TON: 4,2
- SE UTILIZÓ PARA LA PRUEBA DE CARGA UN TANQUE CARGADO CON AGUA CON UN PESO DE 2.550 KG.
- REALIZAR LOS IZAMIENTOS DE CARGA SEGÚN PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL GRÁFICO DE CARGA.
- REALIZAR LOS IZAMIENTOS EN TERRENOS FIRMES Y NIVELADOS.
- LA PRUEBA DE CARGA SE REALIZÓ EN DOS CONFIGURACIONES DE LA TORRE, LA PRIMERA A 90° PARA VERIFICAR LOS CILINDROS DE ELEVACIÓN Y LA SEGUNDA SE REALIZÓ AL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE LA TORRE PARA VERIFICAR LOS CILINDROS DE INCLINACIÓN.
- UTILIZAR EL EQUIPO ÚNICAMENTE PARA LOS TRABAJOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

ESQUEMA Y GRÁFICO DE LA PRUEBA DE CARGA

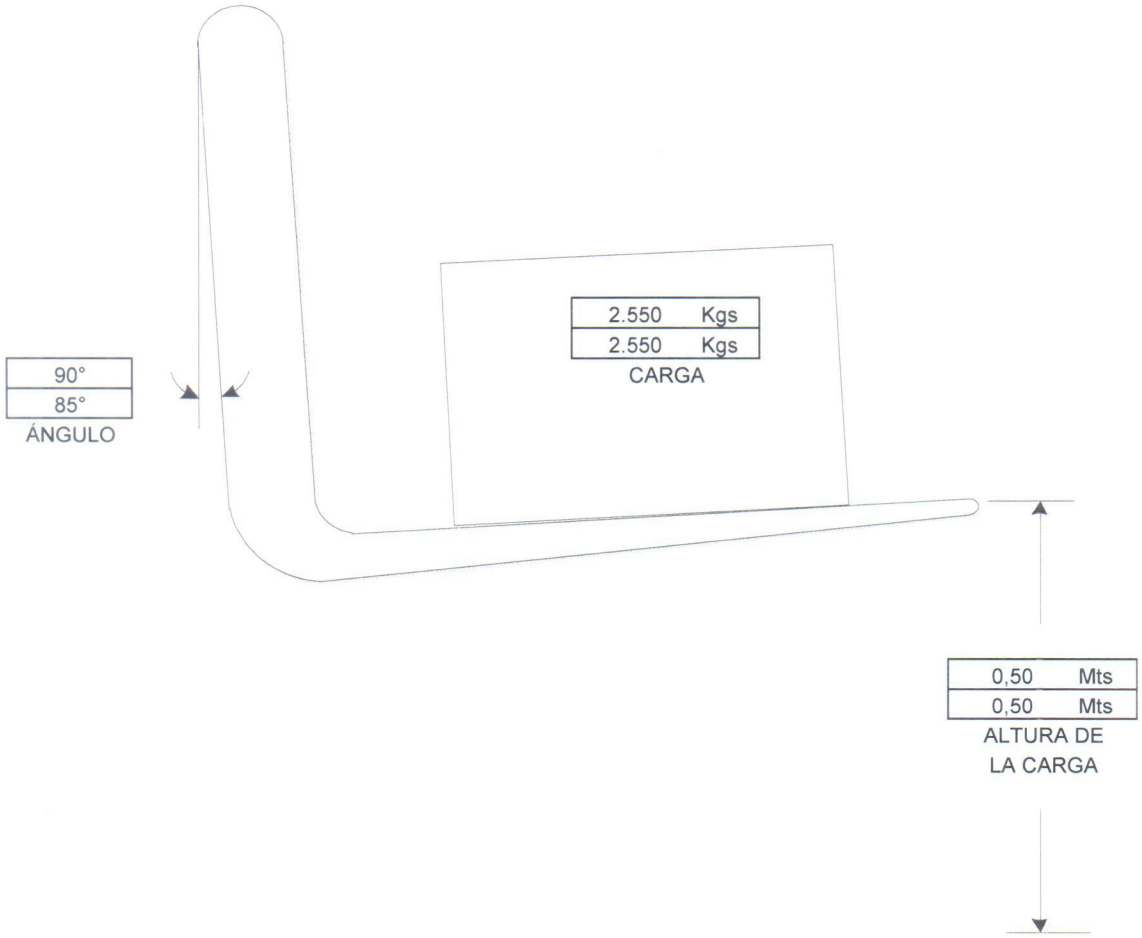

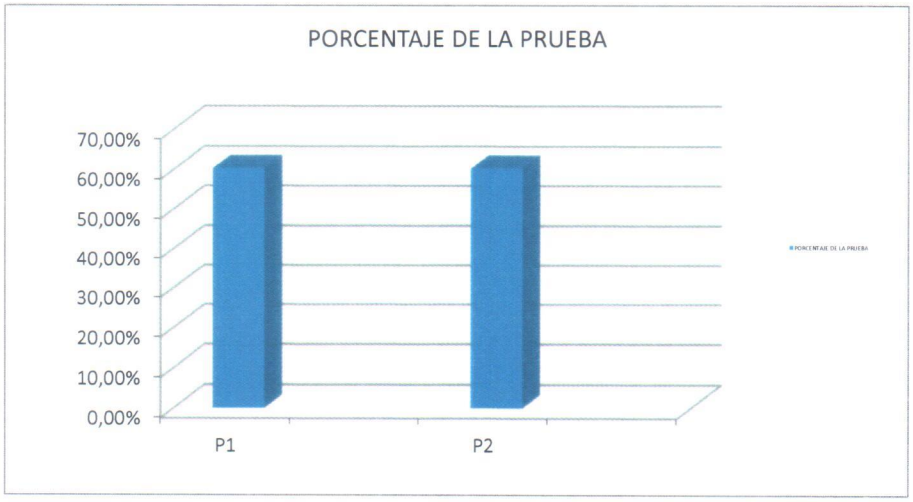

PRUEBA N°	P1	P2
PORCENTAJE	**60%**	**60%**

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.


VISTA DE LA INSPECCIÓN A LAS HORQUILLAS



VISTA GENERAL DEL EQUIPO



VISTA DEL GRÁFICO DE CARGA DEL EQUIPO

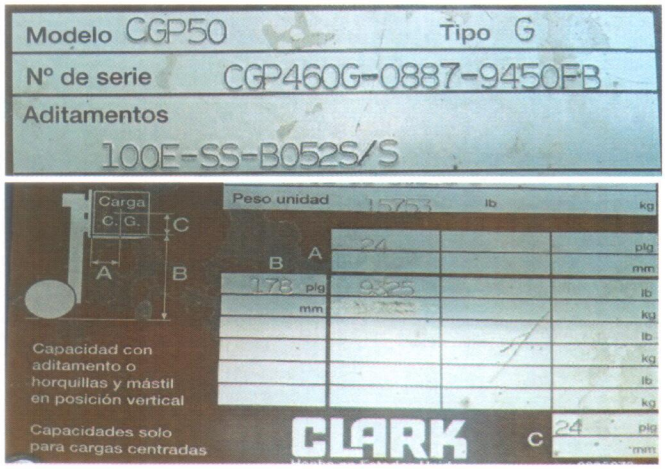

VISTA DE LA INFORMACIÓN DE LA HORQUILLA Y TORRE



VISTA DE LAS PRUEBAS DE CARGA REALIZADAS AL EQUIPO

Vista de la prueba de los cilindros de elevación



Vista de la prueba de los cilindros de inclinación



SONOTEST
RIF J-07049150-7

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO
HORQUILLAS

FECHA DEL INFORME:	15/6/2026
FECHA DE INSPECCIÓN	12/6/2026

INFORME Nº	067-120626-02

CLIENTE	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**INFORMACIÓN DE LAS HORQUILLAS**	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO		**MARCA**	CLARK
MARCA	CLARK	**MODELO**	2850 x 500
MODELO	CGP50	**SERIAL**	902207
SERIAL	CGP460G-0887-9450FB	**CAPACIDAD**	3.300

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO: **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO	MT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	LIMPIA Y PULIDA

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				**MATERIALES**	
TIPO	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	23/7/2025	**COLOR**	NEGRAS /CONT. BLANCO
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I017-58	**LIMPIADOR**	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I010-84	**PENETRANTE**	N/A
TIPO	N/A	**CÓDIGO/SERIAL**	N/A	**REVELADOR**	N/A
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME V, ART. VI. / ANSI B56.1A / PDVSA CAP. 14 / COVENIN 3332-1997				

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS A LA CURVA DE LAS HORQUILLAS No.: **902207** DE CAPACIDAD **3.300** KG. OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.

OBSERVACIONES

- LAS HORQUILLAS **ESTÁN APTAS** PARA SER UTILIZADAS.
- NO SE DETECTARON DISCONTINUIDADES EN EL ÁREA DONDE SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN.

RECOMENDACIONES

1.- UTILIZAR ADECUADAMENTE PARA EVITAR DAÑOS MECÁNICOS.
2.- REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS, CON EL FIN DE DETECTAR GRIETAS, DEFORMACIÓN Y DESGASTE, SEGÚN NORMA APLICABLE.
3.- MANTENER LUBRICADO EL PUNTO DE DESPLAZAMIENTO.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	ASISTENTE
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE:
NIVEL: II	NIVEL: II	NIVEL:
FECHA: **15/6/2026**	FECHA: **15/6/2026**	FECHA:
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia.Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.
