INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN POLIPASTO MANUAL DE CADENA
No: I-EI-PM-23-005

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ***ACEPTABLES****, POR LO TANTO EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN* ***APTO*** *PARA REALIZAR OPERACIONES A LA CUAL FUE FABRICADO DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO EL EQUIPO PRESENTE DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SISTEMAS MECÁNICOS,,, DAÑOS POR SOBRECARGAS O SE INVOLUCRE EN ACCIDENTES OPERACIONALES.*

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: ASME/ANSI B30.21 "Manually Lever Operated Hoist" (Polipasto de Operación Manual).COVENIN, 3174, 3177, 3329 CÓDIGO ASME B30-7, ASME Secc V PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INVERMULCA, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO:

TIPO DE EQUIPO: **POLIPASTO MANUAL DE CADENA DE 10 TONELADA** FABRICANTE YALE

CAPACIDAD: **10 T** *SERIAL:* V00001 *CAPACIDAD NOMINAL DE CARGA* **10** *TON*

EQUIPO N: NO SE OBSERVO Ubicación: **Patio de la empresa**

NORMAS Y CÓDIGOS APLICADOS: ASME/ANSI B30.21 , COVENIN *3174, 3177, 3329* NORMA INTERNACIONAL ,ASME B30-7

PERTENECIENTE A:

RIF: J-070043482

SAMPIERI & FORTUNATO,SA

FECHA DE INSPECCIÓN: 28/10/2023

VIGENCIA: UN(1) AÑO *FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN:* 28/10/2024

INSPECTOR ; Javier Rodriguez
NIVEL II NDT

I-IE-PM-23.007
I-LP-PPM-23-011
I-PC-PPM-23-006

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

COORDINADOR; Dalmilo Rosales
NIVEL II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA

Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS, 04246692017

Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com

RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

INSPECCIÓN DE POLIPASTO MANUAL

REPORTE DE INSPECCIÓN POLIPASTO MANUAL				
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	Rif Nro.; J-070043482	Nº REPORTE	I-IE-PM-23.007
PROYECTO:	CERTIFICACIÓN POLIPASTO MANUAL DE CADENA DE 10 TONELADA		FECHA:	28/10/2023
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA EMPRESA		F. PROX. CALIBRAC :28/10/2024	
OBJETIVO: Inspeccionar el estado físico y funcional del polipasto manual de cadena tipo rache				
ALCANCE: Inspección de los componentes mecánicos; así como, para la evaluación de la eficiencia funcional de polipastos de cadena manual operados mediante cadenas de mando o palanca				

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO			
No INTERNO: No se observo	FABRICANTE: YALE		MODELO: De CADENA
TIPO: De cadena	MANUAL: X	ELECTRICO:	CAP. NOMINAL (TON): 1 0Ton
SERIAL:VOOOO1			

DATOS TÉCNICOS			
CADENA			
DIAMETRO	TIPO	GANCHO SUPERIOR	GANCHO INFERIOR
Ø NOM. ESLABÓN CARGA: 6MM	MANUAL DE CADENA: (x)	LONGITUD NOM. APERTURA: 10 CM	LONGITUD NOM. APERTURA: 10 CM
Ø NOM. ESLABÓN MANDO: 4CM	RACHET: ( )	LONG. MEDIDA APERTURA: 10 CM	LONG. MEDIDA APERTURA: 10 CM
GRADO:		% DESVIACIÓN: 0	% DESVIACIÓN: 0
CABLE			
DIAMETRO NOMINAL: N/A		TIPO:N/A	DISEÑO:N/A
DIAMETRO MEDIDO: N/A		% REDUCCIÓN:N/A	TIPO DE ALMA:N/A

CONDICIONES CUALITATIVAS			
ELEMENTO	B/C	M/C	CONDICIONES OBSERVADAS
1.- BLOQUE DE CARGA			
1.1.- Polea (s)		N/T	Fijo con pasador
1.2.- Gancho Inferior	X		Se observa operativo
1.3.- Uña de Seguridad	X		No se observa
1.4.- Pasador	X		Se observa operativo
2.- GANCHO SUPERIOR	X		Se observa operativo
2.1.- Uña de seguridad	X		Se observa operativo
3.- CADENA DE CARGA	X		Se observa operativo
4.- CABLE DE IZAMIENTO		N/T	Cadena
5.- POLIPASTO			
5.1.- Estructura	X		
5.2.- Tambor	X		
5.3.- Engranajes	X		Se observa operativo
5.4.- Freno	X		Se mantiene con la carga
5.5.- Cadena de Mando	X		
5.6.- Palanca (Rachet)			Rachet
5.7.- Lubricación general	X		
6.-TROLE		N/A	
6.1.- Estructura		N/A	
6.2.- Tambor		N/A	
6.3.- Engranaje		N/A	
6.4.- Ruedas del Trole		N/A	
6.5.- Freno del Trole		N/A	
6.6..- Rieles		N/A	

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

LEYENDA:
B/C: Buenas Condiciones **M/C:** Malas Condiciones **S/I:** Sin Inspección **S/A:** Sin Acceso **N/T:** No tiene **N/A:** No aplica

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF. J-31133308-8 NIT. 0327299590

TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA

Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS, 04246692017

Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com **dalmillor@gmail.com**

RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

INSPECCIÓN DE POLIPASTO MANUAL

REFERENCIA FOTOGRÁFICA DE LA INSPECCIÓN









PRUEBA DE CARGA

SE REALIZO LA PRUEBA; SI ■ NO ☐ INFORME ANEXO

CONCLUSIONES

- Se realizó prueba de funcionamiento ,inspeccionándose toda su estructura tale como cadena ,gancho, rache ,con resultado satisfactorio
- ASME/ANSI B30.21 "Manually Lever Operated Hoist" (Polipasto de Operación Manual).
- COVENIN 3329 "Certificación de Equipos de Izamiento de Carga"
- Reporte de Liquido Penetrante N° **I-LP-PPM-23-011**
- Reporte de Prueba de Carga Nº I-PC-PPM-23-006
- Certificado de acepto Nª I-EI-WUF-23-005

CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTA: ■	NO APTA: ☐

RECOMENDACIONES

ELEMENTOS	ACCIONES
Cadena	**Realizar inspección esporádicamente**
Gancho	**Verificar su condición e instalar uña de seguridad**

OBSERVACIONES:

- LOS RESULTADOS INDICADOS EN ESTE REPORTE SE ENCUENTRAN ASOCIADOS A LAS CONDICIONES OPERACIONALES DEL EQUIPO EN LA FECHA DE INSPECCIÓN EN REFERENCIA.
- ESTOS RESULTADOS TIENEN UNA VIGENCIA DE MÁXIMO **DOCE (12) MESES.** CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO **ASME/ANSI B30.16** "OVERHEAD HOIST (UNDERHUNG)" Y **ASME/ANSI B30.21** "MANUALLY LEVER OPERATED HOIST"
- ESTA CONFORMIDAD PERDERÁ VIGENCIA UNA VEZ CUMPLIDA SU FECHA DE PRÓXIMA VERIFICACIÓN, Y/O CUANDO EN EL EQUIPO OCURRAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

  1.- CUANDO EL EQUIPO EVIDENCIE DAÑOS VISIBLES RELEVANTES, QUE PUEDAN AFECTAR LAS FUNCIONES Y CONDICIONES DE UNO O MAS DE SUS SISTEMAS MECÁNICOS Y ESTRUCTURALES.

  2.- CUANDO EL EQUIPO HAYA SIDO SOMETIDO A ESTRÉS SEVERO, SOBRECARGAS O HAYA ESTADO INVOLUCRADO EN ACCIDENTES OPERACIONALES.

  3.- CUANDO EL EQUIPO SEA MODIFICADO, ALTERADO Y/O SEA SOMETIDO A UNA REPARACIÓN.

INSPECTOR :	Ing. Javier Rodríguez Nivel II IV N° 037-2026	FECHA: 28/10/2023	FIRMA:
COORDINADOR;	Ing. Dalmilo Rosales Nivel II IV N° 037-2026	FECHA: 28/10/2023	FIRMA:

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308 8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

SENCAMER

CAL-031

REPORTE PARA INSPECCIÓN CON LÍQUIDOS PENETRANTES

CLIENTE:	FECHA		RPORTE N°:
SAMPIERI & FORTUNATO,SA	28/10/2023	**Rif Nro.**; J-070043482	**I-LP-PPM-23-011**

EQUIPO / PIEZA A ENSAYAR:	TÉCNICA (S) APLICADA (S)	NORMA CÓDIGO:
Polipasto -Señorita de cadena de 10 tonelada / Gancho Superior e Inferior SERIAL:VOOOO1	CONTRASTE CON COLORES ASTM-E-165	ANSI / ASME B31.3 ASME V-SECC.6

CONDICIONES DEL ENSAYO

ESTAMPA DEL SOLDADOR:	JUNTAS:	ESTADO DE LA SUPERFICIE:
Ganchos	UNI	LISA
----------	----------	----------
----------	----------	----------
----------	----------	----------

LIMPIEZA PREVIA:
TRAPO Y CEPILLO

TIPO DE PRODUCTO

PENETRANTE	REVELADOR	LIMPIADOR
ASTM - 165	ASTM - 165	ASTM – 165

APLICACIÓN DEL PENETRANTE	SPRAY ■	IMMERSION ☐	BROCHA ☐	TIEMPO DE PENETRACIÓN: 10 MIN.

MÉTODO DE REMOCIÓN DE EXCESO DE PENETRANTE	CON AGUA ☐	POST EMULSIFICANTE ☐	CON SOLVENTE ■

APLICACIÓN DEL REVELADOR:	SECO ☐	HÚMEDO NO ACUOSO ■	ACUOSO ☐

EVALUACIÓN DEL ENSAYO:
Se realizó el ensayo de líquido penetrante a los ganchos por donde se iza el polipasto manual de rache (señorita) con una duración de penetración de 10 minuto sin observarse discontinuidades que pudieran afectar el elemento





COMENTARIOS:

LOS RESULTADO FUERON SATISFACTORIO

REALIZADO POR:
NOMBRE: Javier Rodríguez
FIRMA:
FECHA: 28/10/2023

Nivel II LP N°038-2026
Nivel II IV N° 037-2026

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA

Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017

Email: lnvermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com **dalmilor@gmail.com**

RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006 SENCAMER

PRUEBA DE CARGA A EQUIPO DE IZAMIENTO

REPORTE DE PRUEBA DE CARGA EQUIPO DE IZAMIENTO					
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**Rif Nro.:** J-070043482		Nº REPORTE	**I-PC-PPM-23-006**
PROYECTO:	**POLIPASTO MANUAL DE CADENA (SEÑORITA)**			FECHA:	11/02/2023
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA EMPRESA				
OBJETIVO: VERIFICAR LAS CONDICIONES MECÁNICAS, HIDRÁULICAS Y ESTRUCTURALES DEL EQUIPO.					

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO			
No INTERNO: No se Observo	MARCA: YALE		MODELO: De CADENA
SERIAL: VOOOO1	TIPO: MANUAL DE CADENA		PROPULSIÓN: MANUAL
CAP. NOMINAL (TON): 10 Ton	MOTOR: No Aplica		**SAP: No Aplica**
MECANISMO DE ELEVACIÓN: Rache	TIPO DE TRACCIÓN: N/A	TIPO DE CAUCHO: N/A	

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE CARGA		
INSTRUMENTO UTILIZADO: DINAMOMETRO	MARCA:DILLON	MODELO: 14620
Nº DE CERTIFICADO: LP-2020-3576	FECHA DE CALIBRACIÓN / VIGENCIA: 10/08/2023	SERIAL: 26145

CONDICIONES OPERATIVAS DURANTE PRUEBA DE CARGA	
CARGA DE PRUEBA: Tención con un punto Fijo	TIPO DE CARGA :Punto Fijo tensionado,
ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE PLUMA: N/A	LONGITUD DE PLUMA: N/A
TIEMPO DE PRUEBA CILINDROS ELEVACIÓN: manual	CAPACIDAD DE CARGA TABULADA: 1500 Kilo
RADIO DE CARGA: Tención con el equipo	% RELACIÓN CON CARGA TABULADA: Regulado

DESLIZAMIENTO CILINDROS DE ELEVACIÓN:

DESCENSO DE LA CARGA DURANTE LA PRUEBA: Manual

DESLIZAMIENTO CILINDROS DE INCLINACIÓN:

INCLINACIÓN DE LA CARGA DURANTE LA PRUEBA: Apro ; 90°

RESULTADOS:

Se sometió a prueba de carga el polipasto manual (Señorita) de capacidad 4 tonelada a una tención con un punto fijo hasta alcanzar el punto de carga indicado con un sostenimiento de 1 hora sin marcar ninguna desviación. Con resultado Satisfactorios

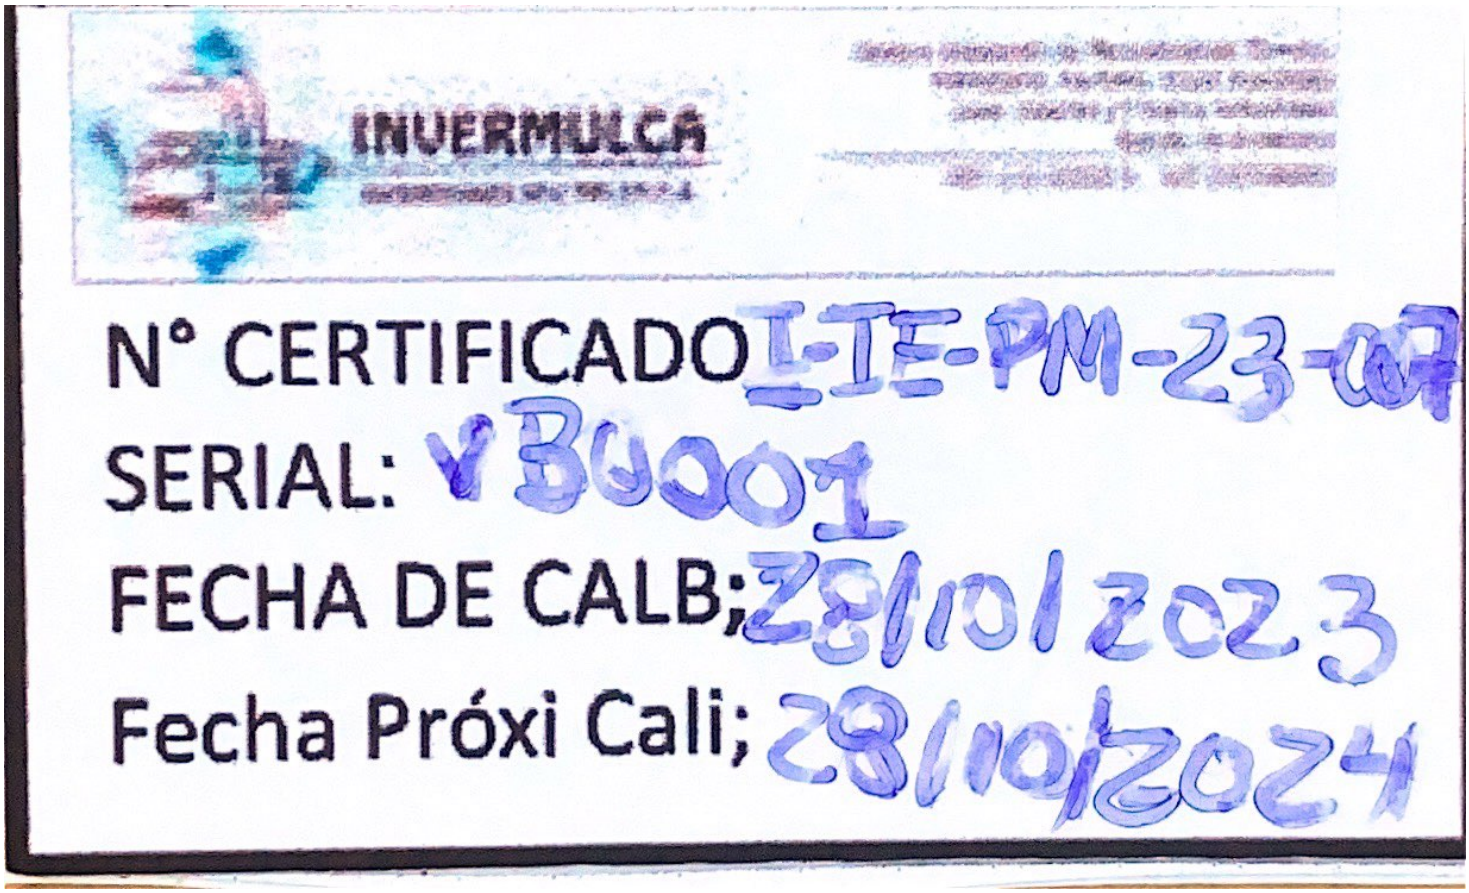




CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTO:	X	NO APTO:	

INSPECTOR :	Ing. Javier Rodríguez Nivel II IV N° 037-2026	FECHA: 28/10/2023	FIRMA:

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A


INVERMULCA
N° CERTIFICADO I-IE-PM-23-0
SERIAL: VB0001
FECHA DE CALB; 28/10/2023
Fecha Próxi Cali; 28/10/2024
