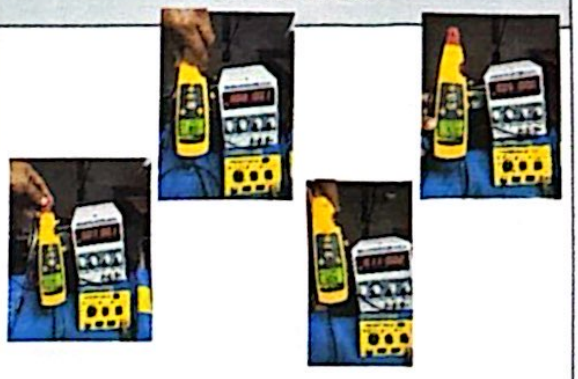
INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299540

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-80 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6154440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com daimilar@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER N°COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-MMA-25-007

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 12/04/2025
Equipo: MILLIAMP PROCESS CLAMP METER 12mA (Pinza amperimétrica mA para procesos Fluke 771)	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** FLUKE
Descripción del Equipo: El medidor permite la calibración en caso cerrado utilizando fuentes de referencia. Mide las señales de referencia,	**Modelo:** FLUKER 771	**Código Interno;** No Se Observo
Serial; 14960110	**Fecha de calibración:** 12/04/2025	**Patrón de Referencia:** pinza voltiamperimetra (FLUKE) Fuente de poder BAKU
Tolerancia; +/- 2	**Fecha Próxima Calibración**: 12/04/2026	**Rango;** ±20.99 mA ±21.0 mA to ±99.9 mA
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Baquelita	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** En la escala seleccionada
Pantalla; Trasparente de baquelita Visible Normal, Digital	**Estuche:** se observo	**Tamaño ;** Portátil
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

PATRÓN	LECTURA PATRÓN mA	LECTURA DEL EQUIPO mA	FOTO DEL EQUIPO
Fuente de poder potenciómetro BAKU BK.1502D	70	70,1	
	110	109,1	
	40	40,6	
	70	70,5	

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Scanned with CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 900729556

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmillor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección Invermulca: COVENIN 3508 COVENIN 2141-95 COVENIN 1900-95, ISO 8502-4 ,BS7079-B ,6920 , ISO IV , especificaciones IEC-61935-1

OBSERVACIONES:	Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido. Estas instrucciones no sólo le indican el problema, sino que también identifican las acciones correctivas que sus técnicos de pruebas pueden tomar para resolver el problema rápidamente, Todos los valores tomados están dentro de la tolerancia permitida.
CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Inspector
Ing. Dalmiro Rosales
Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Supervisor
Ing. Javier Rodríguez
Nivel II NDT

Scanned with CamScanner
