SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fiscal: Av. Casco Central, C.C. Amal, Nivel 2, Local Nº 22 y 23, Cabimas Estado Zulia.
Telefax: (0264) 6585846, Celular: (0424) 6181674-6505919, (0416) 0150859-7623273
Site Web: www.iwecotech.com.ve, Email: iwecotech@gmail.com, Sencamer N°: COJ-20410
Rif: J-31762771-7 NIL:397137-1

CERTIFICADO Nº: IWT-CI-0004-23 **ORDEN DE TRABAJO:** 0026-23 **N° DE CONTROL:** 0036-23

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

El equipo abajo identificado ha sido inspeccionado de acuerdo a procedimientos de inspección de **IWECO-TECH, C.A,** (Insulation, Workover, Engineering , Consulting & High Technology),) Volume 14 de PDVSA, Manual del fabricante Volumen 14 de normas **PDVSA PI-15-03-07,** normas **COVENIN 3332** y **ASME B56.1**

Data del cliente:

Propiedad de: SERVICIOS DE MONTACARGAS, C.A.

Ubicación: Av 60, 1ra Etapa, Zona Industrial, Casa 59 - 95, Sector los Robles, Mbo Zulia

Fecha inicio de insp.: 02/06/2023 Fecha culminación de insp.: 02/06/2023

Descripcion del trabajo de inspección solicitado: INSPECCION DE MONTACARGA.

Data del equipo certificado:

Fabricante: HYSTER Modelo: H360XL

Serial: C19D01549L Año de Fabricación: N/E

Capacidad nominal: 18 Ton Capacidad max .certificada: 18 Ton

Camion: NA Modelo: N/A Placa : N/A

Métodos de inspección utilizados: Según normas arriba descritas.

Caracteristicas del Cable de Acero:

Factor de Seguridad: N/A Diámetro: N/A Grado: N/A Clase: N/A

Resistencia a la Ruptura: N/A Fecha de instalación: NE

Capacidad de carga segura del sistema: N/A Numero de Líneas: N/A

Características del Malacate:

Fabricante: N/A Modelo: N/A Serial: N/A

Año de fabricación: N/A Potencia: N/A

Características de la pluma o estructura:

Altura o longitud de la estructura o pluma: N/A

Fabricante: N/A Modelo: N/A Año de fabricación: N/A

Serial: N/A Capacidad nominal: N/A

Certificado válido hasta: 02/06/2024

EQUIPO CONFORME PARA OPERAR

IWECO TECH J-31762

Ubaldo Nava
CI: 10.600.060
Sencamer N°:33312
Inspector de Equipo:

Tito Vargas
CI: 7.841.987
Sencamer N°:3931
Certificador por:



Este certificado pierde vigencia al cumplirse la fecha de vencimiento o cuando el equipo se involucre en accidentes de cualquiera naturaleza. En los equipos móviles debe considerarse su re-inspección, para asegurar su operabilidad, Cuando: 1) Se efectúen modificaciones al diseño, 2) Exista duda sobre su condición, 3) Se haya hecho un traslado. Este certificado no tiene validez sino lleva SELLO SECO.

ORIGINAL / CLIENTE

Este documento no debe ser reproducido total o parcialmente sin la aprobacion de IWECO-TECH,C.A y el propietario del equipo.

Scanned with CamScanner

IWECOTECH

REPORTE FINAL DE INSPECCION

Nº Reporte: 1
Fecha: 02/06/2023
Página: 1 de 1

No. O.T.I: 0026-23

No. Control: 0036-23

DATOS DEL EQUIPO:

TIPO:	Todo Terreno	**MARCA:**	HYSTER
MODELO:	H360XL	**SERIAL:**	C19D01549L
CAPACIDAD REAL:	18 Ton	**CAPACIDAD CERTIFICADA:**	18 Ton

DATOS DEL CERTIFICADO:

NUMERO DEL CERTIFICADO:	IWT-CI-10004-23
FECHA DE CERTIFICACION:	2/6/2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	2/6/2024

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE:	SERVICIOS DE MONTACARGAS C.A.
DIRECCION:	Av. 60. Casa 56 95 Sector Los Robles, ZI de Maracaibo, Zulia
TELEFONOS:	0424-6593588

IMAGEN DEL EQUIPO CERTIFICADO



OBSERVACIONES FINALES

EVALUACION DEL EQUIPO	CONDICION
Mecanismo en marcha	OK
Mecanismo de control	OK
Dispositivo de seguridad	OK
Sistema de izamiento de capacidad de carga	OK
Cabina de control	OK
Estructura principal	OK
Prueba operacional	OK
Prueba de carga	OK
Horquillas	OK
Respaldo de carga	OK
Torre de elevación	OK

TESTIFICACION DE LA INSPECCION

NOMBRE: Ubaldo Nava	**CEDULA:**	10,600,060
EVALUACION DEL SERVICIO POR EL CLIENTE:		

LEYENDA: **E**:EXCELENTE, **B**:BUENA, **R**:REGULAR **M**:MALA **MM**:MUY MALA, **NA**:NO APLICA

Ubaldo Nava
Inspector de Equipo:
C.I.: 10.600.060
Sencamer N°:33312

Tito Varga
Certificado por:
C.I:7.841.987
Sencamer N° 3931

Cliente

Scanned with CamScanner

IWECO TECH inspection

INSPECCION DE MONTACARGAS

No. Reporte: 1
Fecha: 02/06/2023

No. Control: 0036-23

Norma / Código Aplicable: ASME B56.1

TIPOS
- ○ TODO TERRENO
- ◉ INDUSTRIAL

FUERZA MOTRIZ
- ◉ A COMBUSTION
- ○ ELECTRICO

1. Datos Generales

Cliente	SERVICIOS DE MONTACARGAS C.A.	O.D.S.	-	OT.I	0026-23
Lugar de Inspección	Instalaciones SERVIMONCA				
Dpto. y/o Contacto	Andreina Toro	Nombre del Operador	David Chirino		
Cédula de Identidad	21,077,998	Certificado	☑ SI ☐ NO	Nro. de Certificado del Operador	-


2. Datos del Equipo


Fabricante	HYSTER	Modelo	H360XL	Serial	C19D01549L
No. Activo	-			Cap. Máxima	18 Ton

Libro de Vida: ☐ SI ☐ NO

Reparación y/o Modificación: ☐ SI ☐ NO

Documentación Avalada de Reparación y/o Modificaciones: ☐ SI ☐ NO

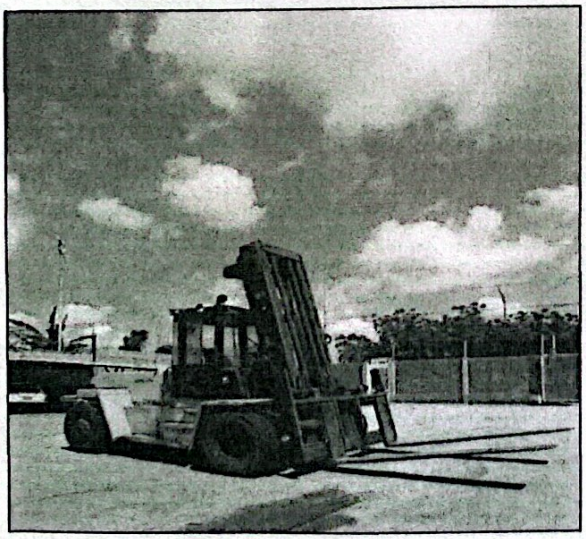

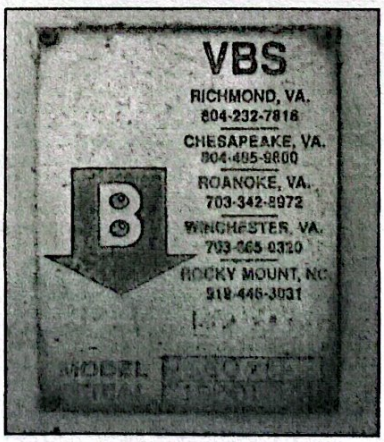

Scanned with CamScanner

IWECO TECH inspection

INSPECCION DE MONTACARGA

No. Reporte 1
Fecha: 02/06/2023

4. Datos de la Inspección	Daño Mecánico							Condición de Operación														Condición P/ Corrosion			Condición P/Dimensión			Elemento		
	DO	GR	FI	DE	DEF	CE	PE	FL	FF	PC	DP	DEL	RD	MD	SD	D	FA	NP	NF	NAD	DES	FLI	PI	GE	PU	FT	EX	OV	B	M	NA
4.1 Mecanismo en Marcha																															
4.1.1 Dirección																													X		
4.1.2 Transmisión																													X		
4.1.3 Neumáticos / Macizos																													X		
4.1.4 Sistema de Frenos																													X		
4.1.5 Motor																													X		
4.2 Mecanismo de Control																															
4.2.1 Palancas Manuales																													X		
4.2.2 Pedales																													X		
4.2.3 Sistema de encendido																													X		
4.2.4 Control Remoto																															X
4.2.5 Panel de Instrumentos																													X		
4.3 Dispositivo de Seguridad																															
4.3.1 Alarma Auditiva																													X		
4.3.2 Luz de Valizaje																													X		
4.3.3 Franjas (Delant/Tras.) de Precaución																															X
4.3.4 Limitadores de la Horquillas																													X		
4.3.5 Pare de Emergencia																													X		
4.3.6 Extintor de Incendio																													X		
4.4 Sistema de Izamiento de Capaciad Carga																															
4.4.1 Torre de Elevación																													X		
4.4.2 Cilindro de Inclinación																													X		
4.4.3 Cilindro de Elevación																													X		
4.4.4 Respaldo de Carga																													X		
4.4.5 Brazos de Carga																													X		
4.4.6 Soldaduras																													X		
4.4.7 Mangueras y Conexión																													X		
4.4.8 Ojales y Pasadores																													X		
4.4.9 Retenedores Tipo Cupillas																													X		
4.4.10 Cadenas Tipo Rodillos																													X		
4.4.11 Guías de Correderas																													X		
4.4.12 Orquillas																													X		
4.4.13 Lubricación General																													X		
4.5 Cabina de Control																															
4.5.1 Estructura																													X		
4.5.2 Protectores																													X		
4.5.3 Pisos																													X		
4.5.4 Espejos Retrovisores																													X		
4.6 Estructura Principal																															
4.6.1 Latones Protectores																													X		
4.6.2 Sujetadores																													X		
4.6.3 Contrapeso																													X		
4.6.4 Faros de Iluminación																													X		
4.6.5 Identificación																													X		
4.6.6 Pinturas																													X		
4.6.7 Estructura																													X		

4.7 Prueba Operacional

Resultado

Elevación de la Torre	Satisfactorio	X	DESCRIPCION DE LA CARGA	Container de material 18 ton
Inclinación de la Torre	Satisfactorio	X		
Prueba de Carga	Satisfactorio	X		

Peso Neto: 18,000.00 Kgs Altura de Levantamiento 1 mts Tiempo 10 min

Scanned with CamScanner

IWECO TECH inspection	INSPECCION DE MONTACARGA	No. Reporte: 1 Fecha: 02/06/2023 Página: 3 de 3

6. Condiciones Observada

1	Se realizo prueba de carga levantando un Container de material 18 ton por un tiempo de 10 minuto no se evidencio
2	anomalia en el funcionamiento del equipo quedando operativo. Obteniendo resultados Satisfactorios.
3	Esta PRUEBA cumple con los requerimientos establecidos en la Volume 14 de PDVSA, Manual del fabricante y ASME B56.1
4	y el procedimiento interno, cualquier modificación y/o reparación efectuada a este equipo en componentes criticos, anula la vigencia
5	de esta PRUEBA y debe realizarse nuevamente después que el mismo haya sido reparado.
6	
7	
8	
9	
10	

6. Acciones Correctiva

1	Chequear la funcionabilidad del sistema de levantamiento y descenso de carga.
2	Chequear la operabilidad de los mecanismos de extensión y retracción de los cilindro hidraulico.
3	Chequear la operabilidad de los dispositivos de seguridad.
4	Este reporte tiene pierde vigencia, al realizarse cualquier modificación de su diseño original y/o reparaciones mayores en componentes
5	críticos ó cuando el equipo en cuestión se vea involucrado en accidente operacional de cualquier naturaleza.
6	**La empresa IWECO-TECH. No se hace responsable del mal manejo del EQUIPO.**
7	
8	
9	
10	

7. Firmas

Certificado por:

Nombre: Tito Vargas

Fecha: 2/6/2023

Firma

IWECO TECH J-31782771-2

Equipo Apto para operar: ☑ Si ☐ No

Capacidad Certificada: 18 Ton

Inspector de Equipo:

Nombre: Ubaldo Nava

Fecha: 2/6/2023

Firma:

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN CON PARTICULAS MAGNETICAS

CLIENTE: SERVCIOS DE MONTACARGAS C.A.	Nro. O.D.S: -	Nro. O.T.I: 0026-23	Nro. Reporte: 1
PROY. / OBRA: Inspeccion Categoria III a Montacargas	LUGAR DE INSP.: Av. 60, Los Robles, ZI Maracaibo Zulia		FECHA: 02/06/2023

OBJETIVO:
Detectar Discontinuidades Superficiales Mediante la Aplicación de Particulas Magneticas Coloreadas Secas

ALCANCE:
El ensayo cubre la Inspeccion a las Horquila de Izaje del Montacargas


EQUIPO UTILIZADO:
Yugo Magneticos AC Marca Teide Serial: 9432757
Particulas Ferromagneticas Coloreadas Secas Tipo 8A


DATOS DEL MATERIAL:
Descripción de la Pieza: **HORQUILLA DE IZAJE DEL MONTACARGAS** Tipo de Material: Acero al Carbono
Espesor (es): - CÓDIGO / NORMA APLICABLE: ASME V ART 7 / ASME V ART 9 / ASME B56.1

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL ENSAYO:
1.- TIPO DE MAGNETIZACIÓN:
Circular: [ ] Longitudinal: [X] Multi-direccional: [ ]
2.- TIPO DE CORRIENTE DE MAGNETIZACIÓN:
A.C: [X] D.C: [ ] H.W.D.C: [ ]
3.- MÉTODO DE APLICACIÓN DEL CAMPO MAGNÉTICO:
Continuo: [X] Residual: [ ]

ESPECIFICACIONES DE LAS PARTÍCULAS:
Coloreadas: [X] Fluorescentes: [ ]
1.- COLOR DE LAS PARTÍCULAS:
Gris: [X] Rojo: [ ] Negro: [ ]
2.- VÍA DE APLICACIÓN:
Seca: [X] Húmeda: [ ]

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN:
Inspección visual y aplicación del ensayo de Partículas Magnéticas Coloreadas Secas a áreas criticas de las horquilla del montacargas
No presentaron indicaciones relevantes. **CONDICION: VT MT APTO.**

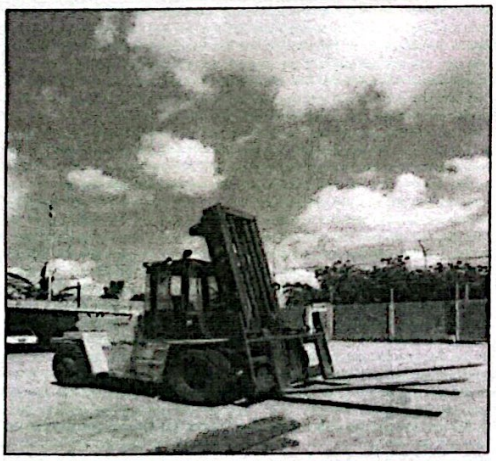

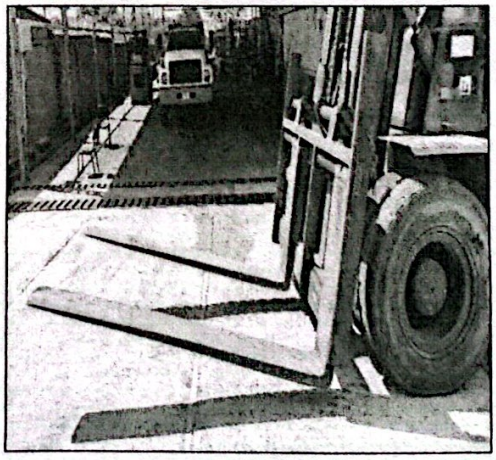

INSPECTOR NIVEL II:		APROBADO POR CONTROL DE CALIDAD:	
NOMBRE:	Ubaldo Nava	NOMBRE:	Tito Vargas
FECHA:	2/6/2023	FECHA:	02-06-2023
FIRMA:		FIRMA:	

Scanned with CamScanner

FODENORCA
Fondo de Desarrollo para la Normalización, Calidad, Certificación y Metrología

Certificado/Certificate N°: PER 16/2020-114

El Fondo de Desarrollo para la Normalización, Calidad, Certificación y Metrología (FODENORCA)

Nombre y Apellido	HERWIN GIORGI FERREBUS ARCAYA
Cédula de identidad	V- 16.918.832
Domiciliado en: *domiciled in*	Bolivariana de Puertos, S.A. Puerto de Maracaibo, Av. 2, El Milagro sector La Ciega, municipio Maracaibo, estado Zulia.
Ha sido evaluado y se encuentra en conformidad con los requisitos de: *It has been audited and complies with the requirements of*	Norma COVENIN 3175:2005 Equipos de Izamiento. Calificación de Personal (2da Revisión). Norma COVENIN 3188:2005 Equipos de Izamiento. Certificación de Personal (2da Revisión).
Alcance de la Certificación: *Scope of Certificate*	MONTACARGAS MODELO: DCE160-12 MARCA: (KALMAR) CAPACIDAD: 16 TN.

La validez de la certificación está sujeta a la continua operación satisfactoria de la certificación de personas y al correspondiente Contrato de Servicio de Certificación N.° CCGCP/001/2020

The validity of the certification is subject to the continuous satisfactory operation of the certification of persons and the corresponding Certification Service Contract No. CCGCP/001/2020

Fecha Otorgamiento de la Certificación: *Date Granting the Extension of the Scope of the Certificate:*	28 de octubre de 2020.
Fecha de Expiración: *Valid until*	28 de octubre de 2022.

ANA MARIA PONCE MUÑOZ
PRESIDENTE (A) FODENORCA
Designada mediante Resolución N° ### de fecha 05 de junio de 2018, Publicada en la Gaceta Oficial N° 41.413 de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 06 de junio de 2018, En Concordancia con el Artículo N° 33 de los Estatutos Sociales

Cualquier aclaratoria con respecto al alcance de este certificado puede ser proporcionada por FODENORCA o por cualquier otro medio que se designe.

La validez de este certificado puede comprobarse a través de la página Web. http://www.fodenorca.gob.ve o por cualquier otro medio que se designe, bajo el Código de Seguridad Informático SENCAMER (CISS) N.° PE20FOC0Fa.
The validity of the certificate can be checked through the website: http://www.fodenorca.gob.ve , Or by any other means designated, under the SENCAMER Computer Security Code (CISS) No. PE20FOC0Fa

Av. Andrés Bello, Torre Cavendes, Piso 6, Urbanización La Florida, Caracas, Venezuela
Teléfono: (0212) 943-25-11

N°-0170

Scanned with CamScanner
