INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO DE CARGA

S-7036-B

SONOTEST
J-07049150-7

EQUIPO APTO

Propietario: **SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.**

Equipo No.: **S/N**

Código Sonotest: **2340061204-HLW24648**

Tipo:	**GRUA PUENTE**	Fecha de Inspección:	**12/09/2023**
Serial:	**HLW24648**	Fecha de Vencimiento:	**11/09/2024**
Marca:	**R & M**	Capacidad Nominal:	**3.200 KGS**
Modelo:	**SX30410032P25FAL0F**	Cap. Trabajo Seguro:	**3.200 KGS**

De acuerdo al informe de inspección No.: 067-120923-02 de Fecha: 12/09/2023 el equipo se encuentra 'APTO' para operar dentro de las condiciones y parámetros establecidos en las tablas de carga, recomendaciones suministradas por el fabricante y especificaciones del equipo inspeccionado.

Certificado en: GALPON DE ELECTRICIDAD , TERMOELECTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO-ZULIA.

INSPECTOR	RESPONSABLE TECNICO	POR SONOTEST
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI No. 067 Miguel Garcia C.I. 7.967.008	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF-J-07049150-7
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SANCHEZ
FIS-0023-003	FIS-0023-002	REPRESENTANTE

IEI-F-27 REV-08

Scanned with CamScanner

SONOTEST

J-07049150-7

CERTIFICADO DE EQUIPO DE IZAMIENTO DE CARGA

INSPECCIÓN DE GRUA PUENTE

El equipo abajo identificado ha sido inspeccionado de acuerdo a las Normas:
ASME B30. 17 PDVSA CAP. 14 COV. 3510-99 y Procedimientos Sonotest, S.A. IEI-MA-01

No. Certificado: **CO-12-09-23-02**

Código Sonotest: **2340061204-HLW24648**
Propietario: **SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.**
Tipo de Equipo: GRUA PUENTE
Subtipo: ELECTRICA
No. del Equipo: S/N
Fabricante: R & M
Capacidad Nominal: 3.200 KGS
Serial: HLW24648
Modelo: SX30410032P25FAL0F
Año de Fabricación:2011

Condiciones del Equipo Certificado:
de Líneas: 4 Cap. del Bloque: 3.200 Cap. Trabajo Seguro: 3.200 KGS

Características del Cable de Acero:
Diámetro (mm): 6,40 Clasificación: 8 X 19 Factor de Seguridad:5,0
Resist. Ruptura: 4.462 Clase/Grado: 2160 Arrollado: ARD

Características del Malacate (Principal):
Marca: N/A Modelo: N/A Año: N/A Serial: N/A Potencia: N/A

Características de la Estructura o Pluma
Marca: N/A Modelo: N/A Año: N/A Capacidad Nominal: N/A
Altura: N/A Longitud: N/A Serial: N/A

De acuerdo al informe de inspección Nº: 067-120923-02 de Fecha: 12/09/2023 el equipo se encuentra 'APTO' para operar dentro de las condiciones y parámetros establecidos en las tablas de carga, recomendaciones suministradas por el fabricante y especificaciones del equipo inspeccionado.

Lugar de Insp.: GALPON DE ELECTRICIDAD , TERMOELECTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO-ZULIA.
Observaciones: NO EXCEDER EL LIMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO 3.200 KGS.
Fecha de Inspección: **Inicio:** 12/09/2023 **Culminación:** 12/09/2023

Fecha de Vencimiento: 11/09/2024

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SANCHEZ
FIS-0023-003	FIS-0023-002	REPRESENTANTE
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI No. 067 Miguel Garcia C.I. V-18867458 Firma	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI Firma	SONOTEST RIF J-07049150-7 Firma

Nota: 1.- Este certificado no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo 2.- Este certificado pierde validez al cumplirse la fecha de vencimiento o cuando el equipo se involucre en un accidente de cualquier naturaleza. En los equipos móviles debe considerarse su reinspección, para asegurar su operabilidad, cuando: 1) Se efectúen modificaciones al diseño, 2) Exista duda sobre su condición, 3) Se haya hecho un traslado

Número del Documento: **S-7036-B**

Calle Campo Elías Nº. 122A, Apartado Nº. 134, Ciudad Ojeda, Estado Zulia, Venezuela. Telef. (0265) 6628329/6315272; Fax (0265) 63112513.
Página Web: www.sonotest.com, e-mail: sonotest@sonotest.com

Scanned with CamScanner


SONOTEST
J-07049150-7

FECHA DEL INFORME:	12 de septiembre de 2023

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO
INSPECCIÓN DE GRÚA TIPO PUENTE

REPORTE N°:	067-120923-02

PROPIETARIO:	SAMPIERI & FORTUNATO, S. A. (SAMFOR)						
LUGAR:	GALPÓN DE ELECTRICIDAD, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO. ZULIA.						
EQUIPO No:	S/N	SERIAL:	HLW24648		CAP. NOMINAL:	3.200	KGS
CAPACIDAD NOMINAL (S.I.):	3.200 KGS	CAPACIDAD DE TRABAJO SEGURO (S.I.):				3.200	KGS
MODELO:	SX30410032P25FAL0F	TIPO:	GRÚA TIPO PUENTE		SUB-TIPO:	ELÉCTRICA	
MARCA:	R&M	AÑO:	2011		FABRICANTE:	R&M	
FECHA DE INICIO DE INSPECCIÓN:	12 de septiembre de 2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE INSPECCIÓN :				12 de septiembre de 2023	
NORMAS APLICABLES:	ASME B30.17 / PDVSA CAP, 14 / COVENIN 3510-1999			PROCEDIMIENTO SONOTEST:		IEI-MA-01	

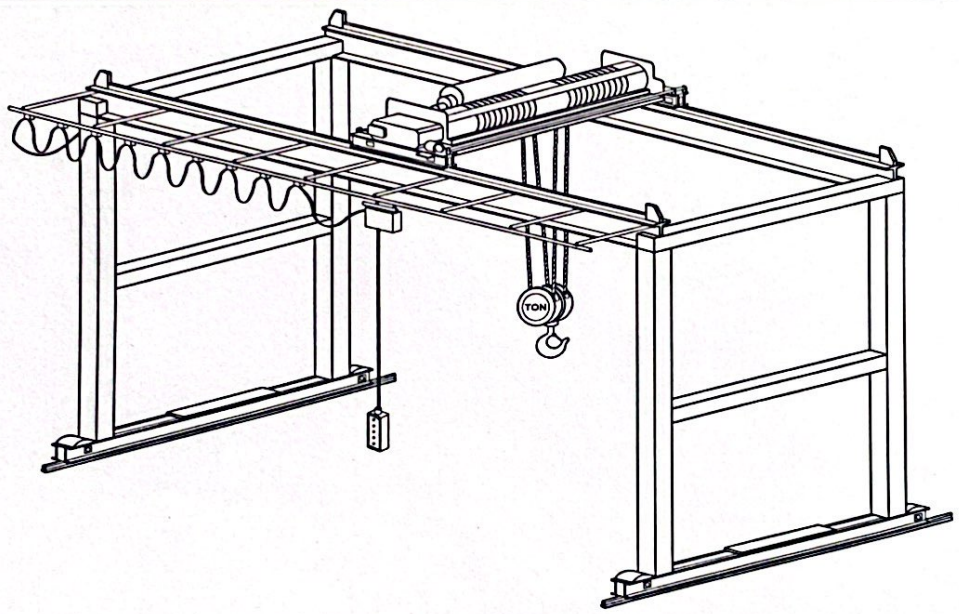

GRÚA TIPO PUENTE

OBSERVACIONES

- EL EQUIPO **ESTÁ APTO** PARA REALIZAR TRABAJOS DE IZAMIENTO.
- NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO **3.200 Kg (3,2 ton).**
- REVISAR DIARIAMENTE EL EQUIPO POR PARTE DEL OPERADOR Y CUALQUIER ANORMALIDAD PASARLO POR ESCRITO AL CUSTODIO EL CUAL DEBERÁ TOMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS.
- UTILIZAR OPERADORES CERTIFICADOS Y CON EXPERIENCIA COMPROBADA.
- REALIZAR EL MANTENIMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

Los resultados de la inspección corresponden exclusivamente al equipo:
MARCA: R&M **SERIAL N°: HLW24648**
El cual ha sido inspeccionado de acuerdo con los procedimientos de inspección de SONOTEST, S. A., las normas PDVSA, COVENIN, ASME / ANSI Serie B30 y API RP aplicables y se encuentra en condición: CONFORME

SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI
Nº 047
Miguel García
INSPECTOR 958

NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST, S.A.

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo

Scanned with CamScanner

DATA HISTÓRICA DEL EQUIPO		
Verificar el historial del equipo relacionado con:		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
1	Record de Inspecciones anteriores	No presenta
2	Record de Inspecciones Periódicas	No presenta
3	Libro de Mantenimiento Preventivo	Presenta y está actualizado
4	Reparaciones / Modificaciones	No presenta
5	Manual de Operaciones	Presenta y está actualizado
OBSERVACIONES		
- El equipo es certificado por primera vez. - La empresa SAMFOR, suministró la documentación requerida.		
GENERALES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (Procedimiento IEI-PI-18)		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
6	Señal de Velocidad de Carga	No presenta
7	Carta de Señales de Mano	Buenas condiciones
8	Topes del Carro	Buenas condiciones
9	Topes del Puente	Buenas condiciones
10	Indicador del Viento	No aplica
11	Dispositivo de Advertencia	Buenas condiciones
12	Pasarela	No presenta
13	Escalera y Peldaños	No presenta
14	Conexiones Eléctricas	Buenas condiciones
15	Dispositivos Anti-Two Block	Buenas condiciones
SOPORTE DE LA ESTRUCTURA (Procedimiento IEI-PI-13)		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
16	Bases	Buenas condiciones
17	Rieles de la Viga	Buenas condiciones
18	Fijación del Riel / Alineación del Riel	Buenas condiciones
19	Empalme del Riel / Pasador del Riel	Buenas condiciones
20	Columnas	Buenas condiciones
OBSERVACIONES		
- El equipo no utiliza medidor de viento, la misma está instalada dentro de un galpón. - Los dispositivos de bloqueo del gancho, están en buenas condiciones, utiliza bloqueo eléctrico y mec. - Las bases, columnas y los rieles se observan en buenas condiciones.		
CABINA O CONTROLES DEL OPERADOR (Procedimiento IEI-PI-12)		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
21	Acceso	No aplica
22	Alumbrado	No aplica
23	Extintor de Incendio	No aplica
24	Controles	Buenas condiciones
25	Ventanas	No aplica
26	Switch Maestro	Buenas condiciones
27	Mando de Control Eléctrico	Buenas condiciones
OBSERVACIONES		
- El equipo no utiliza cabina de control, es controlado desde el piso. - La botonera presenta buenas condiciones.		

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo

Scanned with CamScanner

PUENTE (Procedimiento IEI-PI-13)		
N° Renglón	Descripción	Condición
28	Limitador del Recorrido	Buenas condiciones
29	Engranaje	Buenas condiciones
30	Estructura del Puente	Buenas condiciones
31	Frenos	Buenas condiciones
32	Cubierta	Buenas condiciones
33	Ruedas	Buenas condiciones
34	Motor	Buenas condiciones
35	Parachoques	Buenas condiciones
36	Colectores	Buenas condiciones
37	Topes de las Ruedas	Buenas condiciones
38	Dispositivo de Bloqueo	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El puente presenta buenas condiciones, utiliza dos motores para las ruedas de traslación.
- Descripción de la viga monorriel: Viga tipo: **"I"** Alma: **60** cm Ala: **30,0** cm Altura: **6** mt
  Longitud (luz ó flecha): **9** mt Cap.: **3,2** ton Año: **2011** Marca: **R&M** S/N **S/I**

CARRO O TROLLEY (Procedimiento IEI-PI-10)		
N° Renglón	Descripción	Condición
39	Ruedas	Buenas condiciones
40	Barandas	No aplica
41	Condiciones del Motor	Buenas condiciones
42	Frenos	Buenas condiciones
43	Colectores	Buenas condiciones
44	Estructura	Buenas condiciones
45	Ejes	Buenas condiciones
46	Parachoques	Buenas condiciones
47	Cubierta	Buenas condiciones
48	Engranajes	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El equipo no utiliza carro, es un polipasto.
- Descripción del polipasto: Marca: **R&M** Modelo: **SX30410032** Cap.: **3.200** Kgs
- El equipo utiliza 1 polea ecualizadora de **Ø 6" x Ranura 1/4"**

ELEVADOR PRINCIPAL (Procedimientos IEI-PI-05 / IEI-PI-08)		
N° Renglón	Descripción	Condición
49	Freno de Control	Buenas condiciones
50	Poleas	Buenas condiciones
51	Poleas Ecualizadoras	Buenas condiciones
52	Motor	Buenas condiciones
53	Caja de Engranaje	Buenas condiciones

ELEVADOR AUXILIAR (Procedimientos IEI-PI-05 / IEI-PI-08)		
N° Renglón	Descripción	Condición
54	Freno de Control	No aplica
55	Poleas	No aplica
56	Poleas Ecualizadoras	No aplica
57	Motor	No aplica
58	Caja de Engranaje	No aplica

OBSERVACIONES

- El equipo utiliza únicamente el elevador principal, es un polipasto.
- Descripción del polipasto: Marca: **R&M** Modelo: **SX30410032** Cap.: **3.200** Kgs
  Long **12" Ø 10"** Ranura: **1/4"** Canales: **60** Velocida **6** m/min Altura: **6** m

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN DE CABLES (Procedimiento IEI-PI-07)

N° Renglón	Descripción							Condición
59	Aplicación	Diámetro	Clasificación	Clase/ grado	Resist. Ruptura	Factor de Seguridad	Arrollado	
59.1	Principal	6,40 mm	8 x 19	2160	4.462 Kgs	5,0	ARD	Buenas condiciones
59.2	Auxiliar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
59.3	Otros							

EQUIPOS DE MEDICIÓN

GALGAS PARA POLEAS	CÓDIGO:	IEI-I018-17	FECHA DE CALIBRACIÓN: 25/05/2023
VERNIER	CÓDIGO:	GE-I017-58	FECHA DE CALIBRACIÓN: 04/04/2023

OBSERVACIONES

- El cable de carga presenta buenas condiciones.
- Descripción del cable: Ø **6,40** mm = **0,252** inch **1/4** 6,4 8XX19B-PWRC

INSPECCIÓN DE LA CADENA (Procedimiento IEI-PI-10)

N° Renglón	Descripción							Condición
60	Aplicación	Diámetro	Clase/ grado	Long. del Eslabón	Ancho del Eslabón	Eslabones 10/20	Capacidad	
60.1	Principal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica
60.2	Auxiliar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica
60.3	Otros							

EQUIPO DE MEDICIÓN

VERNIER	CÓDIGO:	N/A	FECHA DE CALIBRACIÓN: N/A

OBSERVACIONES

- El equipo no utiliza cadena en el sistema de izamiento.

GANCHO Y BLOQUE DE CARGA (Procedimiento IEI-PI-03 / IEI-PI-10)

N° Renglón	Descripción								Condición
61	Capacidad:	**3.200**	KGS	MARCA	**M&R**				Buenas condiciones
62	Peso:	**N/A**	KGS	SERIAL	**HLW24648**				Buenas condiciones
63	Poleas								Buenas condiciones
63.1	Número de Poleas:	**2**	Diámetro de Poleas:	**10"**					Buenas condiciones
63.2	Diámetro de la Ranura:	**1/4"**							Buenas condiciones
64	Tapas								Buenas condiciones
65	Pasadores o Ejes								Ensamblados
66	Retenedores / Ojales								Ensamblados
67	Uña de Seguridad								Buenas condiciones
68	Torcedura 0°								Buenas condiciones
69	Abertura de Garganta ≤ 5% o 1/4"			Lectura:	**95**	mm			Buenas condiciones
70	Desgaste ≤ 10%			Capacidad:	**3.200**	kg			Buenas condiciones
71	Marca:	**R&M**		Serial N°:	**HLW24648**				Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- Se realizó ensayo con partículas magnéticas al gancho, obteniéndose buenos resultados.
- Se realizó ensayo con líquidos penetrantes en un 40% de la ranura de la polea, con buenos resultados.
- El bloque y gancho son originales del fabricante, tienen visibles la identificación del fabricante.
- El diámetro o espesor de la garganta del gancho es: **45** mm
- El bloque de carga utiliza tres poleas, para seis líneas.

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo

Scanned with CamScanner

CÁLCULOS DEL LÍMITE DE TRABAJO SEGURO									
SEGÚN CAPACIDAD DEL CABLE O CADENA DE IZAMIENTO									
N° Renglón	**Descripción**								
72	**Aplicación**	**Resist. Ruptura**		**Factor de Seguridad**	**N° de líneas**	**Límite de trabajo seguro**		**Límite de trabajo seguro (S.I.)**	
72.1	**Cable Principal**	4.462	Kgs	5,00	4	3.570	Kgs	3.570	KGS
73	**Aplicación**	**CAPACIDAD**			**N° de líneas**	**Límite de trabajo seguro**		**Límite de trabajo seguro (S.I.)**	
73.1	**Cadena Principal**	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
SEGÚN CAPACIDAD DE LOS GANCHOS									
N° Renglón	**Descripción**								
74	**Aplicación**	**Capacidad de carga**				**Capacidad de carga (S.I.)**			
74.1	**Gancho Principal**	3.200			KGS	3.200			KGS
75	**Límite de trabajo seguro del equipo Sist. Principal**					**Límite de trabajo seguro del equipo Sist. Principal (S.I.)**			
75.1	3.200				KGS	3.200			KGS

RECOMENDACIONES

1.- Realizar inspecciones periódicas al cable de carga, y proceder a su reemplazo al momento de presentar hilos rotos, deformación, desgaste y aberturas, según la norma ASME B30.2
2.- Mantener en buenas condiciones operativas los limite (bloqueador) del bloque (al subir y bajar).
3.- Realizar el mantenimiento preventivo del equipo según especificaciones del fabricante.
4.- Mantener actualizado libro de vida de todas las reparaciones y reemplazos realizados al equipo.
5.- Revisar diariamente el equipo por parte del operador y cualquier anormalidad pasarla por escrito al custodio el cual deberá tomar las acciones correctivas.
6.- Instalar en sitio visible al operador la carta de señales de mano.
7.- Buscar otro medio de lubricación del cable de carga, ya que el lubricante actual (grasa) no es el mas recomendado, porque al calentarse pasa a estado líquido y cae sobre el gancho y personas. Adicionalmente se acumula la tierra, formando u abrasivo que produce desgaste del cable.
8.- Pintar en sitio visible y a cada lado del puente la capacidad del equipo.
9.- Realizar inspecciones periódicas a las ruedas del polipasto por parte del personal de mantenimiento, y realizar ajustes a las mismas para mantenerla con la distancia correspondiente a las vigas.

SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI No 007 Miguel García C.I. 7.967.958

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**

SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**

SONOTEST J-F-07649750-7

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SANCHEZ**
C.I.: **11.219.694**

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SONOTEST

REVISIÓN TÉCNICA		REVISIÓN ADMINISTRATIVA	
Firma	Conforme SI / NO	Firma	Conforme SI / NO
Fecha. 13/09/2023		Fecha. 13/09/2023	

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo

Scanned with CamScanner

PRUEBA DE CARGA (Procedimiento IEI-PI-17)					
Propietario:	SAMPIERI & FORTUNATO, S. A. (SAMFOR)	Capacidad:	3.200	KGS	
Lugar:	GALPÓN DE ELECTRICIDAD, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE	Tipo:	GRÚA TIPO PUENTE		
Marca:	R&M	Sub-Tipo:	ELÉCTRICA		
Modelo:	SX30410032P25FAL0F	Año de Fabricación:	2011		
Fabricante:	R&M	Fecha de Prueba:	12/09/2023		
Número de Cables:	4	Diámetro:	6,40	mm = Inch	4/16
Serial:	HLW24648	Clasificación:	8 x 19		

PLUMA PROBADA	LONGITUD DEL PUENTE	CAPACIDAD NOMINAL	CARGA DE PRUEBA	% DE CARGA	TIEMPO DE PRUEBA	RESULTADOS
PRINCIPAL	9,00 Mts	3.200 Kgs	3.400 Kgs	106%	25 Min	Satisfactorio
AUXILIAR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Personalizar comentario

EQUIPO DE MEDICIÓN Y ENSAYO					
DINAMÓMETRO N°:	**IEI-I031-08**	MARCA:	**DILLON**	MODELO:	**10inDINA**
SERIAL:	**D-22157**	RANGO:	**0-10.000 KG**	FECHA DE CALIBRACIÓN:	**01/08/2022**

MASA DE PRUEBA			
TIPO DE MASA:	**CONTRAPESO MONTACARGA**	PESO:	**3.400** Kgs

OBSERVACIONES

- SE REALIZÓ PRUEBA DE CARGA AL SISTEMA PRINCIPAL, OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.
- NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO 3.200 Kg (3,2 ton).
- SE UTILIZÓ PARA LA PRUEBA DE CARGA UN CONTRAPESO DE MONTACARGA, Y SE VERIFICÓ SU PESO CON UN DINAMÓMETRO DE 10 TONELADAS
- UTILIZAR OPERADORES CERTIFICADOS Y CON EXPERIENCIA COMPROBADA.
- LA PRUEBA DE CARGA SE REALIZÓ CON ESTE PESO POR NO CONTAR EN SITIO CON OTRO APROPIADO.
- LA GRÚA ES UTILIZADA ÚNICAMENTE PARA REALIZAR LAS OPERACIONES DEL GALPÓN DE ELECTRICIDAD.


SOFITEST
INSPECTOR CERTIFICADO
No. 007
Miguel García
C.I. 7.967.958


INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo

Scanned with CamScanner

ESQUEMA Y GRÁFICO DE LA PRUEBA CARGA

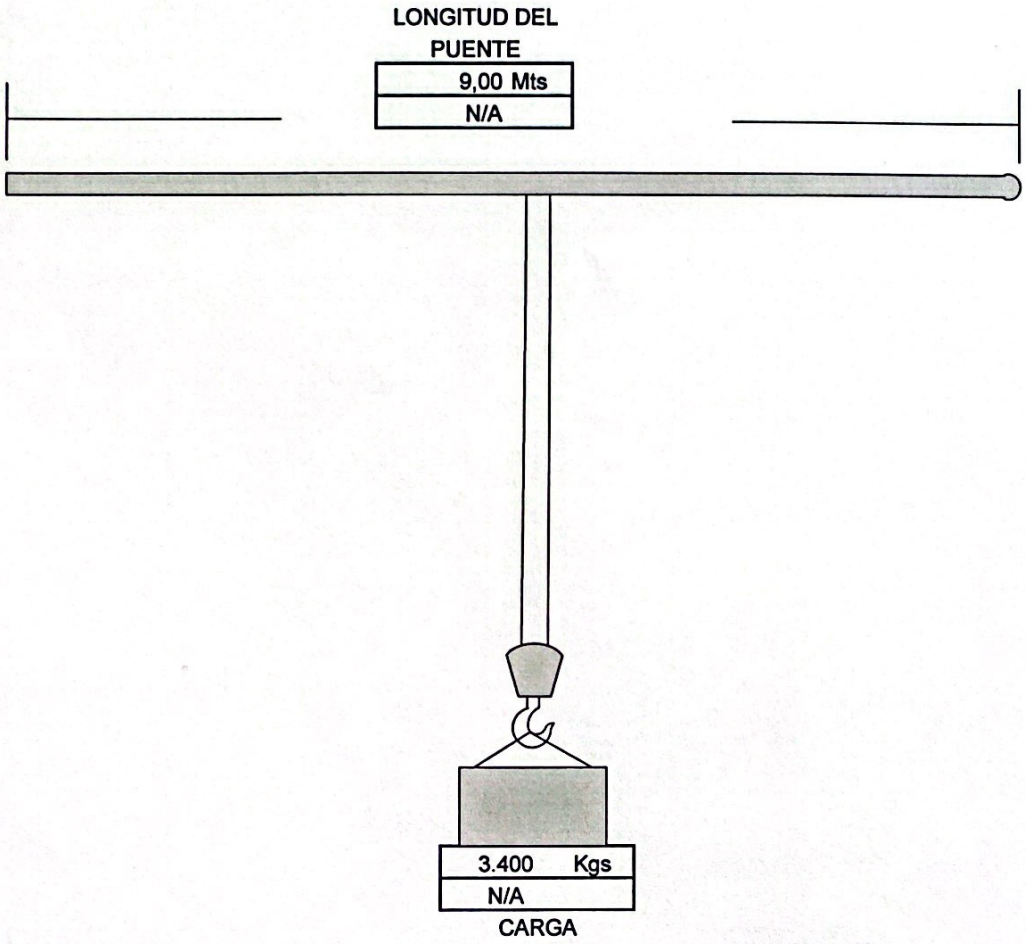

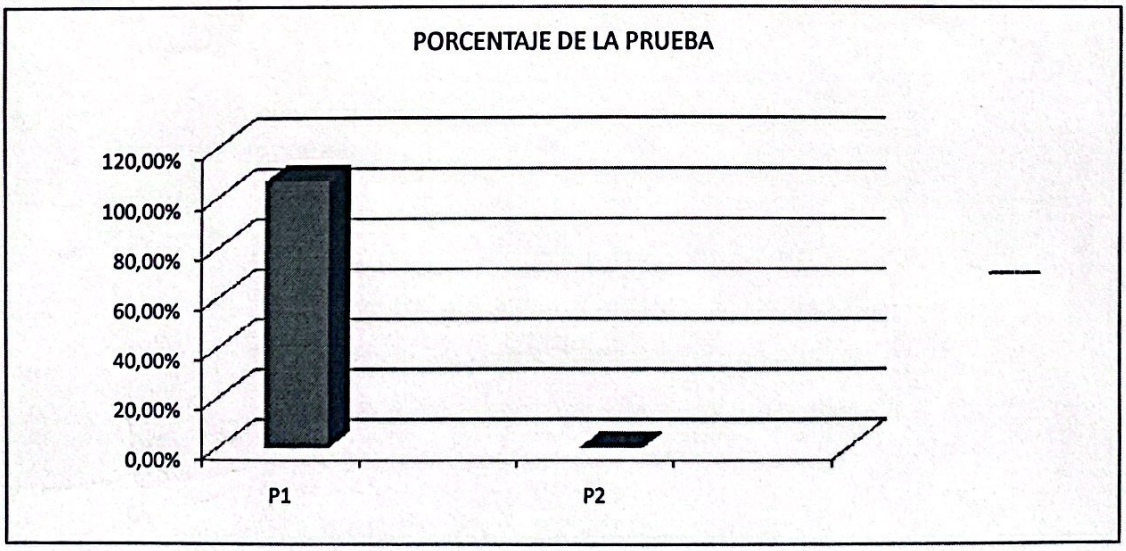

PRUEBA N°	P1	P2
PORCENTAJE	**106%**	N/A

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo

Scanned with CamScanner

SONOTEST
J-07049150-7

FECHA DEL INFORME:	12 de septiembre de 2023

ANEXO

INFORME DE INSPECCIÓN PARA GANCHOS

REPORTE Nº	067-120923-02

FECHA DE INSPECCIÓN	12/9/2023

CLIENTE	SAMPIERI & FORTUNATO, S. A. (SAMFOR)	INFORMACIÓN DEL GANCHO	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO		MARCA	R&M
MARCA	R&M	MODELO	HBC 1.6V
MODELO	SX30410032P25FAL0F	SERIAL	HLW24648
SERIAL	HLW24648	CAPACIDAD	3.200 KGS

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO: **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐


PROCEDIMIENTO	MT-PI-01	CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE	LIMPIA Y PULIDA

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				MATERIALES	
TIPO	YUGO (6 Amp.)	FABRICANTE	CONTOUR PROBE	TIPO DE PARTÍCULAS	HÚMEDAS 7HF
SERIAL	4577	FECHA DE VERIFICACIÓN	18/1/2023	COLOR	NEGRAS /CONST. BLANCO
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	CÓDIGO/SERIAL	GE-I017-58	LIMPIADOR	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	CÓDIGO/SERIAL	GE-I010-84	PENETRANTE	N/A
TIPO	N/A	CÓDIGO/SERIAL	N/A	REVELADOR	N/A

NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME V, ART. VII. / ASME B30.10 / PDVSA CAP. 14 / COVENIN 3212-1996

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO

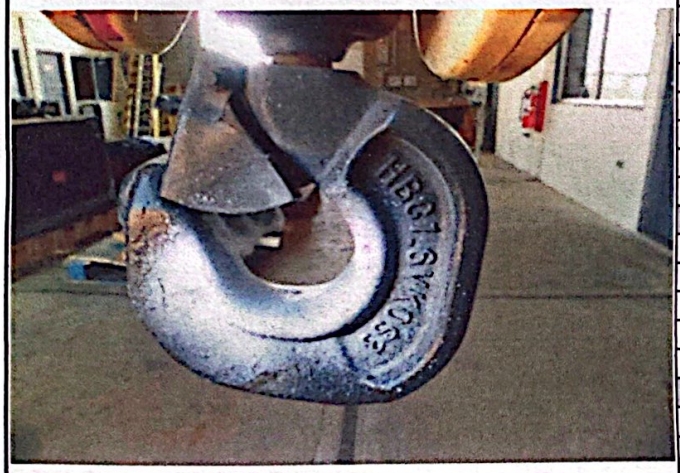

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS A LA GARGANTA DEL GANCHO No.: **HLW24648** DE CAPACIDAD **3.200** KG. OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.

OBSERVACIONES

- EL GANCHO **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO
- NO SE DETECTARON DISCONTINUIDADES EN EL ÁREA DONDE SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN.

RECOMENDACIONES

1.- UTILIZAR ADECUADAMENTE PARA EVITAR DAÑOS MECÁNICOS
2.- REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS, CON EL FIN DE DETECTAR GRIETAS, DEFORMACIÓN Y DESGASTE. SEGÚN NORMA APLICABLE
3.- MANTENER LUBRICADO EL PUNTO DE GIRO DEL GANCHO.

SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI
No. 067
Miguel García
C.I. 7.967.023

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
NIVEL: **II**
FECHA: **12/9/2023**

SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
NIVEL: **II**
FECHA: **12/9/2023**

ASISTENTE
NOMBRE:
NIVEL:
FECHA:

Calle Campo Elías Nº 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Faxes: (0265) 6312513 / 6316113
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Telefax (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Telefax (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Scanned with CamScanner


VISTA DEL BLOQUE DE CARGA




VISTA GENERAL DEL EQUIPO




VISTA DEL TAMBOR Y CABLE DE CARGA

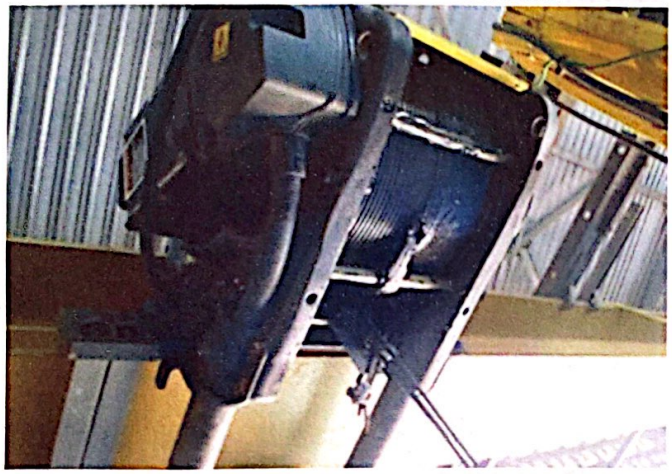


VISTA DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN

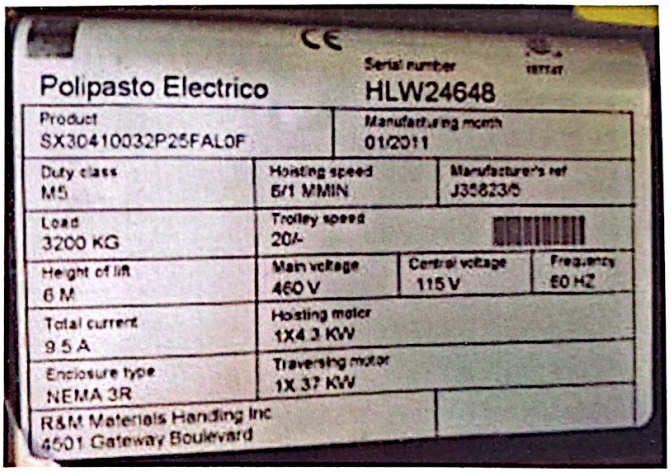

VISTA DE LA PRUEBA DE CARGA APLICADA AL EQUIPO

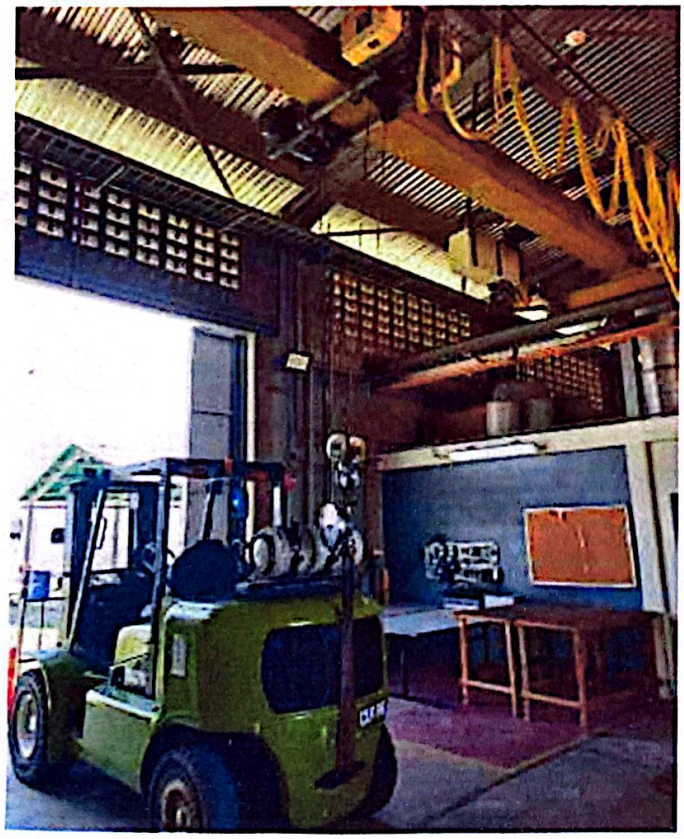

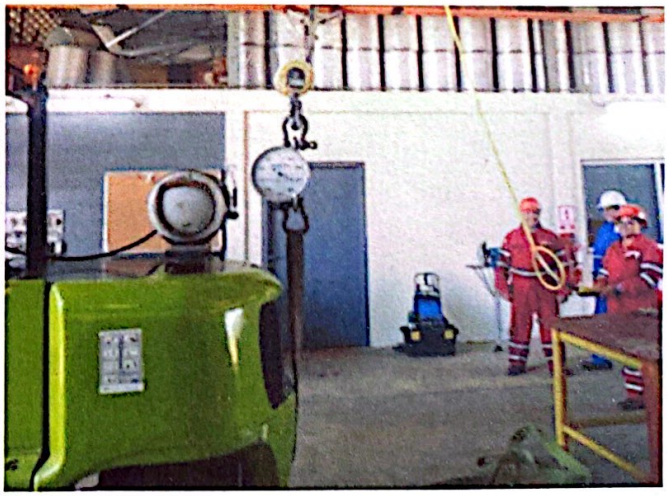





INOTEST
J-07049150-7

Scanned with CamScanner
