INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO DE CARGA

S-7051-B

SONOTEST
J-07049150-7

EQUIPO APTO

Propietario: **SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.**

Equipo No.: **BG1**

Código Sonotest: **345002045002-189083189**

Tipo: **GRUA MONORIEL**

Serial: **189083189**

Marca: **CHESTER**

Modelo: **ZEPHYR**

Fecha de Inspección: **27/03/2024**

Fecha de Vencimiento: **27/03/2025**

Capacidad Nominal: **10.000 KGS**

Cap. Trabajo Seguro: **9.072 KGS**

De acuerdo al informe de inspección No.: 067-270324-01 de Fecha: 27/03/2024 el equipo se encuentra 'APTO' para operar dentro de las condiciones y parámetros establecidos en las tablas de carga, recomendaciones suministradas por el fabricante y especificaciones del equipo inspeccionado.

Certificado en: TURBOGENERADOR BG1, TERMOELECTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO-ZULIA.

INSPECTOR	RESPONSABLE TECNICO	POR SONOTEST
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF. J-07049150-7
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SANCHEZ
FIS-0023-003	FIS-0023-002	REPRESENTANTE

Escaneado con CamScanner

SONOTEST

J-07049150-7

CERTIFICADO DE EQUIPO DE IZAMIENTO DE CARGA

INSPECCIÓN DE GRUA MONORIEL

El equipo abajo identificado ha sido inspeccionado de acuerdo a las Normas:
ASME B30-11,PDVSA CAP14, COVENIN 3510 y Procedimientos Sonotest, S.A. IEI-MA-01

No. Certificado: **CO-27-03-24-01**

Código Sonotest: **345002045002-189083189**
Propietario: **SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.**
Tipo de Equipo: GRUA MONORIEL
Subtipo: DE CADENA
No. del Equipo: BG1 Serial: 189083189
Fabricante: CHESTER Modelo: ZEPHYR
Capacidad Nominal: 10.000 KGS Año de Fabricación: 2010

Condiciones del Equipo Certificado:
de Líneas: N/A Cap. del Bloque: 10.000 Cap. Trabajo Seguro: 9.072 KGS

Características del Cable de Acero:
Diámetro (mm): N/A Clasificación: N/A Factor de Seguridad: N/A
Resist. Ruptura: N/A Clase/Grado: N/A Arrollado: N/A

Características del Malacate (Principal):
Marca: N/A Modelo: N/A Año: N/A Serial: N/A Potencia: N/A

Características de la Estructura o Pluma
Marca: N/A Modelo: N/A Año: N/A Capacidad Nominal: N/A
Altura: N/A Longitud: N/A Serial: N/A

De acuerdo al informe de inspección Nº: 067-270324-01 de Fecha: 27/03/2024 el equipo se encuentra 'APTO' para operar dentro de las condiciones y parámetros establecidos en las tablas de carga, recomendaciones suministradas por el fabricante y especificaciones del equipo inspeccionado.

Lugar de Insp.: TURBOGENERADOR BG1, TERMOELECTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO-ZULIA.
Observaciones: NO EXCEDER EL LIMITE NOMINAL DE CARGA DE LA VIGA MONORRIEL 9.072 KGS.
Fecha de Inspección: **Inicio:** 13/09/2023 **Culminación:** 27/03/2024

Fecha de Vencimiento: 27/03/2025

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SANCHEZ
FIS-0023-003	FIS-0023-002	REPRESENTANTE
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI Miguel Garcia	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF J-07049150-7
Firma	Firma	Firma

Nota: 1.- Este certificado no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo 2.- Este certificado pierde validez al cumplirse la fecha de vencimiento o cuando el equipo se involucre en un accidente de cualquier naturaleza. En los equipos móviles debe considerarse su reinspección, para asegurar su operabilidad, cuando: 1) Se efectúen modificaciones al diseño, 2) Exista duda sobre su condición, 3) Se haya hecho un traslado

Número del Documento: **S-7051-B**

Calle Campo Elías Nº. 122A, Apartado Nº. 134, Ciudad Ojeda, Estado Zulia, Venezuela. Telef. (0265) 6628329/6315272; Fax (0265) 63112513.
Página Web: www.sonotest.com, e-mail: sonotest@sonotest.com

Escaneado con CamScanner


SONOTEST
J-07049150-7

FECHA DEL INFORME:	27 de marzo de 2024

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO
INSPECCIÓN DE GRÚA TIPO MONORRIEL O GANTRY

REPORTE Nº:	067-270324-01

PROPIETARIO:	SAMPIERI & FORTUNATO, S. A. (SAMFOR)				
LUGAR:	TURBOGENERADOR BG1, TERMOELECTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO. ZULIA.				
EQUIPO No:	BG1	SERIAL:	189083189	CAP. NOMINAL:	10.000 KGS
CAPACIDAD NOMINAL (S.I.):	10.000 KGS	CAPACIDAD DE TRABAJO SEGURO (S.I.):			9.072 KGS
MODELO:	ZEPHYR	TIPO:	GRÚA TIPO MONORRIEL	SUB-TIPO:	CADENA
MARCA:	CHESTER	AÑO:	2010	FABRICANTE:	CHESTER
FECHA DE INICIO DE INSPECCIÓN:	13 de septiembre de 2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE INSPECCIÓN :			27 de marzo de 2024
NORMAS APLICABLES:	ASME B30,11 / PDVSA CAP. 14 / COVENIN 3510-1999	PROCEDIMIENTO SONOTEST:			IEI-MA-01

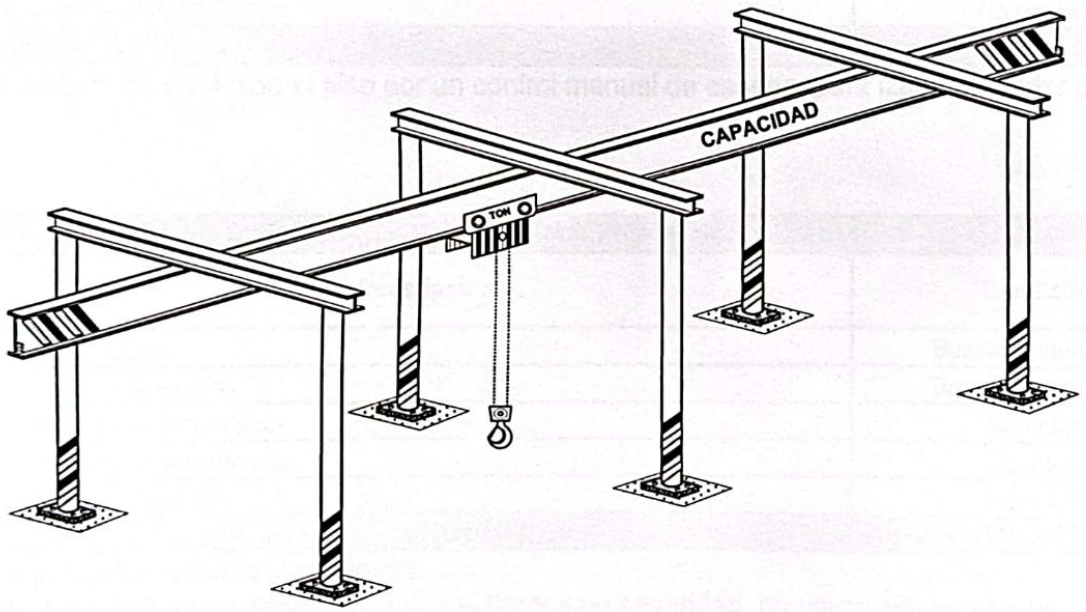

GRÚA TIPO MONORRIEL O GANTRY

OBSERVACIONES

- EL EQUIPO **ESTÁ APTO** PARA REALIZAR TRABAJOS DE IZAMIENTO.
- NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DE LA VIGA MONORRIEL 20.000 Lbs/**9.072 Kg (9 ton).**
- REVISAR DIARIAMENTE EL EQUIPO POR PARTE DEL OPERADOR Y CUALQUIER ANORMALIDAD PASARLO POR ESCRITO AL CUSTODIO EL CUAL DEBERÁ TOMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS.
- NOTA: EL EQUIPO UTILIZA UNA EXTENSIÓN DE LA VIGA MONORRIEL, QUE SE ANEXA PARA PODER SACAR LA TURBINA S/N: **BLP-19179301 (A)(B)(C(D)(E)** CAPACIDAD**: 20.000 LBS / 9.072 KG.**

Los resultados de la inspección corresponden exclusivamente al equipo:
MARCA: CHESTER **SERIAL Nº: 189083189**
El cual ha sido inspeccionado de acuerdo con los procedimientos de inspección de SONOTEST, S. A., las normas PDVSA, COVENIN, ASME / ANSI Serie B30 y API RP aplicables y se encuentra en condición: CONFORME

INSPECTOR CALIFICADO IEI
Miguel García
INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST, S.A.

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo

Escaneado con CamScanner

DATA HISTÓRICA DEL EQUIPO		
Verificar el historial del equipo relacionado con:		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
1	Record de Inspecciones	Presenta y está actualizado
2	Record de Modificaciones del Elevador	Presenta y está actualizado
3	Record de Modificaciones Aguilón-Pescante	Presenta y está actualizado
4	Reportes Ensayos Carga al Aguilón	Presenta y está actualizado
5	Manual de Operaciones	No presenta

OBSERVACIONES

- El equipo no tiene inspección anterior.
- La empresa SAMFOR, suministró la documentación requerida.

CONTROLES (Procedimiento IEI-PI-12)		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
6	Cadena de Control	Buenas condiciones
7	Mando de Control Eléctrico	No presenta
8	Cable del Mondo de Control	No presenta

OBSERVACIONES

- El equipo es controlado desde el piso por un control manual de cadena, para izar y trasladar la carga.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (Procedimiento IEI-PI-18)		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
9	Topes del Carro	Buenas condiciones
10	Limitador de Recorrido	Buenas condiciones
11	Dispositivos Anti-Two Block	No aplica
12	Dispositivos de Advertencia	No aplica
13	Conexiones Eléctricas	No aplica

OBSERVACIONES

- Los topes presentan buenas condiciones.
- El equipo presenta buenas condiciones de los límites de seguridad, no utiliza anti-two-block.

CARRO O TROLLEY (Procedimiento IEI-PI-10)		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
14	Marca: Capacidad:	Buenas condiciones
15	Ejes y Pasadores	Buenas condiciones
16	Ruedas	Buenas condiciones
17	Tapas	Buenas condiciones
18	Transmisión / Engranajes	No aplica
19	Alineación con la Viga	Buenas condiciones
20	Topes / Parachoques	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El trolley presenta buenas condiciones.
- Los pasadores del trolley estaban ensamblados al momento de la inspección.
- Descripción del trolley: Marca: **CHESTER** Modelo: **ZEPHYR** Cap.: **10 TON**

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo

Escaneado con CamScanner

ELEVADOR DE CARGA (Procedimientos IEI-PI-05 / IEI-PI-08)		
N° Renglón	Descripción	Condición
21	Ranura / Poleas	Buenas condiciones
22	Motor	No aplica
23	Poleas Ecualizadoras	Buenas condiciones
24	Frenos Aire: Eléctricos: Mecánicos: X	Buenas condiciones
25	Caja de Engranajes	No aplica
26	Tambor o Polea de Engranaje	No aplica
27	Ranuras del Tambor	No aplica
28	Frenos del Sistema de Carga (Subir-Bajar)	Buenas condiciones
29	Tornillos de Sujeción y Soportes	Buenas condiciones
30	Soporte	Buenas condiciones
31	Otros	No aplica

OBSERVACIONES

- El equipo utiliza unicamente el elevador principal, es un polipasto.
- Descripción del polipasto: Marca: **CHESTER** Modelo: **ZEPHYR** Cap.: **10.000** Kgs

ESTRUCTURA DE IZAMIENTO (Procedimiento IEI-PI-13)		
N° Renglón	Descripción	Condición
32	Estructura Soporte de Monorriel	Buenas condiciones
33	Sistema de Fijación de la Estructura	Buenas condiciones
34	Soldaduras o Pernos de Fijación de la Estructura	Buenas condiciones
35	Viga Monorriel Tipo: **"I" NP 30** Capacidad de Carga: **9.072** Kg	Buenas condiciones
36	Fijación de la Viga a la Estructura	Buenas condiciones
37	Topes del Carro	Buenas condiciones
38	Alineación de la Viga	Buenas condiciones
39	Soldaduras o Pernos de Unión Columna / Viga	Buenas condiciones
40	Resultados del END	No aplica
41	Marcaje de la Capacidad del Monorriel	Personalizar comentario

OBSERVACIONES

- La viga monorriel presenta buenas condiciones, utiliza una extensión de 4,20 m S/N **BLP-191793-01.**
- La viga no tiene pintado la capacidad de carga de la estructura.
- Descripción de la viga monorriel: Viga tipo: **"I"** Alma: **30** cm Ala: **10,0** cm Altura: **3,3** mt Longitud (luz ó flecha): **7,8** mt Cap.: **9,1** ton Año **2010** Marca: **BLP** **BLP-191793-01**

INSPECCIÓN DE CABLES (Procedimiento IEI-PI-07)								
N° Renglón	Descripción							Condición
42	Aplicación	Diámetro	Clasificación	Clase/ grado	Resist. Ruptura	Factor de Seguridad	Arrollado	
42.1	Principal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica
42.2	Auxiliar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica
42.3	Otros							

EQUIPOS DE MEDICIÓN				
GALGAS PARA POLEAS	CÓDIGO:	**N/A**	FECHA DE CALIBRACIÓN:	**N/A**
VERNIER	CÓDIGO:	**N/A**	FECHA DE CALIBRACIÓN:	**N/A**

OBSERVACIONES

- El equipo no utiliza cable de acero.

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN DE LA CADENA (Procedimiento IEI-PI-10)

N° Renglón	Descripción							Condición
43	Aplicación	Diámetro	Clase/ grado	Long. del Eslabón	Ancho del Eslabón	Eslabones 10/20	Capacidad	
43.1	Principal	12,70 mm	80	65	45	41	5.445 Kgs	Buenas condiciones
43.2	Auxiliar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
43.3	Otros							

EQUIPO DE MEDICIÓN

VERNIER	CÓDIGO:	GE-I017-58	FECHA DE CALIBRACIÓN:	04/10/2023

OBSERVACIONES

- La cadena presenta buenas condiciones. Se realizó inspección visual.
- Descripción de la cadena: Marca: **CHESTER** Ø: **0,500** = **1/2** Inch
  Grado: **80** Código: **RKJ**

GANCHO Y BLOQUE DE CARGA (Procedimiento IEI-PI-03 / IEI-PI-10)

N° Renglón	Descripción							Condición
44	Capacidad:	**10.000**	KGS	MARCA	**CHESTER**			Buenas condiciones
45	Peso	**S/I**	KGS	SERIAL	**189083189**			Buenas condiciones
46	Poleas							Buenas condiciones
46.1	Número de Poleas:	**2**	Diámetro de Poleas:	**3"**				Buenas condiciones
46.2	Diámetro de la Ranura:	**1/2"**						Buenas condiciones
47	Tapas							Buenas condiciones
48	Pasadores o Ejes							Ensamblados
49	Retenedores / Ojales							Ensamblados
50	Uña de Seguridad							Buenas condiciones
51	Torcedura 0°							Buenas condiciones
52	Abertura de Garganta ≤ 5% o 1/4"		Lectura:	**115**	mm			Buenas condiciones
53	Desgaste ≤ 10%		Capacidad:	**10.000**	kg			Buenas condiciones
54	Marca:	**ALLOYS**	Serial N°:	**S/S**				Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- Se realizó ensayo con líquidos penetrantes al gancho, obteniéndose buenos resultados.
- El bloque de carga utiliza dos poleas de cadena, para cuatro líneas.
- El bloque y gancho son originales del fabricante.
- El gancho tiene visibles la identificación del fabricante.
- El diámetro o espesor de la garganta del gancho es: **56** mm

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo

Escaneado con CamScanner

CÁLCULOS DEL LÍMITE DE TRABAJO SEGURO								
SEGÚN CAPACIDAD DEL CABLE O CADENA DE IZAMIENTO								
N° Renglón	**Descripción**							
55	**Aplicación**	**Resist. Ruptura**		**Factor de Seguridad**	**N° de líneas**	**Límite de trabajo seguro**		**Límite de trabajo seguro (S.I.)**	
55.1	**Cable Principal**	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
56	**Aplicación**	**CAPACIDAD**			**N° de líneas**	**Límite de trabajo seguro**		**Límite de trabajo seguro (S.I.)**	
56.1	**Cadena Principal**	5.445		Kgs	4	21.780	KGS	21.780	KGS
SEGÚN CAPACIDAD DE LOS GANCHOS								
N° Renglón	**Descripción**							
57	**Aplicación**	**Capacidad de carga**			**Capacidad de carga (S.I.)**			
57.1	**Gancho Principal**	10.000		KGS	10.000		KGS	
58	**Límite de trabajo seguro del equipo Sist. Principal**				**Límite de trabajo seguro del equipo Sist. Principal (S.I.)**			
58.1	9.072			KGS	9.072		KGS	

RECOMENDACIONES

1.- Realizar inspecciones periódicas a la cadena de carga y proceder a su reemplazo al momento de presentar, deformación, desgaste o torceduras, según la ASME B30.11, 16 y 21.
2.- Mantener en buenas condiciones de legibilidad las indicaciones del control de mando.
3.- Mantener lubricado cadenas y engranajes.
4.- Mantener en buenas condiciones los topes del equipo y los dispositivos de seguridad.
5.- Revisar diariamente el equipo por parte del operador y cualquier anormalidad pasarla por escrito al custodio quien deberá tomar las acciones correctivas.
6.- Realizar el mantenimiento preventivo del equipo según especificaciones del fabricante.
7.- Buscar otro medio de lubricación de la cadena de carga, ya que el lubricante actual (grasa) no es el mas recomendado, porque al calentarse pasa a un estado líquido y cae sobre el gancho y personas. Adicionalmente se acumula la tierra, formando u abrasivo que produce desgaste del cable.
8.- Realizar inspecciones periódicas a las ruedas del polipasto por parte del personal de mantenimiento, y realizar ajustes a las mismas para mantenerla con la distancia correspondiente a las vigas.
9.- Mantener el gancho de carga con la uña de seguridad en buenas condiciones.
10.- El equipo utiliza una estructura/extensión del monoriel que es utilizado para sacar la turbina, el mismo consta de varios componentes identificados con los No. BLP-191793-01 (A)(B)(C)(D), los cuales tienen una capacidad de 20.000 Lbs / 9.072 kg.
11.- El equipo queda limitado para trabajar hasta **20.000 Lbs / 9.072 kgs** por la cap. de la viga monorriel

SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI No. I

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7967958**
CERT.: **FIS-0023-003**

SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**

SONOTEST RIF: J-07[illegible]50-7

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SONOTEST

REVISION TÉCNICA		REVISIÓN ADMINISTRATIVA	
Firma	Conforme	Firma	Conforme
	☑ SI ☐ NO		☑ SI ☐ NO
Fecha. 02 / 04 / 2024		Fecha. 02 / 04 / 2024	

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo

Escaneado con CamScanner

PRUEBA DE CARGA (Procedimiento IEI-PI-17)					
Propietario:	SAMPIERI & FORTUNATO, S. A. (SAMFOR)	Capacidad:	10.000	KGS	
Lugar:	TURBOGENERADOR BG1, TERMOELECTRICA BAJO	Tipo:	GRÚA TIPO MONORRIEL		
Marca:	CHESTER	Sub-Tipo:	CADENA		
Modelo:	ZEPHYR	Año de Fabricación:	2010		
Fabricante:	CHESTER	Fecha de Prueba:	27/03/2024		
Número de Cables:	4	Diámetro:	12,70	mm = Inch	4/8
Serial:	189083189	Clasificación:	80		

PLUMA PROBADA	LONGITUD DEL MONORRIEL	CAPACIDAD NOMINAL	CARGA DE PRUEBA	% DE CARGA	TIEMPO DE PRUEBA	RESULTADOS
PRINCIPAL	7,80 Mts	10.000 Kgs	12.000 Kgs	120%	25 Min	Satisfactorio
AUXILIAR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Personalizar comentario

EQUIPO DE MEDICIÓN Y ENSAYO					
DINAMÓMETRO N°:	IEI-I031-08	MARCA:	DILLON	MODELO:	10inDINA
SERIAL:	D-22157	RANGO:	0-10.000 KG	FECHA DE CALIBRACIÓN:	02/11/2023

MASA DE PRUEBA			
TIPO DE MASA:	BLOQUES DE CONCRETO	PESO:	12.000 Kgs

OBSERVACIONES

- EL EQUIPO ESTÁ APTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE IZAMIENTO.
- NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DE LA VIGA MONORRIEL 20.000 Lbs/9.072 Kg (9 ton).
- SE UTILIZÓ PARA LA PRUEBA DE CARGA DOS BLOQUES DE CONCRETO, A LOS QUE SE VERIFICÓ EL PESO CON UN DINAMÓMETRO DE 10 TON. (1 BLOQUE DE 10t Y OTRO DE 2t)
- UTILIZAR OPERADORES CERTIFICADOS Y CON EXPERIENCIA COMPROBADA.
- LA PRUEBA DE CARGA SE REALIZÓ A LA CAPACIDAD LÍMITE DEL MONORRIEL.
- SE VERIFICÓ LA DEFLEXIÓN DEL MONORRIEL CON LA CARGA EN EL CENTRO DEL MISMO.
- LA GRÙA ES UTILIZADA UNICAMENTE PARA LA MOVILIZACIÓN DE LA TURBINA BG2.
- LA PRUEBA DE CARGA FUE REALIZADA DESPLAZANDO LA CARGA EN LAS ÁREAS DE FÁCIL ACCESO, YA QUE EL EQUIPO TIENE EL ÁREA DE TRABAJO LIMITADA.


INSPECTOR


NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CICB: **FIS-0023-003**

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo

Escaneado con CamScanner

ESQUEMA Y GRÁFICO DE LA PRUEBA DE CARGA

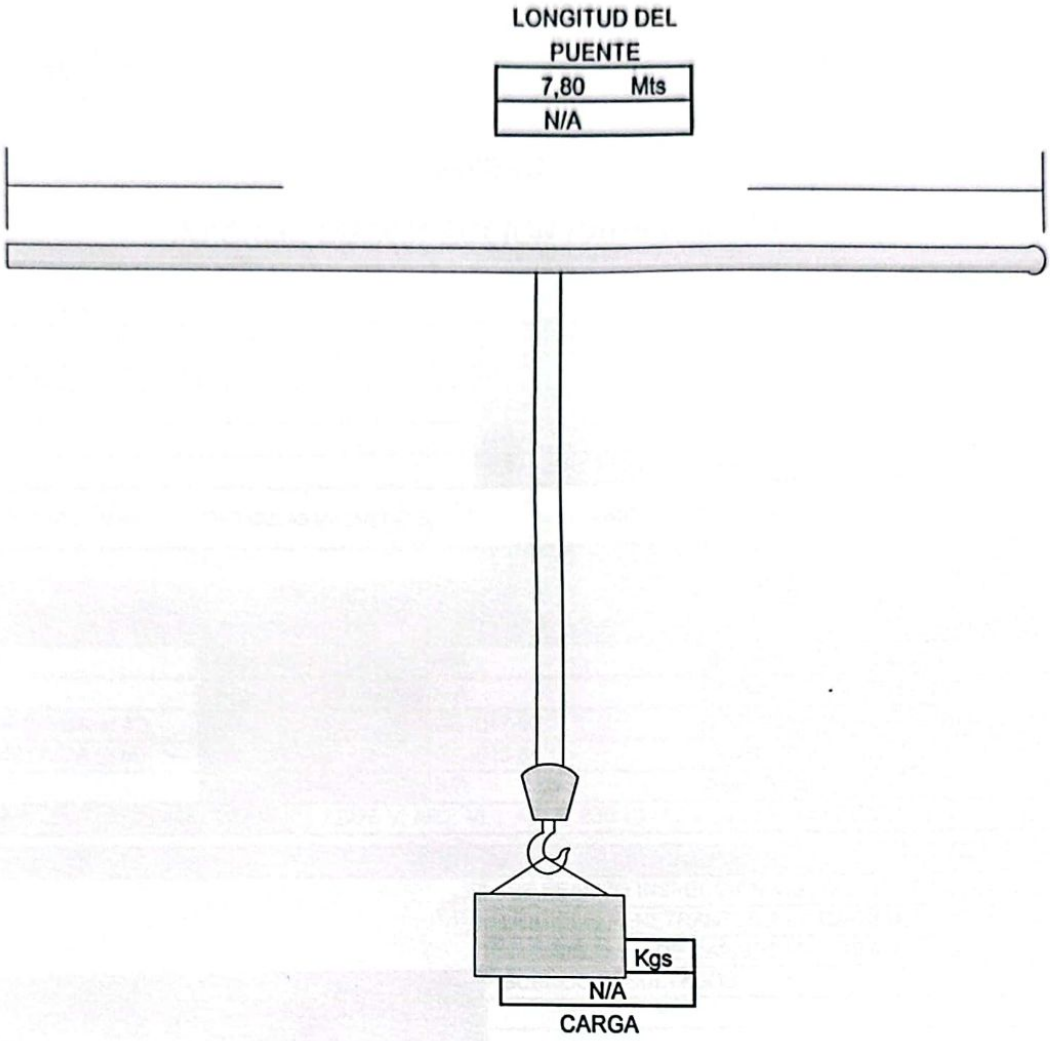

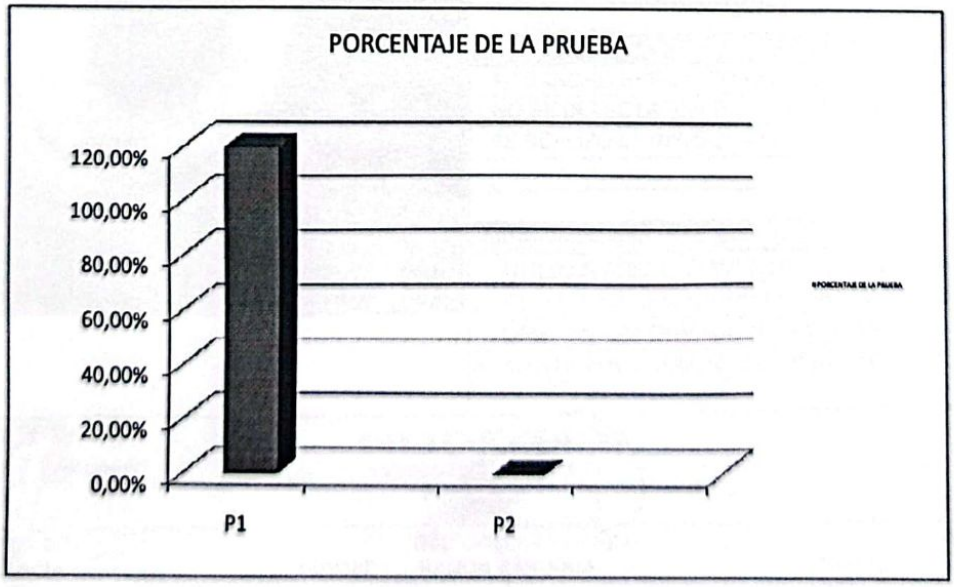

PRUEBA N°	P1	P2
PORCENTAJE	120%	N/A

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo

Escaneado con CamScanner

SONOTEST
J-07049150-7

FECHA DEL INFORME:	27 de marzo de 2024

ANEXO

INFORME DE INSPECCIÓN PARA GANCHOS

REPORTE Nº	067-270324-01

FECHA DE INSPECCIÓN	27/03/2024


CLIENTE	SAMPIERI & FORTUNATO, S. A. (SAMFOR)	INFORMACIÓN DEL GANCHO	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO		MARCA	ALLOYS
MARCA	CHESTER	MODELO	FORGED
MODELO	ZEPHYR	SERIAL	S/S
SERIAL	189083189	CAPACIDAD	10.000 KGS

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS ☐ LÍQUIDOS PENETRANTES ☑

PROCEDIMIENTO	PT-PI-01	CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE	LIMPIA Y PULIDA

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO					
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				MATERIALES	
TIPO	N/A	FABRICANTE	N/A	TIPO DE PARTÍCULAS	N/A
SERIAL	N/A	FECHA DE VERIFICACIÓN	N/A	COLOR	N/A
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	CÓDIGO/SERIAL	GE-I017-58	LIMPIADOR	SKC-SC (10 min)
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	CÓDIGO/SERIAL	GE-I010-84	PENETRANTE	SKL-SP (10 min)
TIPO	N/A	CÓDIGO/SERIAL	N/A	REVELADOR	SKD-S2 (5 min)
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME V, ART. VI. / ASME B30.10 / PDVSA CAP. 14 / COVENIN 3212-1996				

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO

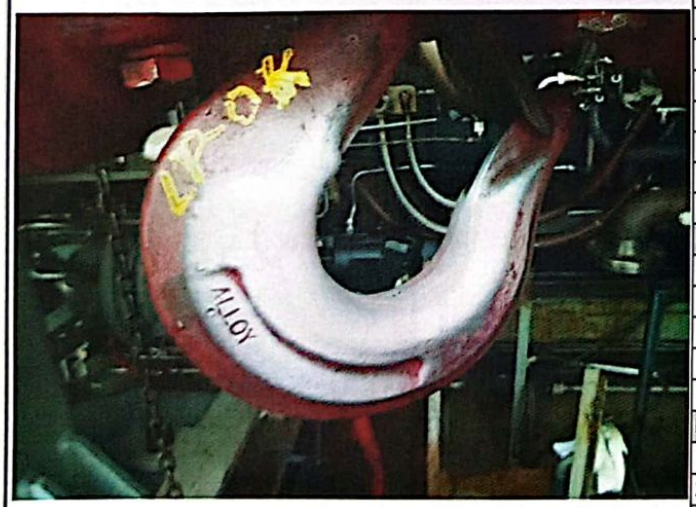

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON LÍQUIDOS PENETRANTES A LA GARGANTA DEL GANCHO No.: **S/S** DE CAPACIDAD **10.000** KG. OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.

OBSERVACIONES

- EL GANCHO **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO
- NO SE DETECTARON DISCONTINUIDADES EN EL ÁREA DONDE SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN.

RECOMENDACIONES

1.- UTILIZAR ADECUADAMENTE PARA EVITAR DAÑOS MECÁNICOS
2.- REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS, CON EL FIN DE DETECTAR GRIETAS, DEFORMACIÓN Y DESGASTE. SEGÚN NORMA APLICABL
3.- MANTENER LUBRICADO EL PUNTO DE GIRO DEL GANCHO.

SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO
Miguel García

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
NIVEL: **II**
FECHA: **27/03/2024**

SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
NIVEL: **II**
FECHA: **27/03/2024**

ASISTENTE
NOMBRE:
NIVEL:
FECHA:

Calle Campo Elías Nº 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Faxes: (0265) 6312513 / 6316113
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Telefax (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Telefax (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Escaneado con CamScanner

VISTA DEL BLOQUE DE CARGA



VISTA GENERAL DEL EQUIPO



VISTA DEL TROLLEY



VISTA DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN



VISTA DE LA PRUEBA DE CARGA APLICADA AL EQUIPO





Escaneado con CamScanner
