INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SENCAMER
COJ-24961

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN DE EQUIPO TIPO LIFT FIXTURE
(ACCESORIO DE ASCENSOR)
No: I-EI-ETLF-25-012

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ***ACEPTABLES****, POR LO TANTO EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN* ***APTO*** *PARA REALIZAR OPERACIONES A LA CUAL FUE FABRICADO DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO EL EQUIPO PRESENTE DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SISTEMAS MECÁNICOS, SISTEMAS ELÉCTRICOS,, DAÑOS POR SOBRECARGAS O SE INVOLUCRE EN ACCIDENTES OPERACIONALES.*

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN, CÓDIGO ASME B30,20, PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INVERMULCA, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO:

TIPO DE EQUIPO : ***INSPECCIÓN DE EQUIPO TIPO LIFT FIXTURE (ACCESORIO DE ASCENSOR)***

TIPO: LIFT FIXTURE (equipo de Izamiento de turbinas) MODELO: LM6000 (TIPO AVION) FABRICANTE: LM6000 (SAMFOR) SERIAL288870-C

*CAPACIDAD NOMINAL DE CARGA:*9.299KG CARGA SEGURA :9.299 -20%=**7439 KG**

*NORMAS Y CÓDIGOS APLICADOS:*COVENIN 3174, 3177, 3329, 3510 NORMA INTERNACIONAL ,ASME D30,20

PERTENECIENTE A : SAMPIERI & FORTUNATO,SA *RIF:*J-070043482

FECHA DE INSPECCIÓN: 02/05/2025 *VIGENCIA:* UN(1) AÑO *FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN* 02/05/2026

INSPECTOR ; Ing.: Dalmilo Rosales
NIVEL II NDT

COORDINADOR; Ing. Javier Rodriguez
NIVEL II NDT
FIS-0021-006/VT-027-2022 / UT – 029-2022 / PT 038-2022

I-ETLF-25-010
I-LP-ELFT -25-037
I-PC- ETLF -25-019

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN DE EQUIPO TIPO LIFT FIXTURE (ACCESORIO DE ASCENSOR)

REPORTE DE INSPECCIÓN GRÚA TIPO PUENTE Y PÓRTICO							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	R#	J-070043482	EQUIPO	S-LF-01	No. REPORTE	I-ETLF-25-010
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LIFT FIXTURE (ACCESORIO DE ASCENSOR) EQUIPO PARA IZAR TURBINAS					FECHA:	02/05/2025
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA EMPRESA (OBRA)					FECHA DE VIGENCIA	02/05/2026
OBJETIVO: Establecer la metodología para la ejecución de los procesos de inspección y pruebas, tanto frecuentes como periódicas en equipos de, Izamientos dar a conocer los criterios de aceptación o rechazo a aplicar de acuerdo con las condiciones detectadas.							
ALCANCE: Este certificado cubre los requerimientos de inspección y pruebas de equipos similares que conserven los fundamentos de diseño originales.							

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO				
No. INTERNO: S-LF-01	FABRICANTE: LM6000 (SAMFOR)	TIPO: LIFT FIXTURE (equipo de izamiento de turbinas)	SERIAL;288870-C	
MODELO: LM6000 (TIPO AVION)	FABRICACION : 2010, CARGA SEGURA :9.299KG-20%=7439 KG	EL (X) CADENA ( ) NEU	CAP. NOMINAL (TON):	9.299KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS									
POLEAS DEL BLOQUE DE CARGA				CADENA (S) DE ACERO	PPAL	AUX	GANCHO(S) DE IZAMIENTO	CADENA	N/A
Ø NOM. DE RANURA	N/A	Ø MED. DE RANURA	N/A	Ø NOMINAL	N/A	N/A	PUENTE PARA ENGANCHE		
POLEAS POLIPASTO O TROLE				Ø MEDIDO			CAPACIDAD	9.299KG	
Ø NOM. DE RANURA	N/A	Ø MED. DE RANURA	N/A	REDUCCIÓN (MM)	N/A	N/A			

4.- CONDICIONES CUALITATIVAS			
ELEMENTO	B/C	M/C	CONDICIONES OBSERVADAS
1.1.- Polea(s)			No aplica
1.2.- Pasadores	X		Se observó sin degaste y operativo
1.3.- Estructura	X		Se observó operativa

SECCIONES INSPECCIONADAS (CONTINUACIÓN)			
ELEMENTO	B/C	M/C	CONDICIONES OBSERVADAS
4.1.- Estructura	X		Se observa estable según diseño
4.3.- Trenes de Traslación	X		Operativo
4.10.- Viga de la estructura	X		TIPO "'I'; NP 30 CAPACIDAD DE CARGA 9.299KG
5.- SISTEMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD			
5.1.- Palancas	x		
5.3.- Topes	X		Operativos
5.4.- Topes Rieles Puente	X		Operativos
5.5 Punto de izamiento	X		Operativos

LEYENDA:					
B/C: Buenas Condiciones	M/C: Malas Condiciones	S/I: Sin Inspección	S/A: Sin Acceso	N/T: No tiene	N/A: No aplica

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN DE EQUIPO TIPO LIFT FIXTURE (ACCESORIO DE ASCENSOR)


PRUEBA DE CARGA					
SE REALIZO LA PRUEBA:	SI ■	NO ☐	INFORME ANEXO:	SI ■	NO ☐

CONCLUSIONES

Se realiza una elevación en marcha lenta con una carga según código aplicado, una vez despegada del suelo el miso fue sometido a un levantamiento de 1.Mts por 15 minutos.
Ver Reporte N ***I-EI-ETLF-25-012***

CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTA: ■	NO APTA: ☐


REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA INSPECCIÓN









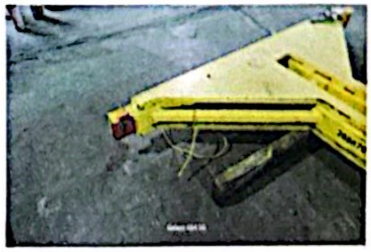

RECOMENDACIONES	
ELEMENTOS No	**ACCIONES**
VIGA	SE OBSRVA EN BUENA CONDICIONES ,
DESCRIPCION DE LA VIGA	VIGA TIPO "I" ALMA: 30 CM, ALA; 10 CM , LONGITUD 4 APR0X MTS CAP 10T MARCA : : LM6000 SERIAL;288870-C

11/24/1996

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN DE EQUIPO TIPO LIFT FIXTURE (ACCESORIO DE ASCENSOR)

OBSERVACIONES

- Los Resultados Indicados En Este Reporte Se Encuentran Asociados A Las Condiciones Operacionales Del Equipo En La Fecha De Inspección En Referencia.

- Estos Resultados Tienen Una Vigencia De Máximo **Doce (12) Meses.** Cumpliendo Con Lo Establecido En El Código Api 9 A Grado Ips 6x19 Resistencia A La Ruptura 11500iwrc ASME B 30.20 "Overhead And Gantry Cranes" (Grúas Puentes Y De Pórtico)" Y **Asme/Ansi B30.21** "Manually Lever Operated Hoist", Covenin 3174 "Equipos De Izamiento. Mantenimiento Y Pruebas". Covenin 3177 "Equipos De Izamiento. Inspección". Covenin 3329 "Certificación De Equipos De Izamiento De Carga". Covenin 3510 "Equipos Izamiento, Grúas Puente, Pórtico

- Esta Conformidad Perderá Vigencia Una Vez Cumplida Su Fecha De Próxima Verificación, Y/O Cuando En El Equipo Ocurran Las Siguientes Condiciones:

  1.- Cuando El Equipo Evidencie Daños Visibles Relevantes, Que Puedan Afectar Las Funciones Y Condiciones De Uno O Mas De Sus Sistemas Mecánicos Y Estructurales.
  2.- Cuando El Equipo Haya Sido Sometido A Estrés Severo, Sobrecargas O Haya Estado Involucrado En Accidentes Operacionales.
  3.- Cuando El Equipo Sea Modificado, Alterado Y/O Sea Sometido A Una Reparación.

INSPECTOR (ES):	Ing.; Dalmilo Rosales Nivel II	FECHA: 02/05/2025	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	Ing. Javier Rodríguez FIS-0021-006/VT-027-2022 / UT – 029-2022 / PT 038-2022	FECHA: 02/05/2025	FIRMA:

Scanned with CamScanner

REPORTE DE PRUEBA DE CARGA EQUIPO DE IZAMIENTO							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	Rif	J-070043482	EQUIPO	S-LF-01	No REPORTE	I-PC- ETLF -25-019
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LIFT FIXTURE (ACCESORIO DE ASCENSOR) EQUIPO PARA IZAR TURBINAS					FECHA: FECHA VIJENTE	02/05/2025 02/05/2026
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA EMPRESA (OBRA)						
OBJETIVO: VERIFICAR LAS CONDICIONES MECÁNICAS, HIDRÁULICAS Y ESTRUCTURALES DEL EQUIPO.							
ALCANCE: Este certificado cubre los requerimientos de inspección y pruebas de grúas puentes, o de equipos similares que conserven los fundamentos de diseño originales							


DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO			
No. INTERNO: S-LF-01	FABRICANTE: LM6000 (SAMFOR)		TIPO: LIFT FIXTURE (equipo de izamiento de turbinas)
SERIAL;288870-C	MODELO: ZEPHYR		PROPULSIÓN: MECÁNICA
CAP. NOMINAL :9.299KG	MOTOR: MANUAL		
MECANISMO DE ELEVACIÓN:	TIPO DE TRACCIÓN:	TIPO DE CAUCHO:	FABRICACION : 2010, CARGA SEGURA ; 7439 KG

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE CARGA		
INSTRUMENTO UTILIZADO: CARGA CONOCIDAD	MARCA: N/A	MODELO: N/A
Nº DE CERTIFICADO: N/A	FECHA DE CALIBRACIÓN / VIGENCIA: N/A	SERIAL N/A

CONDICIONES OPERATIVAS DURANTE PRUEBA DE CARGA	
CARGA DE PRUEBA: CARGA CONOCIDAD	TIPO DE CARGA: TURBINA
ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE PLUMA: N/A	LONGITUD DE PLUMA: N/A
TIEMPO DE PRUEBA CILINDROS ELEVACIÓN: 10 minutos	CAPACIDAD DE CARGA TABULADA: 8000 KG
RADIO DE CARGA: N/A	% RELACIÓN CON CARGA TABULADA: 20
DESLIZAMIENTO CILINDROS DE ELEVACIÓN:	
DESCENSO DE LA CARGA DURANTE LA PRUEBA: NO SE OBSERVÓ DESCENSO	
DESLIZAMIENTO CILINDROS DE INCLINACIÓN:	
INCLINACIÓN DE LA CARGA DURANTE LA PRUEBA: N/A	
RESULTADOS: Se realiza una elevación en marcha lenta con una carga según código aplicado, una vez despegada del suelo, el miso fue sometido a un levantamiento de 1.Mts por 15 minutos. Con Resultado Satisfactorio.	







CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTO:	X	NO APTO:	

INSPECTOR (ES):	Ing: Dalmilo Rosales Nivel II	FECHA: 02/05/2025	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	Ing. Javier Rodríguez FIS-0021-006/VT-027-2022 / UT – 029-2022 / PT 038-2022	FECHA: 02/05/2025	

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.

Scanned with CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractarios, Aislantes, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales, Aquilar de Andalucía
RIF: J-31133308-8 NIT: usa registro

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fiscal: URBANIZACION LA CONCHUDO CALLE 173 CASA Nº 61A DE SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04146691017,
Email: invermulca14@gmail.com javier.rodriguez@gmail.com duimdar@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

REPORTE PARA INSPECCIÓN CON LÍQUIDOS PENETRANTES

CAL-031

CLIENTE:	FECHA		RPORTE N°:
SAMPIERI & FORTUNATO,SA	02/05/2025	Rif Nro.: J-070043482	I-LP-ELFT -25-037

EQUIPO / PIEZA A ENSAYAR:	TÉCNICA (S) APLICADA (S)	NORMA CÓDIGO:
INSPECCIÓN DE EQUIPO TIPO LIFT FIXTURE (ACCESORIO DE ASCENSOR) SERIAL:288870-C CARGA SEGURA :9.299KG	CONTRASTE CON COLORES ASTM-E-165	ANSI / ASME B31.3 ASME V-SECC.6

CONDICIONES DEL ENSAYO

ESTAMPA DEL SOLDADOR:	JUNTAS:	ESTADO DE LA SUPERFICIE:
PUNTO DE IZAMIENTO	UNI	LISA
----------	----------	----------
----------	----------	----------
----------	----------	----------

LIMPIEZA PREVIA: TRAPO Y CEPILLO

TIPO DE PRODUCTO

PENETRANTE	REVELADOR	LIMPIADOR
ASTM - 165	ASTM - 165	ASTM – 165

APLICACIÓN DEL PENETRANTE	SPRAY ■	IMMERSION ☐	BROCHA ☐	TIEMPO DE PENETRACIÓN: 10 MIN.
MÉTODO DE REMOCIÓN DE EXCESO DE PENETRANTE	CON AGUA ☐	POST EMULSIFICANTE ☐	CON SOLVENTE ■	
APLICACIÓN DEL REVELADOR:	SECO ☐	HÚMEDO NO ACUOSO ■	ACUOSO ☐	

EVALUACIÓN DEL ENSAYO:
Se realizó el ensayo de líquido penetrante a los puntos por donde se iza el equipo con una duración de penetración de 10 minuto sin observarse discontinuidades que pudieran afectar el elemento














COMENTARIOS:
LOS RESULTADO FUERON SATISFACTORIO

REALIZADO POR:
NOMBRE: Javier Rodríguez Nivel II LP N°038-2026
FIRMA: Nivel II IV N° 037-2026
FECHA: **02/05/2025**

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Scanned with CamScanner
