INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN DE EUIPOS DE IZAMIENTO DE PERSONAL

No: I-EIP-24-007

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ACEPTABLES, POR LO TANTO EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN APTO PARA REALIZAR OPERACIONES A LA CUAL FUE FABRICADO DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO EL EQUIPO PRESENTE DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SISTEMAS MECÁNICOS, SISTEMAS ELÉCTRICOS,, DAÑOS POR SOBRECARGAS O SE INVOLUCRE EN ACCIDENTES OPERACIONALES.

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN, CÓDIGO ASME SECCIÓN V, ASME B 30.23, PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INVERMULCA, Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO:

TIPO DE EQUIPO: PLATAFORMA PARA IZAMIENTO DE PERSONAL (MANLIFT) **MARCA**: JLG **MODELO**: 60H

CAPACIDAD: 450 kg **NO. EQUIPO**: No se observó **SERIAL**: 021014-0300022330

TIPO DE MECANISMO: ELECTRICO MECANICO

PERTENECIENTE A: SAMPIERI & FORTUNATO,SA **RIF:** J-070043482

FECHA DE INSPECCIÓN: 02/11/2024 VIGENCIA: UN (1) AÑO **FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN**: 02/11/2025

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

COORDINADOR; Ing.: Dalmilo Rosales

NIVEL II NDT

INSPECTOR; Ing.: Javier Rodríguez

NIVEL II NDT

Covenin:3117 Equipos de Izamientos Inspección
Covenin: 3174 Mantenimiento y Prueba
Covenin: 3228 Certificación de Equipos de Izamientos
Covenin: 3228 Plataforma de Elevación de personal
ASME Secc V Art 9 Visual Examination
Procedimiento Interno INVERMULCA

Escaneado con CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico,
Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable
para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SENCAMER

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN DE EUIPOS DE IZAMIENTO DE PERSONAL

No: I-EIP-24-007

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ***ACEPTABLES****, POR LO TANTO EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN* ***APTO*** *PARA REALIZAR OPERACIONES A LA CUAL FUE FABRICADO DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO EL EQUIPO PRESENTE DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SISTEMAS MECÁNICOS, SISTEMAS ELÉCTRICOS,, DAÑOS POR SOBRECARGAS O SE INVOLUCRE EN ACCIDENTES OPERACIONALES.*

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN, CÓDIGO ASME SECCIÓN V,ASME B 30.23, PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INVERMULCA, Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO:

TIPO DE EQUIPO*: PLATAFORMA PARA IZAMIENTO DE PERSONAL (MANLIFT)* ***MARCA****: JLG* ***MODELO****: 60H*

CAPACIDAD*: 450 kg* ***NO. EQUIPO***: No se observo ***SERIAL****:021014-0300022330*

TIPO DE MECANISMO *: ELECTRICO MECANICO*

PERTENECIENTE *A:SAMPIERI & FORTUNATO,SA* ***RIF:*** *J-070043482*

FECHA DE INSPECCIÓN*: 02/11/2024* *VIGENCIA: UN(1) AÑO* ***FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN****: 02/11/2025*

COORDINADOR; Ing.: Dalmilo Rosales

NIVEL II NDT

INSPECTOR ; Ing.: Javier Rodriguez

NIVEL II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Covenin:3117 Equipos de Izamientos Inspección
Covenin: 3174 Mantenimiento y Prueba
Covenin: 3329 Certificación de Equipos de Izamientos
Covenin: 3829 Plataforma de Elevación de personal
ASME Secc V Art 9 Visual Examination
Procedimiento Interno INVERMULCA

Escaneado con CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e instalación de Revestimiento Termico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA Nº 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

INSPECCIÓN DE PLATAFORMAS PARA IZAMIENTO DE PERSONAL

IM-OP-FO-EI-07

SENCAMER

REPORTE DE INSPECCIÓN DE PLATAFORMAS PARA IZAMIENTO DE PERSONAL							
1. DATOS GENERALES							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	N°. .:		Nº REPORTE	I-EDP-24-007
PROYECTO	Inspección y certificación de plataforma de izamientos de personal					FECHA:	02/11/2024
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA CONTRATISTA					FECHA DE VIGENCIA	02/11/2025
OBJETIVO: Determinar las condiciones de operación, conformidad, seguridad del equipo y de esta forma establecer las acciones de mantenimiento.							

2. DATOS ESPECÍFICOS:			
NO. EQUIPO:	ELEVADOR DE PERSONAL MANLIFT	CAPACIDAD (KG.):	450 Kg
FABRICANTE: JLG	AÑO:1995	MODELO / TIPO:	60H
TIPO DE EQUIPO: ELECTRICO - HIDRAULICO		SERIAL:	021014-0300022330

3.-CONDICIONES CUALITATIVAS

ELEMENTO	BC	MC	CONDICIONES OBSERVADAS
1.- ESTRUCTURA			Pintura Ok
1.1.- Elementos Estruc. Principales	X		
1.2.- Elementos Estruc. Secundarios	X		
1.3.- Base/ Chasis	X		
1.4.- Rodapiés	X		
1.5.- Pasamanos	X		
1.6.- Puerta	X		
1.7.- Pasadores y gatos	X		
1.8.- Pivote	X		
1.9.- Estabilizadores			No se observo
1.10.- Placa de Identificación	X		
1.11-Motor	X		
1.12-Cabina del operador	X		
1,13-Barandas	X		
1.14-Rodapie	X		
1.15-sistema de potencia	X		
1.16-Instrumentos	X		
1.17-Sistema Eléctricos	X		
1.18-Cadena del Mástil			No Aplica
1.19- Ruedas guías torre de elevador			No aplica
1.20- Mástil	X		2 Extensiones

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN DE PLATAFORMAS PARA IZAMIENTO DE PERSONAL

IM-OP-FO-EI-07

SENCAMER

1.21-cauchos	X		operativo
2.- ACCESORIOS DE IZAMIENTO			
2.3- Interruptor limitador	X		
2.4-Botonera	X		
2.5-Sistema Hidráulico	X		
2.6-Inteructor Principal	X		
2,7-Bloqueador	X		
2.8 Cajera Eléctricas	X		

Leyenda:

BC: Buenas Condiciones	**MC:** Malas Condiciones	**S/I:** Sin Inspección	**S/A:** Sin Acceso	**N/T:** No tiene	**N/A:** No aplica

PRUEBA DE CARGA

SE REALIZÓ LA PRUEBA: ■ SI NO ☐ INFORME ANEXO ■


CODIGO DE REFERENCIA

Covenin:3117 Equipos de Izamientos Inspección
Covenin: 3174 Mantenimiento y Prueba
Covenin: 3329 Certificación de Equipos de Izamientos
Covenin: 3829 Plataforma de Elevación de personal
ASME Secc V Art 9 Visual Examination
Procedimiento Interno INVERMULCA

CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTA:	■	NO APTA:	☐

REFERENCIAS FOTOGRÀFICAS DE LA INSPECCIÓN.



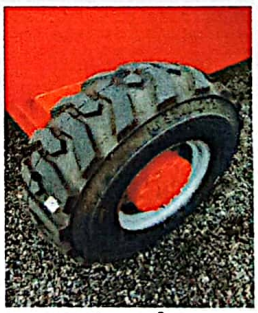






Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN DE PLATAFORMAS PARA IZAMIENTO DE PERSONAL

IM-OP-FO-EI-07

SENCAMER

RECOMENDACIONES	
ELEMENTOS	**ACCIONES**
1.	Mantenimiento preventivo
2	Resguardar controle en la intemperie

OBSERVACIONES:

Se sometió a prueba de operación por un periodo de 20 minuto observándose todo los componentes con resultado satisfactorios.
Norma en cuestión; Covenin:3117 Equipos de Izamientos Inspección ,Covenin: 3174 Mantenimiento y Prueba ,Covenin: 3329 Certificación de Equipos de Izamientos ,Covenin: 3829 Plataforma de Elevación de personal ,ASME Secc V Art 9 Visual Examination
Procedimiento Interno INVERMULCA.

- Este resultado tiene una vigencia de 12 meses cumpliendo con los estándares en la norma ASME B 30.23, Covenin, ASME Secc V, Especificación técnica del fabricante.
- Este certificado perderá vigencia una vez cumplido su fecha de próxima verificación, o cuando en el equipo ocurran las siguientes.

1. Evidencia de daños visible, defectos relevantes y deformaciones que puedan efectuar las funciones y condiciones de uno o más de sus sistema mecánicos estructurales.
2. Cuando el equipo haya sido sometido a sobre carga o haya estado involucrado en un accidente operacionales.
3. Cuando el equipo sea modificado, alterado o sea sometido a una reparación no autorizada por el fabricante.

INSPECTOR(ES):	Ing. Javier Rodríguez Nivel II	**FECHA:** 02/11/2024	**FIRMA:**
COORDINADOR GENERAL:	Ing. Dalmilo Rosales Nivel II	**FECHA:** 02/11/2024	**FIRMA:**

INVERMULCA

Escaneado con CamScanner
