INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico,
Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable
para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN DE EUIPOS DE IZAMIENTO DE PERSONAL

No: I-EIP-23-004

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS **ACEPTABLES**, POR LO TANTO EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN **APTO** PARA REALIZAR OPERACIONES A LA CUAL FUE FABRICADO DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO EL EQUIPO PRESENTE DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SISTEMAS MECÁNICOS, SISTEMAS ELÉCTRICOS,, DAÑOS POR SOBRECARGAS O SE INVOLUCRE EN ACCIDENTES OPERACIONALES.

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN, CÓDIGO ASME SECCIÓN V,ASME B 30.23, PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INVERMULCA, Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO:

TIPO DE EQUIPO: PLATAFORMA PARA IZAMIENTO DE PERSONAL (MANLIFT) **MARCA:** JLG **MODELO:** 60H

CAPACIDAD: 450 kg **NO. EQUIPO:** **SERIAL:**021014-0300022330

TIPO DE MECANISMO : ELECTRICO MECANICO

PERTENECIENTE A:SAMPIERI & FORTUNATO,SA **RIF: J-070043482**

FECHA DE INSPECCIÓN: 02/11/2023 **VIGENCIA:** UN(1) AÑO **FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN:** 02/11/2024

INSPECTOR ; Ing:Javier Rodriguez
NIVEL II NDT

COORDINADOR; Ing:Dalmilo Rosales
NIVEL I NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Covenin:3117 Equipos de Izamientos Inspección
Covenin: 3174 Mantenimiento y Prueba
Covenin: 3329 Certificación de Equipos de Izamientos
Covenin: 3829 Plataforma de Elevación de personal
ASME Secc V Art 9 Visual Examination
Procedimiento Interno INVERMULCA

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN DE PLATAFORMAS PARA IZAMIENTO DE PERSONAL

IM-OP-FO-EI-07

SENCAMER

REPORTE DE INSPECCIÓN DE PLATAFORMAS PARA IZAMIENTO DE PERSONAL

1. DATOS GENERALES

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	N°. .:		Nº REPORTE	I-EDP-23-004
PROYECTO :	Inspección y certificación de plataforma de izamientos de personal					FECHA:	02/11/2023
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA CONTRATISTA					FECHA DE VIGENCIA	02/11/2024
OBJETIVO: Determinar las condiciones de operación, conformidad, seguridad del equipo y de esta forma establecer las acciones de mantenimiento.							

2. DATOS ESPECÍFICOS:

NO. EQUIPO:	ELEVADOR DE PERSONAL MANLIFT	CAPACIDAD (KG.):	450 Kg
FABRICANTE: JLG	AÑO:1995	MODELO / TIPO:	60H
TIPO DE EQUIPO: ELECTRICO - HIDRAULICO		SERIAL:	021014-0300022330

3.-CONDICIONES CUALITATIVAS

ELEMENTO	BC	MC	CONDICIONES OBSERVADAS
1.- ESTRUCTURA			Pintura Ok
1.1.- Elementos Estruc. Principales	X		
1.2.- Elementos Estruc. Secundarios	X		
1.3.- Base/ Chasis	X		
1.4.- Rodapiés	X		
1.5.- Pasamanos	X		
1.6.- Puerta	X		
1.7.- Pasadores y gatos	X		
1.8.- Pivote	X		
1.9.- Estabilizadores			No se observo
1.10.- Placa de Identificación	X		
1.11-Motor	X		
1.12-Cabina del operador	X		
1,13-Barandas	X		
1.14-Rodapie	X		
1.15-sistema de potencia	X		
1.16-Instrumentos	X		
1.17-Sistema Eléctricos	X		
1.18-Cadena del Mástil			No Aplica
1.19- Ruedas guías torre de elevador			No aplica
1.20- Mástil	X		2 Extensiones

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN DE PLATAFORMAS PARA IZAMIENTO DE PERSONAL

IM-OP-FO-EI-07

SENCAMER

1.21-cauchos	X		operativo
2.- ACCESORIOS DE IZAMIENTO			
2.3- Interruptor limitador	X		
2.4-Botonera	X		
2.5-Sistema Hidráulico	X		
2.6-Inteructor Principal	X		
2,7-Bloqueador	X		
2.8 Cajera Eléctricas	X		

Leyenda:

BC: Buenas Condiciones	**MC:** Malas Condiciones	**S/I:** Sin Inspección	**S/A:** Sin Acceso	**N/T:** No tiene	**N/A:** No aplica

PRUEBA DE CARGA


SE REALIZÓ LA PRUEBA: ■ SI NO ☐ INFORME ANEXO ■

CODIGO DE REFERENCIA

Covenin:3117 Equipos de Izamientos Inspección
Covenin: 3174 Mantenimiento y Prueba
Covenin: 3329 Certificación de Equipos de Izamientos
Covenin: 3829 Plataforma de Elevación de personal
ASME Secc V Art 9 Visual Examination
Procedimiento Interno INVERMULCA

CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTA: ■	NO APTA: ☐

REFERENCIAS FOTOGRÀFICAS DE LA INSPECCIÓN.

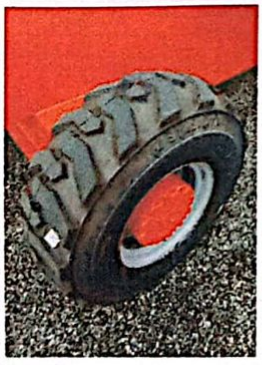





INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN DE PLATAFORMAS PARA IZAMIENTO DE PERSONAL

IM-OP-FO-EI-07

SENCAMER

RECOMENDACIONES	
ELEMENTOS	**ACCIONES**
1.	Mantenimiento preventivo

OBSERVACIONES:

Se sometió a prueba de operación por un periodo de 20 minuto observándose todo los componentes con resultado satisfactorios.
Norma en cuestión; Covenin:3117 Equipos de Izamientos Inspección ,Covenin: 3174 Mantenimiento y Prueba ,Covenin: 3329 Certificación de Equipos de Izamientos ,Covenin: 3829 Plataforma de Elevación de personal ,ASME Secc V Art 9 Visual Examination
Procedimiento Interno INVERMULCA.

- Este resultado tiene una vigencia de 12 meses cumpliendo con los estándares en la norma ASME B 30.23, Covenin, ASME Secc V, Especificación técnica del fabricante.
- Este certificado perderá vigencia una vez cumplido su fecha de próxima verificación, o cuando en el equipo ocurran las siguientes.

1. Evidencia de daños visible, defectos relevantes y deformaciones que puedan efectuar las funciones y condiciones de uno o más de sus sistema mecánicos estructurales.
2. Cuando el equipo haya sido sometido a sobre carga o haya estado involucrado en un accidente operacionales.
3. Cuando el equipo sea modificado, alterado o sea sometido a una reparación no autorizada por el fabricante.

INSPECTOR(ES):	Ing. Javier Rodríguez	**FECHA:** 02/11/2023	**FIRMA:**
COORDINADOR GENERAL:	Ing. Dalmilo Rosales	**FECHA:** 02/11/2023	**FIRMA:** INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A

Escaneado con CamScanner
