INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico,
Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable
para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SENCAMER

APTO

EQUIPO SF6-GAS SUPER LIQUEFACTION SYSTEM
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
No: I-E-CSF6-24-004

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ***ACEPTABLES****, POR LO TANTO EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN* ***APTO*** *PARA REALIZAR OPERACIONES A LA CUAL FUE FABRICADO DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO EL EQUIPO PRESENTE DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SISTEMAS MECÁNICOS, SISTEMAS ELÉCTRICOS,, DAÑOS POR SOBRECARGAS O SE INVOLUCRE EN ACCIDENTES OPERACIONALES.*

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN, CÓDIGO ASME SECCIÓN VIII, PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INVERMULCA, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO:

TIPO DE EQUIPO: **SF6-GAS SUPER LIQUEFACTION SYSTEM** *MODELO:* SLR-600-06

SERIAL L2370XW1200XH1900

EQUIPO N: No se observo UBICACIÓN: PATIO DE LA EMPRESA (PLANTA ELECTRICA) POWER: AC208V/3PH/60H_Z/23K_W

FABRICANTE: WOOSUNG VACUUM TECHNOLO

*NORMAS Y CÓDIGOS APLICADOS:*COVENIN 1926., 3049 , NORMA INTERNACIONAL D.O.T MC-307 ,ASME

PERTENECIENTE A: SAMPIERI & FORTUNATO,SA *RIF:* J-070043482

FECHA DE INSPECCIÓN: 17/12/2024
VIGENCIA: seis(6) meses *FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN:* 17/06/2025

INSPECTOR ; Javier Rodriguez
NIVEL II NDT

COORDINADOR: Damilo Rosales
NIVEL II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

FIS-0021-006/VT-027-2022 / UT - 029-2022 / PT 038-2022
I-CSF$_6$-24.004

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SF6-GAS SUPER LIQUEFACTION SYSTEM

REPORTE DE INSPECCIÓN

1. DATOS GENERALES

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF NI	J-070043482	EQUIPO:		Nº REPORTE	I-CSF$_6$-24.004
PROYECTO:	MANTENIMIENTO		No. INTERNO: No se Observo			FECHA:	17/12/2024
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA EMPRESA (PLANTA ELECTRICA)					FECHA FINAL; 17/06/2025	

2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

SERIAL: SLR1032	MARCA: WOOSUNG VACUUM TECHNOLO	POWER: AC208V/3PH/60Hz/23Kw
MODELOSLR-600-06	TIPO: VACUUM	AÑO:2010
SIZE: L2370XW1200XH1900	MAX,PREPRSION :35KGF/CM^2	
	COLOR: AZUL	CAP.LIQ: 600L

cc

3. CONDICIONES CUALITATIVAS

ELEMENTO	B/C	M/C	CONDICIONES OBSERVADAS
.- CONDICIONE GENERALES			
3.1.-. Cabina,	X		Se realizó Inspección visual con resultado satisfactorio
3.2.- Chasis	X		Se realizó Inspección visual con resultado satisfactorio
3.3.- Sistema	X		Se Observó en condiciones operativas
3.4.- Controles.	X		Se realizó prueba de operación
3.5.- Mangueras / Conexiones.	X		Se realizó prueba de operación en condiciones normales
.SISTEMA ELÉCTRICOS	**B/C**	**M/C**	**CONDICIONES OBSERVADAS**
3.6- Estado de Instructores,	X		Se realizó prueba de Inspección,
3.7..Estado de panel de Instrumentos de medición y cableado de control	X		Se observó en condiciones operativas
3.8.- Estado de cableado de potencia	X		Se realizó prueba de Inspección
3.9.-.Estado de grapa ,cable puesta a tierra y conexión en metal limpio	X		Revisar cada vez que se coloque a tierra o cuando el equipo se cambie de lugar
3.10.-.Estado de LA REGLETAS DE LOS CABLES	X		Se observó en sitio , operativo E Identificado
SISTEMA MECÁNICO	**B/C**	**M/C**	**CONDICIONES OBSERVADAS**
3.11.-Fuga en el sistema	X		Se realizó prueba de Inspección NO se observo
3.12.- Fuga en el sistema de lubricación. En motor	X		Se realizó prueba de operación
3.13.-.Fuga en el sistema	X		Se realizó prueba de Inspección

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SF6-GAS SUPER LIQUEFACTION SYSTEM

3.14. Fijación de los componentes electromecánicos.	X		Se realizó prueba de Inspección
3.15 Pintura	X		Pintar pulmón principal parte interna
3.16,,	X		Se verifico en sito con resultado satisfactorios
3,17 Válvula Alivio	X		Ver Reporte I-VA-24-004
3.18 Estado de extintores	X		Se mantuvo en sitio
31.9 pulmón principal	X		Se Observó Operativa ,se le realizo medición de espesores ,pintar parte interna

LEYENDA:

B/C: Buenas Condiciones	**M/C:** Malas Condiciones	**S/I:** Sin Inspección	**S/A:** Sin Acceso	**N/T:** No tiene	**N/A:** No aplica

SE REALIZO PRUEBA OPERATIVA

SE REALIZÓ LA PRUEBA: SI ■ NO ☐

CONCLUSIONES

Se sometió a prueba de operación por un periodo de 30 minuto observándose todo los componente tales como tacómetros, manómetros, indicadores de niveles ,mangueras, conexiones y sistema eléctricos todo con resultado satisfactorios ,
Norma en cuestión; COVENIN 1926. COVENIN 3049. NORMA INTERNACIONAL D.O.T MC-307
ACERO A-36,

CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO: **APTA:** ■ NO APTA: ☐

REFERENCIAS FOTOGRÀFICAS DE LA INSPECCIÓN.

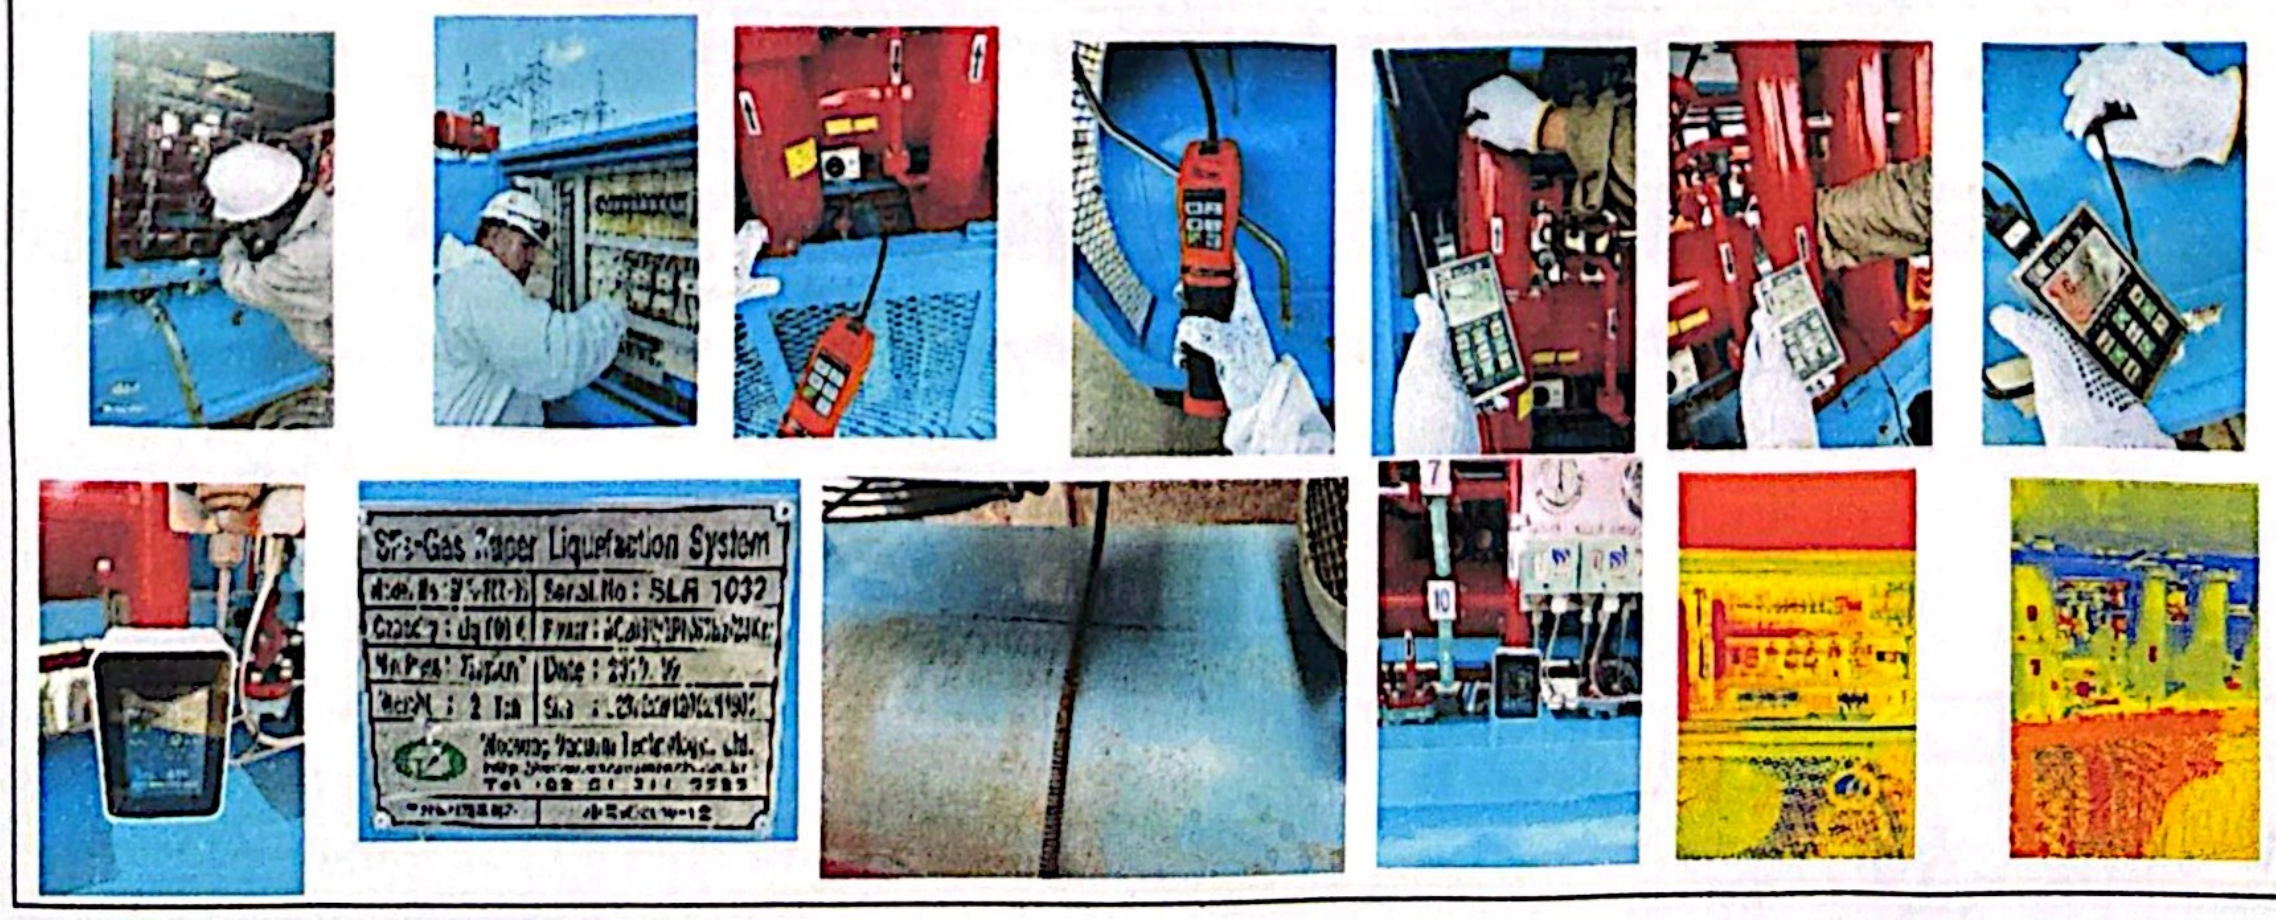

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SF6-GAS SUPER LIQUEFACTION SYSTEM

CONDICIÓN DE PRUEBA OPERATIVA			
PRUEBA	**B/C**	**M/C**	**CONDICIONES OBSERVADAS**
Sistema de fugas en válvulas	X		Se sometió a prueba comportándose según condiciones normales

Lectura del cabezal derecho	LECTURA DEL CUERPO				Lectura del cabezal izquierdo
4,50	A	B	C	D	4.44
4,33,	3,53	3,48	3,56	3,55	4.55
4,40	3,51	3,52	3,55	3,53	4.40
4,33	3,53	3,54	3,51	3,51	4.44

Sistema de fugas tuberías	X		Se sometió a prueba comportándose según condiciones normales
Sistema eléctrico	X		Se sometió a prueba comportándose según condiciones normales
Sistema de instrumentación			Se sometió a prueba comportándose según condiciones normales

ELEMENTOS	ACCIONES
Tanque principal	Realizar pintura parte se observa con puntos de corrosión moderado.
Mangueras	Realizar inspección para detectar cualquier anomalía que perjudique el funcionamiento
Conexiones	Realizar inspecciones a las juntas y verificar sistema de seguridad.

OBSERVACIONES:
Esta certificación tiene valides por seis meses Si el equipo es sometido a un mantenimiento que afecte elemento críticos se debe de recertificar I-E-CSF6-24-004

INSPECTOR (ES):	Ing. Javier Rodríguez NIVEL II NDT	FECHA: 17/12/2024	FIRMA:
Coordinador Operaciones:	Ing. Dalmilo Rosales NIVEL II NDT	FECHA: 17/12/2024	FIRMA:

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
