SONOTEST

J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

CISS: IN26S12CBB

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO DE CARGA

EQUIPO APTO

Propietario:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.		
Equipo No.:	02	**Cód. Sonotest:**	185002045006-SF-MON-002
Tipo:	GRÚA MONORIEL	**Fecha de Inspección:**	05/02/2026
Serial:	SF-MON-002	**Fecha de Vencimiento:**	05/02/2027
Marca:	N/REPORTADO	**Capacidad Nominal:**	3.000 KGS
Modelo:	GCT610	**Cap. Trabajo Seguro:**	3.000 KGS

De acuerdo al informe de inspección No.: 067-050226-02 de Fecha: 06/02/2026 el equipo se encuentra 'APTO' para operar dentro de las condiciones y parámetros establecidos en las tablas de carga, recomendaciones suministradas por el fabricante y especificaciones del equipo inspeccionado.

Observaciones: NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL MONORRIEL 3.000 KGS (3 TON).

Lugar de Insp.: BOMBAS CENTRÍFUGAS, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO-ZULIA.

INSPECTOR	RESPONSABLE TECNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SÁNCHEZ
FIS-0023-003	FIS-0023-002	REPRESENTANTE
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

Número del Documento: S-7229-B

SONOTEST

J-07049150-7

Organismo de Inspección
Gerencia de Operaciones (Ciudad Ojeda)
Coordinación de Operaciones
(IEI, IEP, EQP, END, MQS)

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No. OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

No. Certificado: CO-06-02-26-02

CISS: IN26S12CBB

CERTIFICADO DE EQUIPO DE IZAMIENTO DE CARGA
INSPECCIÓN DE GRÚA MONORIEL

El equipo abajo identificado ha sido inspeccionado de acuerdo a las Normas:
ASME B30.11 PDVSA CAP 14 COV 3510-1999 y Procedimientos Sonotest, S.A. IEI-MA-01

Código Sonotest: 185002045006-SF-MON-002
Propietario: SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.
Tipo de Equipo: GRÚA MONORIEL
Subtipo: VIGA H
No. del Equipo: 02
Fabricante: N/REPORTADO
Capacidad Nominal: 3.000 KGS
Modelo: GCT610
Serial: SF-MON-002
Año de Fab.: S/I

CONDICIONES DEL EQUIPO CERTIFICADO
de Líneas: N/A **Cap. del Bloque:** N/A **Cap. Trabajo Seguro:** 3.000 KGS

CARACTERISTICAS DEL CABLE DE ACERO
Diámetro (mm): N/A **Clasificación:** N/A **Factor de Seguridad:** N/A
Resist. Ruptura: N/A **Clase/Grado:** N/A **Arrollado:** N/A

CARACTERISTICAS DEL MALACATE (PRINCIPAL)
Marca: N/A **Modelo:** N/A **Año:** N/A
Serial: N/A **Potencia:** N/A

CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA PLUMA
Marca: N/A **Modelo:** N/A **Año:** N/A
Capacidad Nominal: N/A **Altura:** N/A **Longitud:** N/A
Serial: N/A

De acuerdo al informe de inspección Nº: 067-050226-02 de Fecha: 06/02/2026 el equipo se encuentra 'APTO' para operar dentro de las condiciones y parámetros establecidos en las tablas de carga, recomendaciones suministradas por el fabricante y especificaciones del equipo inspeccionado.

Observaciones: NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL MONORRIEL 3.000 KGS (3 TON).

Lugar de Insp.: BOMBAS CENTRÍFUGAS, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO-ZULIA.

Fecha de Inspección: **Inicio:** 05/02/2026 **Culminación:** 05/02/2026

Fecha de Vencimiento: 05/02/2027

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SÁNCHEZ
FIS-0023-003	FIS-0023-002	REPRESENTANTE
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF J-07049150-7

Nota: 1.- Este certificado no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo 2.- Este certificado pierde validez al cumplirse la fecha de vencimiento o cuando el equipo se involucre en un accidente de cualquier naturaleza. En los equipos móviles debe considerarse su reinspección, para asegurar su operabilidad, cuando: 1) Se efectúen modificaciones al diseño, 2) Exista duda sobre su condición, 3) Se haya hecho un traslado

Número del Documento: **S-7229-B**

Calle Campo Elías Nº. 122-A, Ciudad Ojeda, Estado Zulia, Venezuela. Telef. (0265) 6628329 / 6315272; Móvil (0414) 6481361 / 6185934.
Página Web: www.sonotest.com, e-mail: sonotest@sonotest.com

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO
GRÚA MONORRIEL O GANTRY

FECHA DEL INFORME:	6 de febrero de 2026	**INFORME N°:**	067-050226-02

PROPIETARIO:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)				
LUGAR:	BOMBAS CENTRÍFUGAS, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO. ZULIA.				
EQUIPO No:	**02**	**SERIAL:**	SF-MON-002	**CAP. NOMINAL:**	3.000 KGS
MODELO:	GCT610	**TIPO:**	GRÚA TIPO MONORRIEL	**SUB-TIPO:**	VIGA "H"
MARCA:	N/R	**AÑO:**	S/I	**FABRICANTE:**	N/R
CAPACIDAD NOMINAL (S.I.):	3.000 KGS	**CAPACIDAD DE TRABAJO SEGURO (S.I.):**			3.000 KGS
FECHA DE INICIO DE INSPECCIÓN:	05/01/2026	**FECHA DE CULMINACIÓN DE INSPECCIÓN :**			05/01/2026
NORMAS APLICABLES:	ASME B30,11 / PDVSA CAP. 14 / COVENIN 3510-1999	**PROCEDIMIENTO SONOTEST:**			IEI-MA-01



GRÚA MONORRIEL O GANTRY

OBSERVACIONES

- EL MONORRIEL **ESTÁ APTO** PARA REALIZAR TRABAJOS DE IZAMIENTO.
- NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL MONORRIEL **3.000 Kgs (3 ton).**
- REVISAR DIARIAMENTE EL MONORRIEL POR PARTE DEL OPERADOR Y CUALQUIER ANORMALIDAD PASARLA POR ESCRITO AL CUSTODIO, EL CUAL DEBERÁ TOMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS.
- REALIZAR EL MANTENIMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
- EL MONORRIEL NO TIENE INSTALADO GRÚA (SEÑORITA), SOLO TIENE INSTALADO UN TROLLEY DE 3 TON, SERIAL: 10010267
- EL MONORRIEL ES UTILIZADO ÚNICAMENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS.

Los resultados de la inspección corresponden exclusivamente al equipo:
MARCA: N/R SERIAL N°: SF-MON-002
El cual ha sido inspeccionado de acuerdo con los procedimientos de inspección de SONOTEST, S. A., las normas PDVSA, COVENIN, ASME / ANSI Serie B30 y API RP aplicables y se encuentra en condición: CONFORME

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): IN26S12CBB

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

DATA HISTÓRICA DEL EQUIPO

Verificar el historial del equipo relacionado con:

N° Renglón	Descripción	Condición
1	Record de Inspecciones	Presenta y está actualizado
2	Record de Modificaciones del Elevador	No presenta
3	Record de Modificaciones	Presenta y está actualizado
4	Reportes Ensayos de Carga al Monorriel	Presenta y está actualizado
5	Manual de Operaciones	No presenta

OBSERVACIONES

- El monorriel tiene inspección y pruebas realizadas anteriormente.
- La empresa SAMFOR, suministró la documentación requerida.

CONTROLES (Procedimiento IEI-PI-12)

N° Renglón	Descripción	Condición
6	Cadena de Control	No aplica
7	Mando de Control Eléctrico	No aplica
8	Cable del Mondo de Control	No aplica

OBSERVACIONES

- El equipo (monorriel) es controlado desde el piso por un control manual de cadena, para izar y trasladar la carga.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (Procedimiento IEI-PI-18)

N° Renglón	Descripción	Condición
9	Topes del Carro	Buenas condiciones
10	Limitador de Recorrido	Buenas condiciones
11	Dispositivos Anti-Two Block	No aplica
12	Dispositivos de Advertencia	No aplica
13	Conexiones Eléctricas	No aplica

OBSERVACIONES

- El monorriel utiliza un trolley manual, por lo cual no presenta dispositivos de seguridad.

CARRO O TROLLEY (Procedimiento IEI-PI-10)

N° Renglón	Descripción	Condición
14	Marca: **TOYO CHAIN** Capacidad: **3.000** KGS	Buenas condiciones
15	Ejes y Pasadores	Buenas condiciones
16	Ruedas	Buenas condiciones
17	Tapas	Buenas condiciones
18	Transmisión / Engranajes	No aplica
19	Alineación con la Viga	Buenas condiciones
20	Topes / Parachoques	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El trolley presenta buenas condiciones.
- El pasador del trolley estaba ensamblado al momento de la inspección.
- Descripción del trolley: Marca: **TOYO CHAIN** Modelo: **GCT610** Serial: **10010267** Capacidad: **3** ton.

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

ELEVADOR DE CARGA (Procedimientos IEI-PI-05 / IEI-PI-08)		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
21	Ranura / Poleas	No aplica
22	Motor	No aplica
23	Poleas Ecualizadoras	No aplica
24	Frenos Aire: Eléctricos: Mecánicos:	No aplica
25	Caja de Engranajes	No aplica
26	Tambor o Polea de Engranaje	No aplica
27	Ranuras del Tambor	No aplica
28	Frenos del Sistema de Carga (Subir-Bajar)	No aplica
29	Tornillos de Sujeción y Soportes	No aplica
30	Soporte	No aplica
31	Otros	No aplica

OBSERVACIONES

- El monorriel no tiene instalado equipo de izamiento.

ESTRUCTURA DE IZAMIENTO (Procedimiento IEI-PI-13)		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
32	Estructura Soporte de Monorriel	Buenas condiciones
33	Sistema de Fijación de la Estructura	Buenas condiciones
34	Soldaduras o Pernos de Fijación de la Estructura	Buenas condiciones
35	Viga Monorriel Tipo: **VIGA "H"** Capacidad de Carga: **3.000** KGS	Buenas condiciones
36	Fijación de la Viga a la Estructura	Buenas condiciones
37	Topes del Carro	Buenas condiciones
38	Alineación de la Viga	Buenas condiciones
39	Soldaduras o Pernos de Unión Columna / Viga	Buenas condiciones
40	Resultados del END	No aplica
41	Marcaje de la Capacidad del Monorriel	Personalizar comentario

OBSERVACIONES

- La viga monorriel presenta buenas condiciones.
- La viga tiene pintado la capacidad de carga de la estructura.
- Descripción de la viga monorriel: Viga tipo: **"H"** Alma: **24,0** cm Ala: **23,0** cm Altura: **3,6** mt Longitud (luz ó flecha): **5,8** mt Cap.: **3,0** ton Año: **S/I** Marca: **N/R** S/N: **SF-MON-001**

INSPECCIÓN DE CABLES (Procedimiento IEI-PI-07)

N° Renglón	Descripción							Condición
42	**Aplicación**	**Diámetro**	**Clasificación**	**Clase/ grado**	**Resist. Ruptura**	**Factor de Seguridad**	**Arrollado**	
42.1	**Principal**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica
42.2	**Auxiliar**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica
42.3	**Otros**							

EQUIPOS DE MEDICIÓN

GALGAS PARA POLEAS	CÓDIGO: **N/A**	FECHA DE CALIBRACIÓN:	**N/A**
VERNIER	CÓDIGO: **N/A**	FECHA DE CALIBRACIÓN:	**N/A**

OBSERVACIONES

- El equipo no utiliza cable de acero.

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

INSPECCIÓN DE LA CADENA (Procedimiento IEI-PI-10)								
N° Renglón	Descripción							Condición
43	Aplicación	Diámetro	Clase/ grado	Long. del Eslabón	Ancho del Eslabón	Eslabones 10/20	Capacidad	
43.1	Principal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Personalizar comentario
43.2	Auxiliar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Personalizar comentario
43.3	Otros							

EQUIPO DE MEDICIÓN			
VERNIER	CÓDIGO:	GE-I017-53	FECHA DE CALIBRACIÓN: 3-9-20225

OBSERVACIONES

- El monorriel no tiene equipo de izamiento asignado.

GANCHO Y BLOQUE DE CARGA (Procedimiento IEI-PI-03 / IEI-PI-10)					
N° Renglón	Descripción				Condición
44	Capacidad:	KGS	MARCA		No Aplica
45	Peso	KGS	SERIAL		No Aplica
46	Poleas				No Aplica
46.1	Número de Poleas:		Diámetro de Poleas:		No Aplica
46.2	Diámetro de la Ranura:				No Aplica
47	Tapas				No Aplica
48	Pasadores o Ejes				No Aplica
49	Retenedores / Ojales				No Aplica
50	Uña de Seguridad				No Aplica
51	Torcedura 0°				No Aplica
52	Abertura de Garganta ≤ 5% o 1/4"		Lectura:	mm	No Aplica
53	Desgaste ≤ 10%		Capacidad:	kg	No Aplica
54	Marca:		Serial N°:		No Aplica

OBSERVACIONES

- El monorriel no tiene equipo de izamiento asignado.

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

CÁLCULOS DEL LÍMITE DE TRABAJO SEGURO								
SEGÚN CAPACIDAD DEL CABLE O CADENA DE IZAMIENTO								
N° Renglón	Descripción							
55	Aplicación	Resist. Ruptura		Factor de Seguridad	N° de líneas	Límite de trabajo seguro		Límite de trabajo seguro (S.I.)	
55.1	Cable Principal	N/A		N/A	N/A	N/A	KGS	N/A	KGS
56	Aplicación	CAPACIDAD			N° de líneas	Límite de trabajo seguro		Límite de trabajo seguro (S.I.)	
56.1	Cadena Principal	N/A		N/A	N/A	N/A	KGS	N/A	KGS
SEGÚN CAPACIDAD DE LOS GANCHOS								
N° Renglón	Descripción							
57	Aplicación	Capacidad de carga			Capacidad de carga (S.I.)			
57.1	Gancho Principal	3.000		KGS	3.000		KGS	
58	Límite de trabajo seguro del equipo Sist. Principal				Límite de trabajo seguro del equipo Sist. Principal (S.I.)			
58.1	3.000				3.000		KGS	

RECOMENDACIONES

1.- Realizar inspecciones periódicas al monorriel de carga, y proceder a su reemplazo al momento de presentar deformación, desgaste o torceduras, según la ASME B30.11, 16 y 21.
2.- Mantener en buenas condiciones de legibilidad las indicaciones de capacidad del trolley.
3.- Mantener en buenas condiciones de pintura la estructura de las columnas y monorriel.
4.- Mantener en buenas condiciones los topes del trolley, los mismos deben estar a cada extremo de la viga monorriel.
5.- Revisar periódicamente el monorriel por parte del operador y cualquier anormalidad pasarla por escrito al custodio, el cual deberá tomar las acciones correctivas.
6.- Realizar el mantenimiento preventivo del equipo según especificaciones del fabricante.
7.- El monorriel no tiene equipo de izamiento instalado o asignado, se coloca una grúa de cadena al momento de ser utilizado.
8.- El monorriel tiene instalado únicamente un trolley (carro) de tres (3) toneladas.
9.- Se debe pintar en sitio visible y a cada lado de la viga la capacidad de carga y código de identificación.
10.- Realizar inspecciones periódicas a las ruedas del trolley por parte del personal de mantenimiento, y realizar ajustes a las mismas para mantenerla con la distancia correspondiente a las vigas.
11.- Programar a mediano plazo el reemplazo del pasador principal del trolley, el pasador actual presenta óxido y corrosión leve en la rosca, se debe utilizar otro pasador de igual diámetro y longitud que cumpla con las especificaciones del fabricante.
12.- El monorriel está apernado a las vigas/columnas de soporte, por lo cual se debe programar el mantenimiento de los mismos.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7967958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST
RIF J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SONOTEST

REVISION TECNICA	REVISION ADMINISTRATIVA
Firma	Firma
Conforme: SI ☑ NO ☐	Conforme: SI ☑ NO ☐
Fecha 06 / 02 / 2026	Fecha 06 / 02 / 2026

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

GRÚA MONORRIEL O GANTRY

PRUEBA DE CARGA (Procedimiento IEI-PI-17)					
PROPIETARIO:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**CAPACIDAD:**	3.000	KGS	
LUGAR:	BOMBAS CENTRIFUGAS, TERMOELECTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO. ZULIA.	**TIPO:**	GRÚA TIPO MONORRIEL		
MARCA:	N/R	**SUB-TIPO:**	VIGA "H"		
MODELO:	GCT610	**AÑO DE FABRICACIÓN:**	S/I		
FABRICANTE:	N/R	**FECHA DE PRUEBA:**	5/1/2026		
NÚMERO DE CABLES:	N/A	**DIAMETRO:**	N/A	mm = Inch	N/A
SERIAL:	SF-MON-002	**CLASIFICACIÓN:**	N/A		

PLUMA PROBADA	LONGITUD DEL MONORRIEL	CAPACIDAD NOMINAL	CARGA DE PRUEBA	% DE CARGA	TIEMPO DE PRUEBA	RESULTADOS
PRINCIPAL	5,80 Mts	3.000 Kgs	3.200 Kgs	107%	25 Min	Satisfactorio
AUXILIAR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Personalizar comentario

EQUIPO DE MEDICIÓN Y ENSAYO					
DINAMÓMETRO N°:	IEI-I031-08	**MARCA:**	DILLON	**MODELO:**	10inDINA
SERIAL:	D-22157	**RANGO:**	0-10.000 KG	**FECHA DE CALIBRACIÓN:**	18/3/2025

MASA DE PRUEBA				
TIPO DE MASA:	PUNTO DE ANCLAJE	**PESO:**	3.200	Kgs


OBSERVACIONES


- EL MONORRIEL ESTÁ APTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE IZAMIENTO.
- NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL MONORRIEL **3.000 KGS**
- SE REALIZÓ PRUEBA DE CARGA, APLICANDO TENSIÓN SOBRE UN PUNTO DE ANCLAJE.
- SE UTILIZÓ PARA LA PRUEBA DE CARGA UNA GRÚA DE CADENA (señorita) DE 5 TON, DEBIDAMENTE CERTIFICADA.
- SE UTILIZÓ PARA VERIFICAR LA PRUEBA UN DINAMÓMETRO DE 10 TON, CERTIFICADO POR SENCAMER.
- LA PRUEBA DE CARGA SE REALIZÓ A LA CAPACIDAD LÍMITE DEL MONORRIEL.
- SE VERIFICÓ LA DEFLEXIÓN DEL MONORRIEL CON LA CARGA EN EL CENTRO DEL MISMO.
- EL MONORRIEL ES UTILIZADO ÚNICAMENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

ESQUEMA Y GRÁFICO DE LA PRUEBA DE CARGA

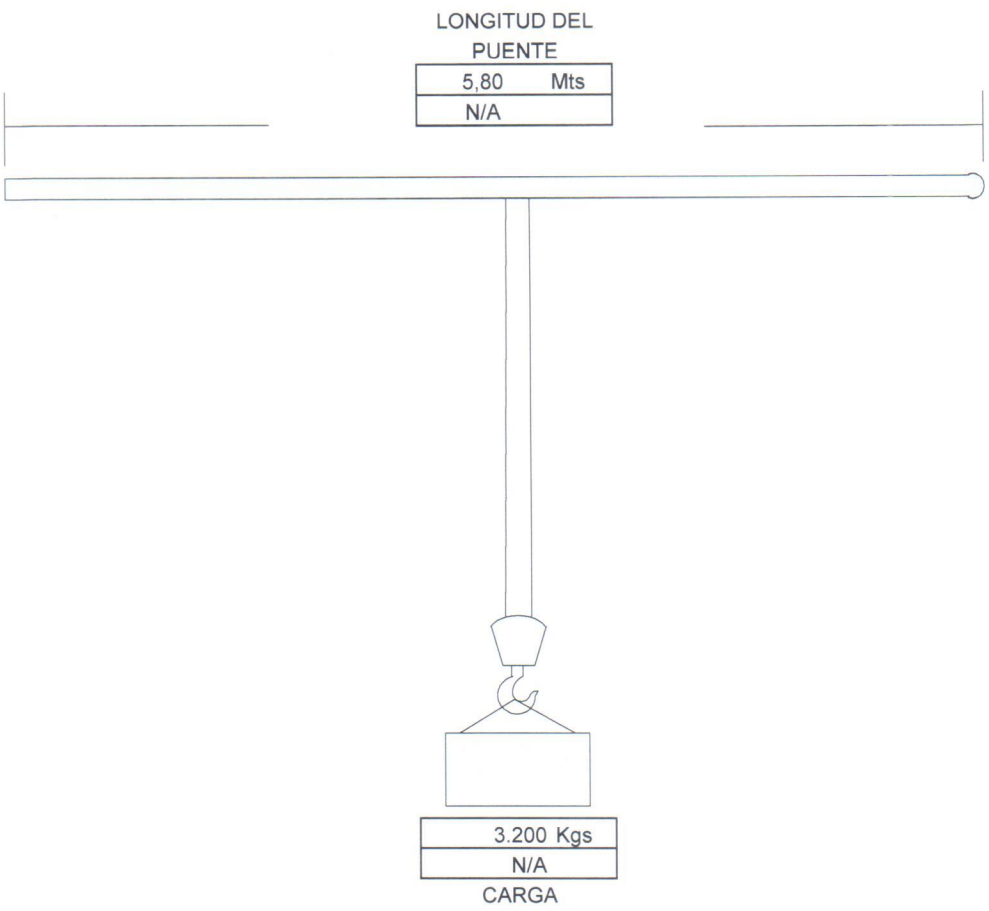

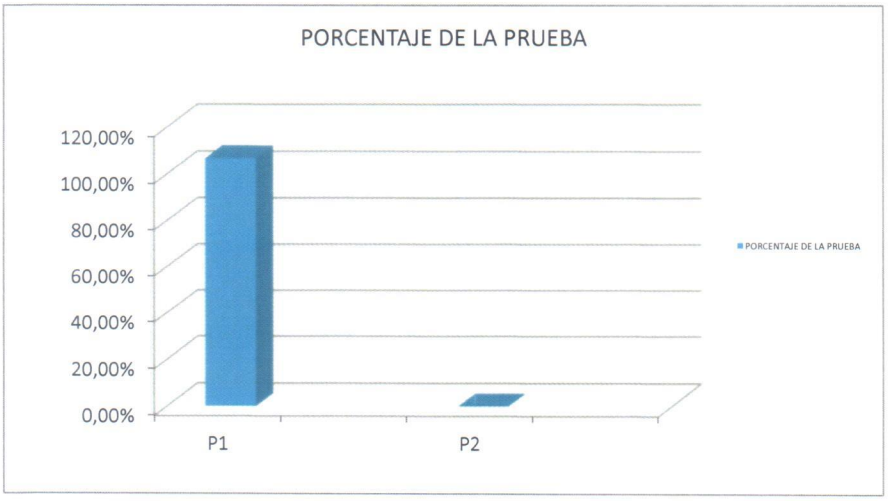

PRUEBA N°	P1	P2
PORCENTAJE	**107%**	N/A

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

VISTA DEL TROLLEY DE CARGA



VISTA GENERAL DEL MONORRIEL



VISTA DE LA UBICACIÓN DEL MONORRIEL




VISTA DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL TROLLEY



VISTA DE LA PRUEBA DE CARGA APLICADA AL EQUIPO





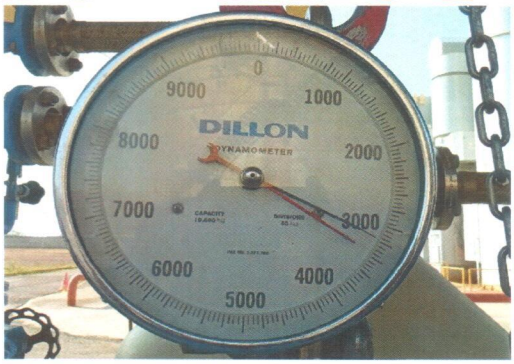

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO
GANCHOS

FECHA DEL INFORME	6/2/2026
FECHA DE INSPECCIÓN	5/1/2026

INFORME Nº	067-050226-02

CLIENTE	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**INFORMACIÓN DEL GANCHO**	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO		**MARCA**	PLAIN TROLLEY
MARCA	N/R	**MODELO**	GCT610
MODELO	GCT610	**SERIAL**	10010267
SERIAL	SF-MON-002	**CAPACIDAD**	3.000 KGS

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO: **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO	MT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	LIMPIA Y PULIDA

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				**MATERIALES**	
TIPO	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	23/7/2025	**COLOR**	NEGRAS/CONT. BLANCO
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I017-53	**LIMPIADOR**	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I010-84	**PENETRANTE**	N/A
TIPO	N/A	**CÓDIGO/SERIAL**	N/A	**REVELADOR**	N/A

NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME V, ART. VII. / ASME B30.10 / PDVSA CAP. 14 / COVENIN 3212-1996

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS AL OJAL DE CARGA DEL TROLLEY No. **10010267** DE CAPACIDAD **3.000** KG. OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.

OBSERVACIONES

- EL TROLLEY **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO.
- NO SE DETECTARON DISCONTINUIDADES EN EL ÁREA DONDE SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN.

RECOMENDACIONES

1.- UTILIZAR ADECUADAMENTE PARA EVITAR DAÑOS MECÁNICOS.
2.- REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS, CON EL FIN DE DETECTAR GRIETAS, DEFORMACIÓN Y DESGASTE, SEGÚN NORMA APLICABLE.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	ASISTENTE
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE:
NIVEL: II	NIVEL: II	NIVEL:
FECHA: **6/2/2026**	FECHA: **6/2/2026**	FECHA:
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia.Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.
