SONOTEST

J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

CISS: IN25S1C816

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO DE CARGA

EQUIPO APTO

Propietario:	PETROBOSCAN, S.A.		
Equipo No.:	S/N	**Cód. Sonotest:**	234007012004-HLW25869
Tipo:	GRUA PUENTE	**Fecha de Inspección:**	06/08/2025
Serial:	HLW25869	**Fecha de Vencimiento:**	06/08/2026
Marca:	R & M	**Capacidad Nominal:**	15.000 KGS
Modelo:	SX50610150P55FDN0F	**Cap. Trabajo Seguro:**	15.000 KGS

De acuerdo al informe de inspección No.: 067-060825-02 de Fecha: 07/08/2025 el equipo se encuentra 'APTO' para operar dentro de las condiciones y parámetros establecidos en las tablas de carga, recomendaciones suministradas por el fabricante y especificaciones del equipo inspeccionado.

Observaciones:	NO EXCEDER EL LIMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO 15.000 KG.
Lugar de Insp.:	GALPON DE MECÁNICA, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO-ZULIA.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SÁNCHEZ
FIS-0023-003	FIS-0023-002	REPRESENTANTE
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

Número del Documento: S-7151-B

SONOTEST

J-07049150-7

Organismo de Inspección
Gerencia de Operaciones (Ciudad Ojeda)
Coordinación de Operaciones
(IEI, IEP, EQP, END, MQS)

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

No. Certificado: CO-06-08-25-02

CISS: IN25S1C816

CERTIFICADO DE EQUIPO DE IZAMIENTO DE CARGA
INSPECCIÓN DE GRUA PUENTE

El equipo abajo identificado ha sido inspeccionado de acuerdo a las Normas:
ASME B30.2 PDVSA CAP 14 COVENIN 3510-99 y Procedimientos Sonotest, S.A. IEI-MA-01

Código Sonotest: 234007012004-HLW25869
Propietario: PETROBOSCAN, S.A.
Tipo de Equipo: GRUA PUENTE
Subtipo: ELECTRICA
No. del Equipo: S/N
Fabricante: R & M
Capacidad Nominal: 15.000 KGS
Modelo: SX50610150P55FDN0F
Serial: HLW25869
Año de Fab.: 2011

CONDICIONES DEL EQUIPO CERTIFICADO
de Líneas: 2 **Cap. del Bloque:** 15.000 KGS **Cap. Trabajo Seguro:** 15.000 KGS

CARACTERISTICAS DEL CABLE DE ACERO
Diámetro (mm): 11,00 **Clasificación:** 8 X 19 **Factor de Seguridad:** 5,0
Resist. Ruptura: 13.052 KGS **Clase/Grado:** 2160 **Arrollado:** NR

CARACTERISTICAS DEL MALACATE (PRINCIPAL)
Marca: N/A **Modelo:** N/A **Año:** N/A
Serial: N/A **Potencia:** N/A

CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA PLUMA
Marca: N/A **Modelo:** N/A **Año:** N/A
Capacidad Nominal: N/A **Altura:** N/A **Longitud:** N/A
Serial: N/A

De acuerdo al informe de inspección Nº: 067-060825-02 de Fecha: 07/08/2025 el equipo se encuentra 'APTO' para operar dentro de las condiciones y parámetros establecidos en las tablas de carga, recomendaciones suministradas por el fabricante y especificaciones del equipo inspeccionado.

Observaciones: NO EXCEDER EL LIMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO 15.000 KG.

Lugar de Insp.: GALPON DE MECÁNICA, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO-ZULIA.

Fecha de Inspección: **Inicio:** 04/08/2025 **Culminación:** 06/08/2026

Fecha de Vencimiento: 06/08/2026

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SÁNCHEZ
FIS-0023-003	FIS-0023-002	REPRESENTANTE
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF J-07049150-7

Nota: 1.- Este certificado no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo 2.- Este certificado pierde validez al cumplirse la fecha de vencimiento o cuando el equipo se involucre en un accidente de cualquier naturaleza. En los equipos móviles debe considerarse su reinspección, para asegurar su operabilidad, cuando: 1) Se efectúen modificaciones al diseño, 2) Exista duda sobre su condición, 3) Se haya hecho un traslado

Número del Documento: **S-7151-B**

Calle Campo Elías Nº. 122-A, Ciudad Ojeda, Estado Zulia, Venezuela. Telef. (0265) 6628329 / 6315272; Móvil (0414) 6481361 / 6185934.
Página Web: www.sonotest.com, e-mail: sonotest@sonotest.com

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO
GRÚA PUENTE

FECHA DEL INFORME:	7 de agosto de 2025			**REPORTE N°:**	067-060825-02
PROPIETARIO:	PETROBOSCAN, S.A.				
LUGAR:	GALPÓN DE MECÁNICA, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO. ZULIA.				
EQUIPO No:	**S/N**	**SERIAL:**	HLW25869	**CAP. NOMINAL:**	15.000 KGS
MODELO:	SX50610150P55FDN0F	**TIPO:**	GRÚA PUENTE	**SUB-TIPO:**	ELÉCTRICA
MARCA:	R&M	**AÑO:**	2011	**FABRICANTE:**	R&M
CAPACIDAD NOMINAL (S.I.):	15.000 KGS	**CAPACIDAD DE TRABAJO SEGURO (S.I.):**			15.000 KGS
FECHA DE INICIO DE INSPECCIÓN:	04/08/2025	**FECHA DE CULMINACIÓN DE INSPECCIÓN :**			06/08/2025
NORMAS APLICABLES:	ASME B30.2 / PDVSA CAP, 14 / COVENIN 3510-1999	**PROCEDIMIENTO SONOTEST:**			IEI-MA-01



GRÚA PUENTE

OBSERVACIONES

- EL EQUIPO **ESTÁ APTO** PARA REALIZAR TRABAJOS DE IZAMIENTO.
- NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO **15.000 Kg (15 ton).**
- REVISAR DIARIAMENTE EL EQUIPO POR PARTE DEL OPERADOR Y CUALQUIER ANORMALIDAD PASARLO POR ESCRITO AL CUSTODIO, EL CUAL DEBERÁ TOMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS.
- UTILIZAR OPERADORES CERTIFICADOS Y CON EXPERIENCIA COMPROBADA EN ESTE TIPO DE EQUIPO.
- REALIZAR EL MANTENIMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

Los resultados de la inspección corresponden exclusivamente al equipo:
MARCA: R&M SERIAL N°: HLW25869
El cual ha sido inspeccionado de acuerdo con los procedimientos de inspección de SONOTEST, S. A., las normas PDVSA, COVENIN, ASME / ANSI Serie B30 y API RP aplicables y se encuentra en condición: CONFORME

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): IN25S1C816

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

DATA HISTÓRICA DEL EQUIPO		
Verificar el historial del equipo relacionado con:		
N° Renglón	Descripción	Condición
1	Record de Inspecciones anteriores	Presenta y está actualizado
2	Record de Inspecciones Periódicas	Presenta y está actualizado
3	Libro de Mantenimiento Preventivo	Presenta y está actualizado
4	Reparaciones / Modificaciones	Presenta y está actualizado
5	Manual de Operaciones	Presenta y está actualizado

OBSERVACIONES

- El equipo tiene inspección anterior realizada por SONOTEST, S.A.
- La empresa SAMFOR, suministró la documentación requerida.

GENERALES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (Procedimiento IEI-PI-18)		
N° Renglón	Descripción	Condición
6	Señal de Velocidad de Carga	No presenta
7	Carta de Señales de Mano	Buenas condiciones
8	Topes del Carro	Buenas condiciones
9	Topes del Puente	Buenas condiciones
10	Indicador del Viento	No aplica
11	Dispositivo de Advertencia	Buenas condiciones
12	Pasarela	No presenta
13	Escalera y Peldaños	No presenta
14	Conexiones Eléctricas	Buenas condiciones
15	Dispositivos Anti-Two Block	Buenas condiciones
SOPORTE DE LA ESTRUCTURA (Procedimiento IEI-PI-13)		
N° Renglón	Descripción	Condición
16	Bases	Buenas condiciones
17	Rieles de la Viga	Buenas condiciones
18	Fijación del Riel / Alineación del Riel	Buenas condiciones
19	Empalme del Riel / Pasador del Riel	Buenas condiciones
20	Columnas	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El equipo no utiliza medidor de viento, la misma está instalada dentro de un galpón.
- Los dispositivos de bloqueo del gancho, están en buenas condiciones, utiliza bloqueo eléctrico.
- Las bases, columnas y los rieles se observan en buenas condiciones.

CABINA O CONTROLES DEL OPERADOR (Procedimiento IEI-PI-12)		
N° Renglón	Descripción	Condición
21	Acceso	No aplica
22	Alumbrado	No aplica
23	Extintor de Incendio	No aplica
24	Controles	Buenas condiciones
25	Ventanas	No aplica
26	Switch Maestro	Buenas condiciones
27	Mando de Control Eléctrico	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El equipo no utiliza cabina de control, es controlado desde el piso.
- La botonera presenta buenas condiciones.

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

PUENTE (Procedimiento IEI-PI-13)		
N° Renglón	Descripción	Condición
28	Limitador del Recorrido	Buenas condiciones
29	Engranaje	Buenas condiciones
30	Estructura del Puente	Buenas condiciones
31	Frenos	Buenas condiciones
32	Cubierta	Buenas condiciones
33	Ruedas	Buenas condiciones
34	Motor	Buenas condiciones
35	Parachoques	Buenas condiciones
36	Colectores	Buenas condiciones
37	Topes de las Ruedas	Buenas condiciones
38	Dispositivo de Bloqueo	Buenas condiciones
OBSERVACIONES		
- El puente presenta buenas condiciones, utiliza dos motores para las ruedas de traslación. - Descripción de la viga monorriel: Viga tipo: **"H"** Alma: **105** cm Ala: **30,0** cm Altura: **6** mt - Longitud (luz ó flecha): **14** mt Capacidad: **15** ton Año: **2011** Marca: **R&M**		
CARRO O TROLLEY (Procedimiento IEI-PI-10)		
N° Renglón	Descripción	Condición
39	Ruedas	Buenas condiciones
40	Barandas	No aplica
41	Condiciones del Motor	Buenas condiciones
42	Frenos	Buenas condiciones
43	Colectores	Buenas condiciones
44	Estructura	Buenas condiciones
45	Ejes	Buenas condiciones
46	Parachoques	Buenas condiciones
47	Cubierta	Buenas condiciones
48	Engranajes	Buenas condiciones
OBSERVACIONES		
- El equipo no utiliza carro, es un polipasto. - Descripción del polipasto: Marca: **R&M** Modelo: **SX50610150P55FDN0F** Cap.: **15.000** Kgs - El equipo utiliza 2 poleas ecualizadoras de Ø **11"** x Ranura **7/16"**		
ELEVADOR PRINCIPAL (Procedimientos IEI-PI-05 / IEI-PI-08)		
N° Renglón	Descripción	Condición
49	Freno de Control	Buenas condiciones
50	Poleas	Buenas condiciones
51	Poleas Ecualizadoras	Buenas condiciones
52	Motor	Buenas condiciones
53	Caja de Engranaje	Buenas condiciones
ELEVADOR AUXILIAR (Procedimientos IEI-PI-05 / IEI-PI-08)		
N° Renglón	Descripción	Condición
54	Freno de Control	No aplica
55	Poleas	No aplica
56	Poleas Ecualizadoras	No aplica
57	Motor	No aplica
58	Caja de Engranaje	No aplica
OBSERVACIONES		
- El equipo utiliza unicamente el elevador principal, es un polipasto. - Características del tambor: Longitud: **16"** Ø: **16"** Ranura: **7/16"** Canales: **60** Velocidad: **20** m/min Altura: **6** m Frecuencia: **60** Hz		

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

INSPECCIÓN DE CABLES (Procedimiento IEI-PI-07)

N° Renglón	Descripción							Condición
59	Aplicación	Diámetro	Clasificación	Clase/ grado	Resist. Ruptura	Factor de Seguridad	Arrollado	
59.1	Principal	11,00 mm	8 x 19	2160	13.052 Kgs	5,0	NR	Buenas condiciones
59.2	Auxiliar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
59.3	Otros							

EQUIPOS DE MEDICIÓN

GALGAS PARA POLEAS	CÓDIGO:	IEI-I018-17	FECHA DE CALIBRACIÓN: 29/1/2025
VERNIER	CÓDIGO:	GE-I017-53	FECHA DE CALIBRACIÓN: 5/9/2025

OBSERVACIONES

- El cable de carga presenta buenas condiciones.
- Descripción del cable: Ø **11,00** mm = **0,433** inch. **7/16** DIEPAP2371KD11L

INSPECCIÓN DE LA CADENA (Procedimiento IEI-PI-10)

N° Renglón	Descripción							Condición
60	Aplicación	Diámetro	Clase/ grado	Long. del Eslabón	Ancho del Eslabón	Eslabones 10/20	Capacidad	
60.1	Principal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica
60.2	Auxiliar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica
60.3	Otros							

EQUIPO DE MEDICIÓN

VERNIER	CÓDIGO:	N/A	FECHA DE CALIBRACIÓN: N/A

OBSERVACIONES

- El equipo no utiliza cadena en el sistema de izamiento.

GANCHO Y BLOQUE DE CARGA (Procedimiento IEI-PI-03 / IEI-PI-10)

N° Renglón	Descripción					Condición
61	Capacidad:	**15.000** KGS	MARCA	**M&R**		Buenas condiciones
62	Peso:	**N/A** KGS	SERIAL	**HLW25869**		Buenas condiciones
63	Poleas					Buenas condiciones
63.1	Número de Poleas:	**3**	Diámetro de Poleas:	**11"**		Buenas condiciones
63.2	Diámetro de la Ranura:	**7/16"**				Buenas condiciones
64	Tapas					Buenas condiciones
65	Pasadores o Ejes					Ensamblados
66	Retenedores / Ojales					Ensamblados
67	Uña de Seguridad					Buenas condiciones
68	Torcedura 0°					Buenas condiciones
69	Abertura de Garganta ≤ 5% o 1/4"		Lectura:	**135**	mm	Buenas condiciones
70	Desgaste ≤ 10%		Capacidad:	**15.000**	kg	Buenas condiciones
71	Marca:	**M&R**	Serial N°:	**HLW25869**		Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- Se realizó ensayo con partículas magnéticas al gancho, obteniéndose buenos resultados.
- Se realizó ensayo con líquidos penetrantes en un 40% de la ranura de la polea, con buenos resultados.
- El bloque y gancho son originales del fabricante, tienen visibles la identificación del fabricante.
- El diámetro o espesor de la garganta del gancho es: **90** mm
- El bloque de carga utiliza tres (3) poleas, para seis líneas.

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

CÁLCULOS DEL LÍMITE DE TRABAJO SEGURO									
SEGÚN CAPACIDAD DEL CABLE O CADENA DE IZAMIENTO									
N° Renglón	**Descripción**								
72	**Aplicación**	**Resist. Ruptura**		**Factor de Seguridad**	**N° de líneas**	**Límite de trabajo seguro**		**Límite de trabajo seguro (S.I.)**	
72.1	**Cable Principal**	13.052	Kgs	5,00	2	5.221	Kgs	5.221	KGS
73	**Aplicación**	**CAPACIDAD**			**N° de líneas**	**Límite de trabajo seguro**		**Límite de trabajo seguro (S.I.)**	
73.1	**Cadena Principal**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	KGS
SEGÚN CAPACIDAD DE LOS GANCHOS									
N° Renglón	**Descripción**								
74	**Aplicación**	**Capacidad de carga**				**Capacidad de carga (S.I.)**			
74.1	**Gancho Principal**	15.000			KGS	15.000			KGS
75	**Límite de trabajo seguro del equipo Sist. Principal**					**Límite de trabajo seguro del equipo Sist. Principal (S.I.)**			
75.1	15.000				Kgs	15.000			KGS

RECOMENDACIONES

1.- Realizar inspecciones periódicas al cable de carga y proceder a su reemplazo al momento de presentar hilos rotos, deformación, desgaste y aberturas, según la norma ASME B30.2
2.- Mantener en buenas condiciones operativas los limitadores (bloqueador) del bloque (al subir y bajar).
3.- Realizar el mantenimiento preventivo del equipo según especificaciones del fabricante.
4.- Mantener actualizado libro de vida de todas las reparaciones y reemplazos realizados al equipo.
5.- Revisar diariamente el equipo por parte del operador y cualquier anormalidad pasarla por escrito al custodio quien deberá tomar las acciones correctivas.
6.- Instalar en sitio visible al operador la carta de señales de mano.
7.- Buscar otro medio de lubricación del cable de carga, ya que el lubricante actual (grasa) no es el mas recomendado, porque al calentarse pasa a estado líquido y cae sobre el gancho y personas. Adicionalmente se acumula el polvo, formando un abrasivo que produce desgaste del cable.
8.- Pintar en sitio visible y a cada lado del puente la capacidad del equipo.
9.- Realizar inspecciones periódicas a las ruedas del polipasto por parte del personal de mantenimiento, y realizar ajustes a las mismas, para mantenerlas con la distancia correspondiente a las vigas.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST
RIF J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SONOTEST
REVISION TECNICA — Firma — Conforme SI NO — Fecha 07 / 08 /2025
REVISION ADMINISTRATIVA — Firma — Conforme SI NO — Fecha 07 / 08 / 2025

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

PRUEBA DE CARGA (Procedimiento IEI-PI-17)					
PROPIETARIO:	PETROBOSCAN, S.A.	**CAPACIDAD:**	15.000	KGS	
LUGAR:	GALPÓN DE MECÁNICA, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO. ZULIA.	**TIPO:**	GRÚA PUENTE		
MARCA:	R&M	**SUB-TIPO:**	ELÉCTRICA		
MODELO:	SX50610150P55FDN0F	**AÑO DE FABRICACIÓN:**	2011		
FABRICANTE:	R&M	**FECHA DE PRUEBA:**	6/8/2025		
NÚMERO DE CABLES:	6	**DIÁMETRO:**	11,00	mm = Inch	7/16
SERIAL:	HLW25869	**CLASIFICACIÓN:**	8 x 19		

PLUMA PROBADA	LONGITUD DEL PUENTE	CAPACIDAD NOMINAL	CARGA DE PRUEBA	% DE CARGA	TIEMPO DE PRUEBA	RESULTADOS
PRINCIPAL	14,00 Mts	15.000 Kgs	10.300 Kgs	69%	25 Min	Satisfactorio
AUXILIAR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Personalizar comentario

EQUIPO DE MEDICIÓN Y ENSAYO					
DINAMÓMETRO N°:	IEI-I031-08	**MARCA:**	DILLON	**MODELO:**	10inDINA
SERIAL:	D-22157	**RANGO:**	0-10.000 KG	**FECHA DE CALIBRACIÓN:**	18/3/2025

MASA DE PRUEBA			
TIPO DE MASA:	BLOQUE DE CONCRETO	**PESO:**	10.300 Kgs

OBSERVACIONES


- SE REALIZÓ PRUEBA DE CARGA AL SISTEMA PRINCIPAL, OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.
- NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO 15.000 Kg (15 ton).
- SE UTILIZÓ PARA LA PRUEBA DE CARGA UN BLOQUE DE CONCRETO, AL CUAL SE VERIFICÓ SU PESO CON UN DINAMÓMETRO DE 10 TON, CERTIFICADO POR SENCAMER.
- UTILIZAR OPERADORES CERTIFICADOS Y CON EXPERIENCIA COMPROBADA EN ESTE TIPO DE EQUIPO.
- LA PRUEBA DE CARGA SE REALIZÓ CON ESTE PESO POR NO CONTAR EN SITIO CON OTRO APROPIADO.
- LA PRUEBA DE CARGA FUE REALIZADA DESPLAZANDO LA CARGA EN LAS ÁREAS DE FÁCIL ACCESO, YA QUE EL GALPÓN ES DE ÁREA LIMITADA; ADICIONALMENTE SE PROBARON LOS FRENOS DEL TAMBOR.
- LA GRÚA ES UTILIZADA UNICAMENTE PARA REALIZAR LAS OPERACIONES DEL GALPÓN DE MECÁNICOS.


INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**

SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

ESQUEMA Y GRÁFICO DE LA PRUEBA CARGA

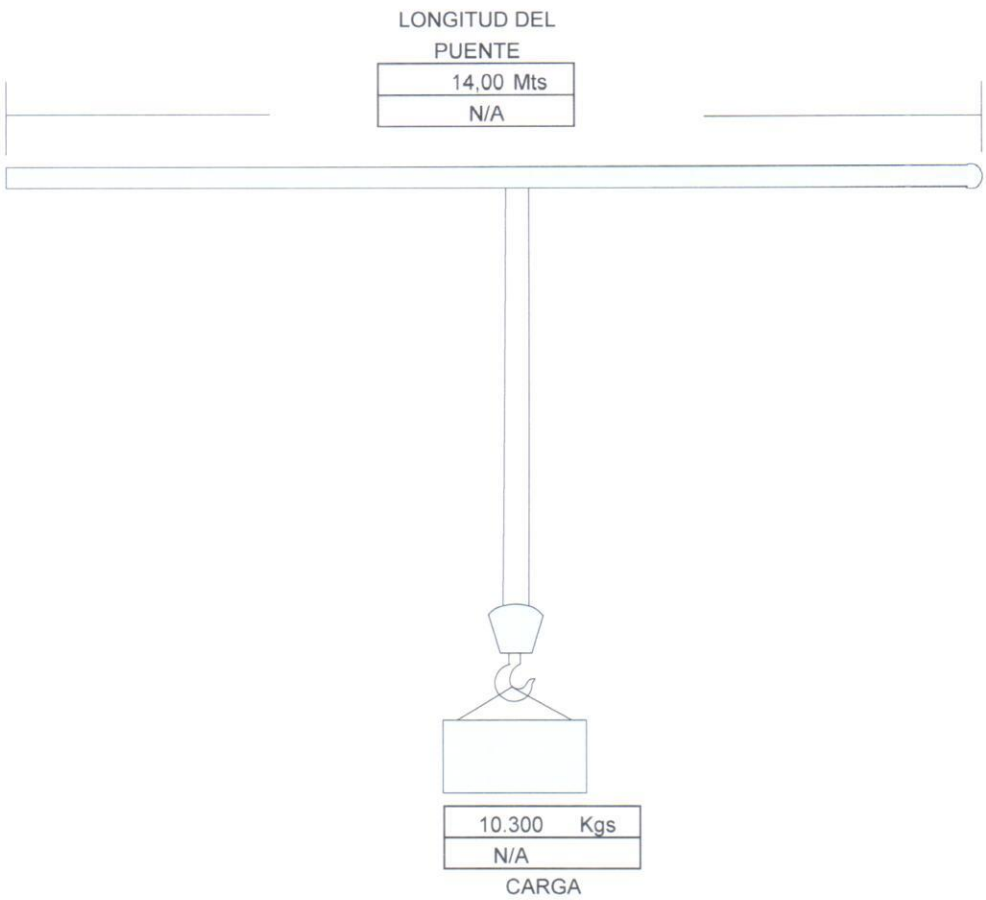


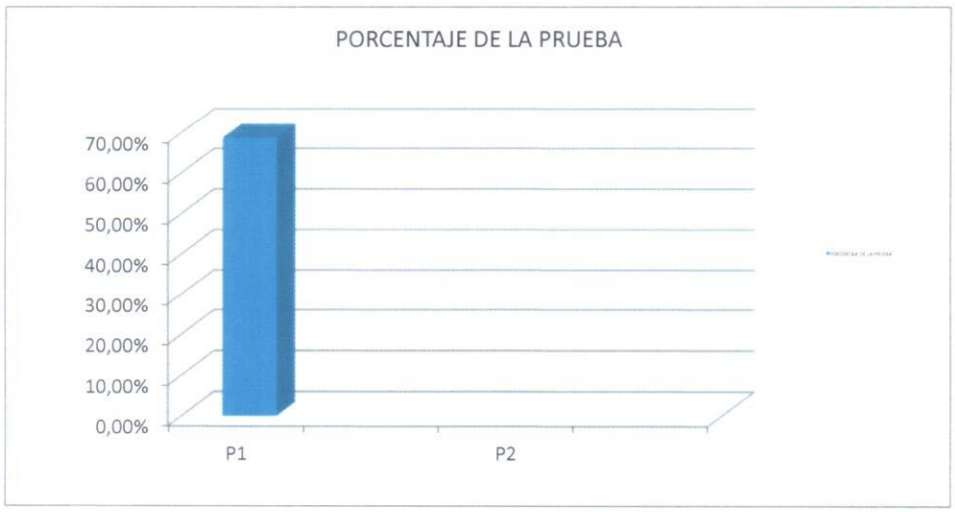

PRUEBA N°	P1	P2
PORCENTAJE	**69%**	

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

VISTA DEL BLOQUE DE CARGA

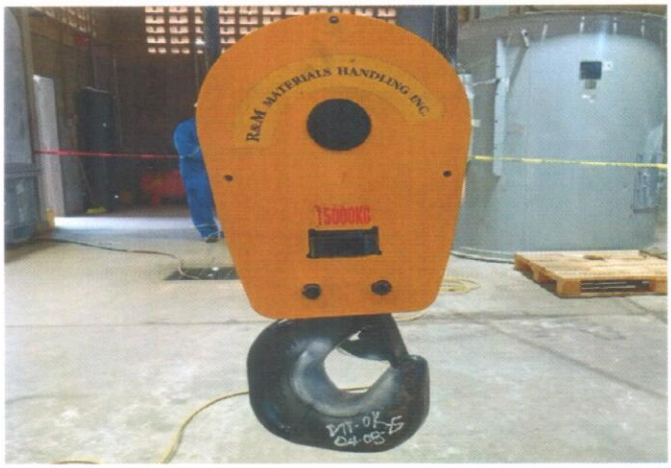

VISTA GENERAL DEL EQUIPO



VISTA DEL TAMBOR Y CABLE DE CARGA



VISTA DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN



VISTA DE LA PRUEBA DE CARGA APLICADA AL EQUIPO











Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO
GANCHOS

FECHA DEL INFORME:	7/8/2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	4/8/2025

REPORTE Nº	067-060825-02

CLIENTE:	PETROBOSCAN, S.A.	**INFORMACIÓN DEL GANCHO**	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO		**MARCA:**	M&R
MARCA:	R&M	**MODELO:**	HBC 5V
MODELO:	SX50610150P55FDN0F	**SERIAL:**	HLW25869
SERIAL:	HLW25869	**CAPACIDAD**	15.000 KGS


ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO: **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO:	MT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE:**	LIMPIA Y PULIDA

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				**MATERIALES**	
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS/CONTR. BLANCO
TIPO:	VERNIER 8" (Meissner)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-58	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A	**REVELADOR:**	N/A
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME V, ART. VII. / ASME B30.10 / PDVSA CAP. 14 / COVENIN 3212-1996				

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO

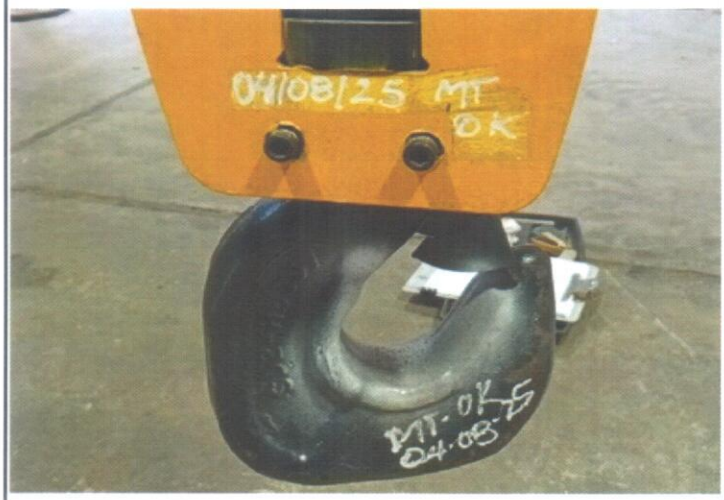

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS A LA GARGANTA DEL GANCHO No.: **HLW25869** DE CAPACIDAD **15.000** KG. OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.

OBSERVACIONES

- EL GANCHO **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO.
- NO SE DETECTARON DISCONTINUIDADES EN EL ÁREA DONDE SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN.

RECOMENDACIONES

1.- UTILIZAR ADECUADAMENTE PARA EVITAR DAÑOS MECÁNICOS.
2.- REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS, CON EL FIN DE DETECTAR GRIETAS, DEFORMACIÓN Y DESGASTE. SEGÚN NORMA APLICABLE.
3.- MANTENER LUBRICADO EL PUNTO DE GIRO DEL GANCHO.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	ASISTENTE
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE:
NIVEL: II	NIVEL: II	NIVEL:
FECHA: **7/8/2025**	FECHA: **7/8/2025**	FECHA:
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia.Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.
