INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SENCAMER

COJ-24961

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN DE EQUIPO DE IZAMIENTO
(GRUA MONORRIEL)

No: I-EI-GMR-24-010

*EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS **ACEPTABLES**, POR LO TANTO EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN **APTO** PARA REALIZAR OPERACIONES A LA CUAL FUE FABRICADO DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO EL EQUIPO PRESENTE DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SISTEMAS MECÁNICOS, SISTEMAS ELÉCTRICOS,, DAÑOS POR SOBRECARGAS O SE INVOLUCRE EN ACCIDENTES OPERACIONALES.*

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN, CÓDIGO ASME B30,20, PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INVERMULCA, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO:

TIPO DE EQUIPO :INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE GRÚA PUENTE (GRUA MONORRIEL)
TIPO: GRUA MONORRIEL MODELO: ZEPHYR
CAPACIDAD: 10 T FABRICANTE: CHESTER SERIAL; ZLG-6143

CAPACIDAD NOMINAL DE CARGA:9.072KG

*NORMAS Y CÓDIGOS APLICADOS:*COVENIN 3174, 3177, 3329, 3510 NORMA INTERNACIONAL ,ASME D30,20

PERTENECIENTE A : SAMPIERI & FORTUNATO,SA *RIF:*J-070043482

FECHA DE INSPECCIÓN: 04/12/2024 *VIGENCIA: UN(1) AÑO* *FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN 04/12/2025*

INSPECTOR ; Ing.: Damilo Rosales
NIVEL II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

COORDINADOR; Ing., Javier Rodriguez
NIVEL II NDT

I-GPMR-24-010
I-LP- G-MR -24-036
I-PC-GMR-24-018

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN DE GRÚAS TIPO PUENTE, SEMIPUENTE Y PÓRTICO(GRUA MONORIEL)

REPORTE DE INSPECCIÓN GRÚA TIPO PUENTE Y PÓRTICO							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	Rif	J-070043482	EQUIPO	BG2	No. REPORTE	I-GPMR-24-010
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE GRÚA PUENTE (GRUA MONORRIEL)					FECHA:	04/12/2024
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA EMPRESA (OBRA)					FECHA DE VIGENCIA	04/12/2025
OBJETIVO: Establecer la metodología para la ejecución de los procesos de inspección y pruebas, tanto frecuentes como periódicas en equipos de, Izamientos dar a conocer los criterios de aceptación o rechazo a aplicar de acuerdo con las condiciones detectadas.							
ALCANCE: Este certificado cubre los requerimientos de inspección y pruebas de grúas puentes, o de equipos similares que conserven los fundamentos de diseño originales.							

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO				
No. INTERNO: N/A	FABRICANTE: CHESTER	TIPO: GRUA MONORRIEL	SERIAL;ZLG-6143	
MODELO: ZEPHYR	FABRICACION : 2010, CARGA SEGURA :9.072KG	EL ( ) CADENA (X) NEU	CAP. NOMINAL (TON):	10 T

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS													
POLEAS DEL BLOQUE DE CARGA				CADENA (S) DE ACERO		PPAL	AUX	GANCHO(S) DE IZAMIENTO		CADENA	12,7 MTS		
Ø NOM. DE RANURA	6mm	Ø MED. DE RANURA	6nn	Ø NOMINAL		65 X 45		PUENTE PARA ENGANCHE					
POLEAS POLIPASTO O TROLE				Ø MEDIDO		65 X 45		CAPACIDAD		5445 KG			
Ø NOM. DE RANURA	6mm	Ø MED. DE RANURA	6mm	REDUCCIÓN (MM)		0							
No. DE LÍNEAS BLOQUE DE CARGA	2	X	4		6		8		10		12		

4.- CONDICIONES CUALITATIVAS			
ELEMENTO	B/C	M/C	CONDICIONES OBSERVADAS
1.- BLOQUE (S) DE CARGA			
1.1.- Polea(s)	X		Se Observó operativo
1.2.- Pasadores	X		Se observó sin degaste y operativo
1.3.- Tapa Poleas	X		Se observó operativa
1.4.- Otros			
2.- CABLE(S) DE ACERO			cadena
3.- TROLE(S)	X		
3.1.- Estructura	X		Se observó.
3.2.- Tambor(es)	X		Se observa en perfecta operación ,falta mantenimiento
3.3.- Engranajes	X		OK
3.4.- Ruedas del Trole	X		mantenimiento
3.5.- Engranajes del Trole	X		Operativos
3.6.- Ejes de Mando	X		Operativos
3.7.- Rieles del Trole	X		Mantener despejada la pista para evitar atascamiento y falla de operación
SECCIONES INSPECCIONADAS (CONTINUACIÓN)			
ELEMENTO	B/C	M/C	CONDICIONES OBSERVADAS
3.8.- Poleas Igualadoras	X		Se observó operativa
4.- PUENTE			
4.1.- Estructura	X		Se observa estable según diseño

Escaneado con CamScanner

4.2.- Cabina del Operador	N/A		No presenta
4.3.- Trenes de Traslación	X		Operativo
4.4.- Ruedas	X		Operativo
4.5.- Engranajes	X		Operativos
4.6.- Motor(es) de Traslación			No Aplica
4.7.- Freno(s)	X		Operativos
4.8.- Ejes de Mando	X		
4.9.- Rieles del Puente	X		Se observa operativos ,se recomienda mantener libre de obstáculo, Inspeccionar ante de comenzar una jornada
4.10.- Viga del monorriel	X		TIPO "'I'; NP 30 CAPACIDAD DE CARGA 9,072 KG
5.- SISTEMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD			
5.1.- Palancas	N/T		
5.2.- Pedales	N/T		
5.3.- Topes Rieles Trole	X		Operativos
5.4.- Topes Rieles Puente	X		Operativos
5.5.- Cepillos de Rieles	N/T		Se recomienda Instalar

LEYENDA:					
B/C: Buenas Condiciones	**M/C:** Malas Condiciones	**S/I:** Sin Inspección	**S/A:** Sin Acceso	**N/T:** No tiene	**N/A:** No aplica

PRUEBA DE CARGA

SE REALIZO LA PRUEBA: SI ■ NO ☐ INFORME ANEXO: SI ■ NO ☐

CONCLUSIONES

Se realiza una elevación en marcha lenta con una carga según código aplicado, una vez despegada del suelo el miso fue sometido a un levantamiento de 1.Mts por 15 minutos.
Ver Reporte N I-EI-GPM-24-003

CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTA: ■	NO APTA: ☐

REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA INSPECCIÓN










INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Escaneado con CamScanner

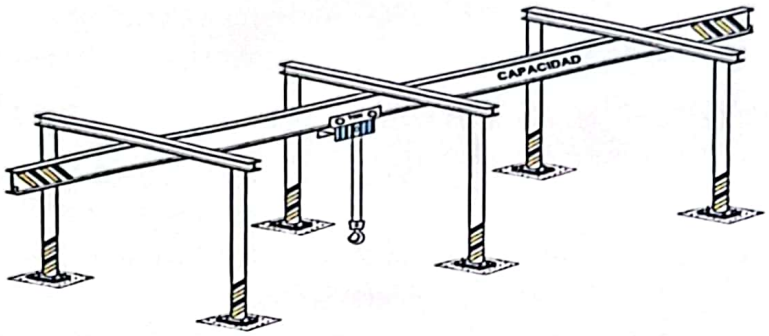

GRÚA TIPO MONORRIEL O GANTRY

RECOMENDACIONES	
ELEMENTOS No	**ACCIONES**
VIGA DEL MONORIEL	**SE OBSRVA EN BUENA CONDICIONES ,TIENE UNA EXTENCION DE ,INSTALAR LA CAPACIDAD A LA VIGA**
DESCRIPCION DE LA VIGA	**VIGA TIPO "I" ALMA: 30 CM, ALA; 10 CM ALTURA 3,3 MTS , LONGITUD 7,8 MTS CAP 9.1 T MARCA : BLP – 191793-01**

OBSERVACIONES

- Los Resultados Indicados En Este Reporte Se Encuentran Asociados A Las Condiciones Operacionales Del Equipo En La Fecha De Inspección En Referencia.
- Estos Resultados Tienen Una Vigencia De Máximo **Doce (12) Meses.** Cumpliendo Con Lo Establecido En El Código Api 9 A Grado Ips 6x19 Resistencia A La Ruptura 11500iwrc ASME B 30.20 "Overhead And Gantry Cranes" (Grúas Puentes Y De Pórtico)" Y **Asme/Ansi B30.21** "Manually Lever Operated Hoist", Covenin 3174 "Equipos De Izamiento. Mantenimiento Y Pruebas". Covenin 3177 "Equipos De Izamiento. Inspección". Covenin 3329 "Certificación De Equipos De Izamiento De Carga". Covenin 3510 "Equipos Izamiento, Grúas Puente, Pórtico
- Esta Conformidad Perderá Vigencia Una Vez Cumplida Su Fecha De Próxima Verificación, Y/O Cuando En El Equipo Ocurran Las Siguientes Condiciones:

  1.- Cuando El Equipo Evidencie Daños Visibles Relevantes, Que Puedan Afectar Las Funciones Y Condiciones De Uno O Mas De Sus Sistemas Mecánicos Y Estructurales.
  2.- Cuando El Equipo Haya Sido Sometido A Estrés Severo, Sobrecargas O Haya Estado Involucrado En Accidentes Operacionales.
  3.- Cuando El Equipo Sea Modificado, Alterado Y/O Sea Sometido A Una Reparación.

INSPECTOR (ES):	Ing.; Dalmilo Rosales Nivel II	FECHA: **04/12/2024**	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	Ing. Javier Rodríguez FIS-0021-006/VT-027-2022 / UT – 029-2022 / PT 038-2017	FECHA: 04/12/2024	FIRMA:

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Escaneado con CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,
Email: Invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

SENCAMER

REPORTE PARA INSPECCIÓN CON LÍQUIDOS PENETRANTES

CAL-031

CLIENTE: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	FECHA 04/12/2024	Rif Nro.; J-070043482	RPORTE N°: I-LP- G-MR -24-036

EQUIPO / PIEZA A ENSAYAR: INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE GRÚA PUENTE (GRUA MONORRIEL) DE 10" TONELADA / Gancho SERIAL: ZLG-6143	TÉCNICA (S) APLICADA (S) CONTRASTE CON COLORES ASTM-E-165	NORMA CÓDIGO: ANSI / ASME B31.3 ASME V-SECC.6

CONDICIONES DEL ENSAYO

ESTAMPA DEL SOLDADOR:	JUNTAS:	ESTADO DE LA SUPERFICIE:
Ganchos	UNI	LISA
----------	----------	----------
----------	----------	----------
----------	----------	----------

LIMPIEZA PREVIA: TRAPO Y CEPILLO

TIPO DE PRODUCTO

PENETRANTE	REVELADOR	LIMPIADOR
ASTM - 165	ASTM - 165	ASTM – 165

APLICACIÓN DEL PENETRANTE	SPRAY ■	IMMERSION ☐	BROCHA ☐	TIEMPO DE PENETRACIÓN: 10 MIN.
MÉTODO DE REMOCIÓN DE EXCESO DE PENETRANTE	CON AGUA ☐	POST EMULSIFICANTE ☐	CON SOLVENTE ■	
APLICACIÓN DEL REVELADOR:	SECO ☐	HÚMEDO NO ACUOSO ■	ACUOSO ☐	

EVALUACIÓN DEL ENSAYO:
Se realizó el ensayo de líquido penetrante a los ganchos por donde se iza el polipasto manual (señorita) con una duración de penetración de 10 minuto sin observarse discontinuidades que pudieran afectar el elemento





COMENTARIOS:

LOS RESULTADO FUERON SATISFACTORIO

REALIZADO POR:
NOMBRE: Javier Rodríguez Nivel II LP N°038-2026
FIRMA: Nivel II IV N° 037-2026
FECHA: 04/12/2024

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Escaneado con CamScanner


PRUEBA DE CARGA A EQUIPO DE IZAMIENTO (GRUA MONORIEL)

REPORTE DE PRUEBA DE CARGA EQUIPO DE IZAMIENTO							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	EQUIPO	BG2	No REPORTE	I-PC-GMR-24-018
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE GRÚA PUENTE (GRUA MONORRIEL)					FECHA: FECHA VIJENTE	04/12/2024 04/12/2025
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA EMPRESA (OBRA)						
OBJETIVO: VERIFICAR LAS CONDICIONES MECÁNICAS, HIDRÁULICAS Y ESTRUCTURALES DEL EQUIPO.							
ALCANCE: Este certificado cubre los requerimientos de inspección y pruebas de grúas puentes, o de equipos similares que conserven los fundamentos de diseño originales							

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO			
No. INTERNO: N/A	FABRICANTE: CHESTER		TIPO: GRUA MONORRIEL
SERIAL: ZLG-6143	MODELO: ZEPHYR		PROPULSIÓN: MECÁNICA
CAP. NOMINAL (TON): 10	MOTOR: MANUAL		
MECANISMO DE ELEVACIÓN:	TIPO DE TRACCIÓN: X	TIPO DE CAUCHO:	FABRICACION : 2010, CARGA SEGURA :9.072KG

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE CARGA		
INSTRUMENTO UTILIZADO: CARGA CONOCIDAD	MARCA: N/A	MODELO: N/A
Nº DE CERTIFICADO: N/A	FECHA DE CALIBRACIÓN / VIGENCIA: N/A	SERIAL N/A

CONDICIONES OPERATIVAS DURANTE PRUEBA DE CARGA	
CARGA DE PRUEBA: CARGA CONOCIDAD	TIPO DE CARGA: BLOQUE DE CONCRETO
ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE PLUMA: N/A	LONGITUD DE PLUMA: N/A
TIEMPO DE PRUEBA CILINDROS ELEVACIÓN: 10 minutos	CAPACIDAD DE CARGA TABULADA: 10000 KG
RADIO DE CARGA: N/A	% RELACIÓN CON CARGA TABULADA: 20
DESLIZAMIENTO CILINDROS DE ELEVACIÓN:	
DESCENSO DE LA CARGA DURANTE LA PRUEBA: NO SE OBSERVÓ DESCENSO	
DESLIZAMIENTO CILINDROS DE INCLINACIÓN:	
INCLINACIÓN DE LA CARGA DURANTE LA PRUEBA: N/A	
RESULTADOS: Se realiza una elevación en marcha lenta con una carga según código aplicado, una vez despegada del suelo, el miso fue sometido a un levantamiento de 1.Mts por 15 minutos. Con Resultado Satisfactorio.	





CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTO:	X	NO APTO:	

INSPECTOR (ES):	Ing: Dalmilo Rosales Nivel II	FECHA: 04/12/2024	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	Ing. Javier Rodríguez FIS-0021-006/VT-027-2022 / UT – 029-2022 / PT 038-2017	FECHA: 04/12/2024	FIRMA:

Escaneado con CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico
Refractario, Aluminio, Acero inoxidable
para Subestaciones y Empresas Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31933378-6 NIT: 0107299080

N° CERTIFICADO: ***I-EI-GMR-24-010***

INSPECCIÓN / CERTIFICACIÓN DE *EQUIPO DE IZAMIENTO (GRUA MONORIEL)*

CLIENTE: SAMPIERI & FORTUNATO,SA **MAQUINA; *GRUA MONORIEL***

MARCA; CHESTER **SERIAL; ZLG-6143** **MODELO:** ZEPHYR

FECHA DE CALB; 04/12/2024 **Fecha Próx Calibr**: 04/12/2025

Escaneado con CamScanner
