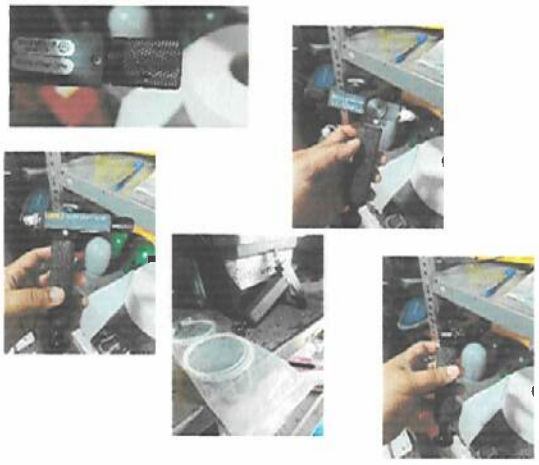
INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0414 6654690
Email: Invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmllor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-BPB-25-005

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 23/03/2025
Equipo: LOW-PRESSURE TEST PUMP	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca**: FLUKE
Descripción del Equipo: La bomba de comprobación de baja presión Fluke-700LTP-1 es una fuente doble portátil, que suministra vacío y presión. Cada bomba incorpora un selector de vacío y presión y un control de ajuste fino	**Modelo:** 700LTP1	**Código Interno:** NO SE OBSERVO
Serial: 6549329	**Fecha de calibración:** 20/03/2025 **Fecha Próxima Calibración:** 20/03/2026	**Patrón de Referencia:** Código Interno: I-MPB-010 Nª DE SOLICITUD SENCAMER: LP-2024-4358.
Precisión: ±1%		
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Mica	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Rango:** -12,7 PSI A 100 PSI
Presión de salida: 0 a 100 psi **Vacío de salida:** 0 a -13 psi **Ajuste:** regulador fino de la presión y vacío volumétricos	**Estuche:** Se observo	**Apreciación:** 1 LB
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

	LECTURA PATRÓN PSIG	LECTURA DEL EQUIPO PSIG	FOTO DEL EQUIPO
EQUIPO	5	5	
	15	15	
	30	30	
	70	70	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección INVERMULCA. . EN 837-1 , ISO 17025 , ER 1045/2012 , COVENIN 2972-3, PDVSA EM--33--01/02

OBSERVACIONES:	Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron condiciones desfavorables. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento ,Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0414 6654690
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmllor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006


Características principales

- La bomba puede limpiarse fácilmente sin necesidad de desarmarla
- Válvula de seguridad de presión ajustable con capacidad de purga lenta. Permite liberar la presión lentamente a un ritmo controlado.
- Conectores de ajuste rápido, uno para el módulo de presión Fluke serie 700 y otro para conectarlo a una unidad bajo prueba.
- Diseño extrafino, fácil de usar y de transportar

CONCLUSIONES:	LOS RESULTADOS DE ESTAS MEDIDAS ESTÁN DENTRO DE LA TOLERANCIA PERMITIDA POR EL FABRICANTE APTO

Inspector
Ing. Dalmiro Rosales
NDT II

Ing. Javier Rodríguez
FIS-0021-017/
VT-027-2022 /
UT – 029-2022 /
PT 038-2022

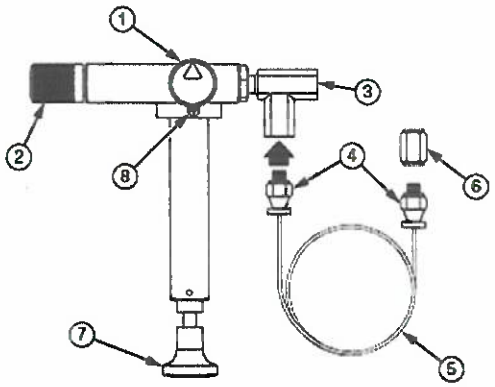

1	**Válvula de liberación de presión/vacío:** gire la válvula en sentido antihorario para vacío, en sentido horario para presión y déjela en el centro para liberación.
6	**Control de ajuste fino:** gire hacia adentro o hacia afuera para aumentar o reducir la presión acordemente.
3	**Te para puertos principal y de comprobación**
4	**Conectores de calce rápido**
5	**Manguera**
6	**Acoplamiento NPT hembra de ⅛ de pulg. a BSP hembra de ¼ de pulg.**
7	**Empuñadura de la bomba.** Si la bomba no ha sido utilizada durante cierto tiempo, puede haber cierta resistencia en la primera embolada.
8	**Puertos para limpieza (2): consulte las instrucciones de limpieza**

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES CA
