SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fiscal: Av. Casco Central, C.C. Amal, Nivel 2, Local N° 22 y 23, Cabimas Estado Zulia.
Telefax: (0264) 6585846, Celulares: (0424) 6181674 / (0412) 1619135 (WhatsApp)
Site Web: www.iwecotech.com, Email: iwecotech@gmail.com, Sencamer N°: COJ-20410
Rif: J-31762771-7 NIL:397137-1

CERTIFICADO Nº: IWT-CC-30017-23 **Orden de trabajo:** OTI-00018-23 **N° DE CONTROL:** 00029

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

El equipo abajo identificado ha sido calibrado de acuerdo con los procedimientos de calibracion de **IWECO-TECH,C.A,** la norma **ISO-17662**

DATOS DEL EQUIPO:

Denominación: MAQUINA DE SOLDAR

Tipo: GAS-OIL **Serial:** U1080600539 **Código/C.I:** 11468

Fabricante: LINCOLN **Modelo:** VANTAGE. K2405-2

Propiedad de: SAMFOR, S.A **Capacidad:** 0-500 A

Ubicación: Av. 3H entre calles 68 y 70 N° 69-61, Maracaibo, Venezuela.

DATOS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION UTILIZADOS:

Nombre: Pinza Voltiamperimetrica

Marca:	Modelo:	Serial:	Fecha de verificación
Greenlee	CM 900	506640471	13/01/2021

Nombre: Banco de prueba portátil

Marca:	Modelo:	Serial:	Fecha de verificación
Miller	LBP 350	LG006212	14/01/2021

DATOS FINALES DE LA CALIBRACIÓN:

Fecha de Calibración: 15/08/2023

CODIGO QR

José Chacin
C.I: 23.514.981
Realizado por:

Tito Vargas
C.I:7.841.987
Aprobado por:

Es responsabilidad del cliente establecer la frecuencia de calibración. Esta declaracion es de aspecto auditable en el sistema de gestion de la empresa.

Este certificado cumple con los requerimientos establecidos en la norma FONDONORMA ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibracion".

IWECOTECH, no se hace responsable de los perjuicios que pueda ocacionar el uso inadecuando de este instrumento, ni de una incorrecta interpretacion de los resultados de la calibración aqui declarada, los resultados declarados son unicamente validos para el objeto de calibración.

Este certificado de calibración es trazable a patrones Nacionales e Internacionales, los cuales se realizan con las unidades de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

La reproduccion de este documento debe ser integral y no es valido sin la firma y sello de aprobacion por parte de IWECOTECH.



Este certificado pierde vigencia al cumplirse la fecha de vencimiento o cuando el equipo se involucre en accidentes de cualquiera naturaleza. En los equipos móviles debe considerarse su re-inspección, para asegurar su operabilidad, Cuando: 1) Se efectúen modificaciones al diseño, 2) Exista duda sobre su condición, 3) Se haya hecho un traslado. Este certificado no tiene validez sino lleva SELLO SECO.

ORIGINAL / CLIENTE

Este documento no debe ser reproducido total o parcialmente sin la aprobacion de IWECO-TECH,C.A y el propietario del equipo.

Scanned with CamScanner

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fiscal: Av. Casco Central, C.C. Amal, Nivel 2, Local N° 22 y 23, Cabimas Estado Zulia.
Telefax: (0264) 6585846, Celulares: (0424) 6181674 / (0412) 1619135 (WhatsApp)
Email: iwecotech@gmail.com
N° de Consultor Sencamer:COJ-20410
Rif: J-31762771-7

Fecha: 15/08/2023

REPORTE DE CALIBRACIÓN N°: IWT-CC-30017-23

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: SAMFOR, S.A **DPTO./PERSONA CONTACTO:** Angel Baquero
Dirección: Av. 3H entre calles 68 y 70 N° 69-61, Maracaibo, Venezuela
Teléfono: 0424-9205442
Rif: J-07004348-2 **Codigo Interno:** N/E

DATOS DEL EQUIPO A EVALUAR

Marca	LINCOLN	Modelo:	VANTAGE. K2405-2	Serial:	U1080600539	Código:	11468		
Tipo:	GENERADOR	Gas-oil:	X	Eléctrica:		Rango/voltaje	110/ 220		
Hz:	60	RPM:	1800	O.C.V. Máx.:	97/84	Cap. Máx.:	500 A	Duty cycle	60%

MÉTODO DE CALIBRACIÓN: **Norma utilizada** (ISO 17662-2005 Welding - Calibration, verification and validation of equipment used for welding, including ancillary activities)

Tiempo Aplicado a cada rango de voltios/Amperios: 10 min

RESULTADOS CALIBRACIÓN

Parámetros Eléctricos de Voltaje/ Amperaje

OCV Real: 97 **Revoluciones.** 1800

N° de prueb	Tipo de electrodo	Diámetro del electrodo	PARAMETROS ELECTRICOS VALORES PATRONES Volts.	Amps.	VALORES REALES Volts.	Amps.	PARAMETROS ERROR PORCENTUAL Error Absoluto ΔV	ΔI	Porc. De Error (%)volts.	(%)amps	Conformidad
1	6010	1/8	40	150	41	151	-1	-1	-2,44	-0,66	Conforme
2	6013	1/8	40	250	39	253	1	-3	2,56	-1,19	Conforme
3	7018	1/8	40	350	40	356	0	-6	0,00	-1,69	Conforme

PATRONES UTILIZADOS

Nombre	Marca	Serial	Modelo	Cap. Max	Certificado N°	Fecha de verificacion
Banco de Prueba LBP-350	MILLER	LG006212	LBP 350	350 AMP A 50 Volts.	UCS-E-0001-21	14/01/2021
Pinza Amperimétrica	GREENLEE	506640471	CM-900	(0 -600)Adc/ac	UCS-E-0002-21	13/01/2021

Scanned with CamScanner

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fiscal: Av. Casco Central, C.C. Amal, Nivel 2, Local N° 22 y 23, Cabimas Estado Zulia.
Telefax: (0264) 6585846, Celulares: (0424) 6181674 / (0412) 1619135 (WhatsApp)
Email: iwecotech@gmail.com
N° de Consultor Sencamer:J-20410
Rif: J-31762771-7

Fecha: 15/08/2023 **REPORTE DE CALIBRACIÓN N°:** **IWT-CC-30017-23**

CALIBRACIÓN


$(|E|+U) < EMP$

VOLTAJE

Nivel V	Error V	$U_{k=2,95\%}$ V	Limite ±V	Conformidad
40	0,0	0,0	4	Conforme
40	-1,0	1,9	4	Conforme
40	1,0	1,9	4	Conforme

La conformidad se establece en la norma ISO 17662-2005 Welding — Calibration, verification and validation of equipment used for welding, including ancillary activities , cuando se cumple:


$(|E|+U) < EMP$

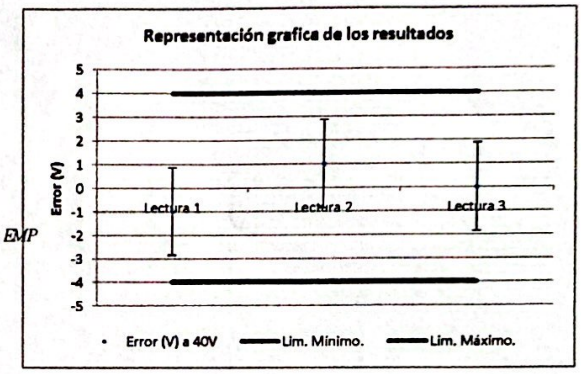

AMPERAJE

Nivel A	Error A	$U_{k=2,95\%}$ A	Limite ±A	Conformidad
150	0,000	0,000	10	Conforme
250	-2,000	0,028	25	Conforme
350	100,000	0,028	35	Conforme

La conformidad se establece en la norma ISO 17662-2005 Welding — Calibration, verification and validation of equipment used for welding, including ancillary activities , cuando se cumple:

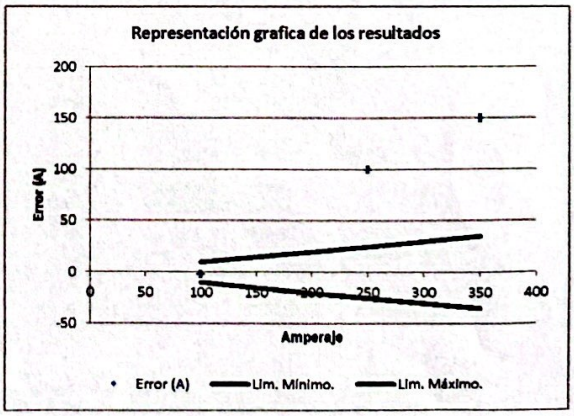

OBSERVACIONES:

El equipo se encuentra conforme, sus resultados están dentro de los Errores Máximos Permisible según el fabricante y según lo indicado por la Norma Internacional ISO 17662-2005 Welding — Calibration, verification and validation of equipment used for welding, including ancillary activities

José Chacin
Realizado por:
C.I: 23.514.981

Tito Vargas
Aprobado por:
C.I.: 7.841.987

Scanned with CamScanner
